

Conteúdo

1. Planta-chave com códigos de parede e ordem de montagem
2. Fichas de parede (16): croqui de elevação + composição completa de itens
(painéis PIR, guias/requadro, requadros alumínio, esquadrias, elétrica, hidráulica, cimentícia, gesso)
3. Croqui de corte — nesting de barras 12 m (kerf 5 mm)
4. Processo da linha W1-W6 — estações, takt e pontos de controle (PIT-W)
5. Registro de correções R13 → R14 (substitui "pendências R8-R9")

Fontes: Modelo BIM IFC R14 (geometria R12 + revisão documental) · Romaneio R14 (aba 08 = fonte das fichas) · Nesting R14 · Orçamento REV.14

Uso: fabricação/planejamento do LOTE PILOTO. Produção em SÉRIE exige ART (condicionante C1 — Termo de Emissão R14).

REGRA DO PIPELINE: este caderno é DERIVADO — toda revisão entra pelo Romaneio/IFC e o documento se REGENERA (nunca editar à mão).

O QUE MUDA NA BASE R13/R14 (aplicado em todo este caderno)


QUADRO SÓ DE REQUADRO: guias U100 contornando os painéis PIR 70 mm — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas (Termilor TC 70: vão adm. 4,40 m > pé 2,85 m).

Exceções: 10 montantes de canto · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01 (F3-A) / P02 (F1). Vãos: recorte no painel + REQUADRO ALUMÍNIO (56 pç · 67 m/casa).

PF-3: 206 → 152 un/casa · PF-2 recontado (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C #4,75 c/ porca-rebite M8 nas junções JP-02/JP-03 (140 chapas/casa · PIT-W2c).

Correções de cadastro: J04 pertence à F5-B (não F4-B) · portas PI3/PI2 pertencem à IA1/IA2 (não I1/I2) · fichas antigas citavam 58 montantes + vergas inexistentes.

AVISO (C1): emissão p/ LOTE PILOTO — produção em série exige ART (painel portante DATec SINAT nº 10 + junções JP/içamento).

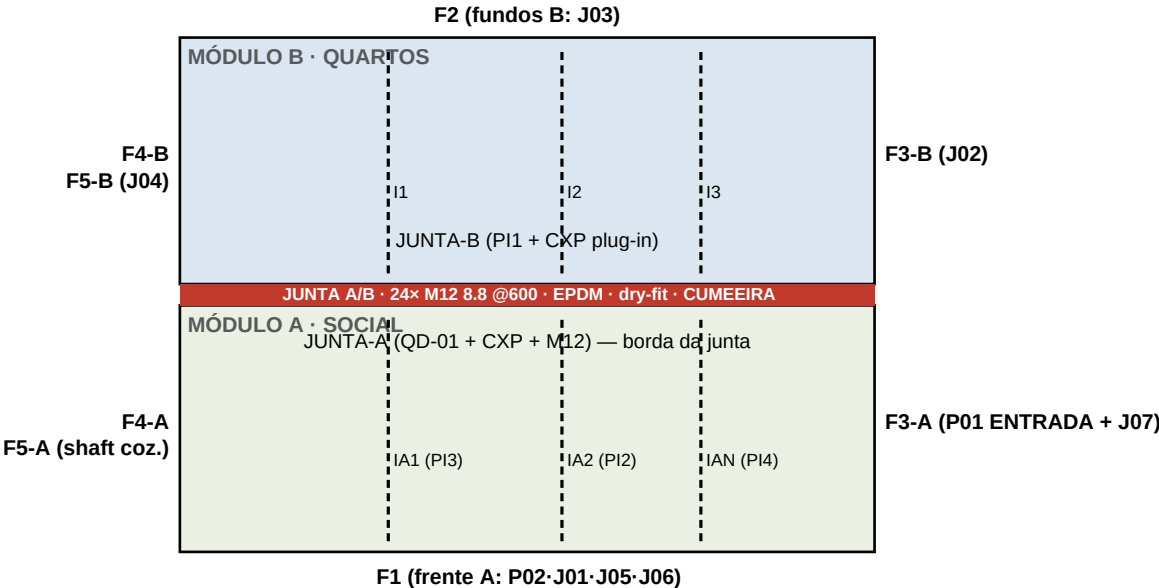


ORDEM DE MONTAGEM · RACK (carga inversa)

SOCIAL A-1 F4-A · A-2 F1 · A-3 F3-A · A-4 F5-A · A-5 JUNTA-A ·
A-6 IA1 · A-7 IA2 · A-8 IAN (compensação)
QUARTOS B-1 F4-B · B-2 F2 · B-3 F3-B · B-4 F5-B · B-5 JUNTA-B ·
B-6 I1 · B-7 I2 · B-8 I3 (compensação)
rack: posição 16 (F4-A, 1ª a sair) → 1 (I3) · carga INVERSA à montagem

TOTAIS: 16 paredes · 11,3 t/casa · 18 montantes de extremidade
(10 canto + 4 borda de junta + 4 ombreiras) · guias U100 2×65,1 m
bordas/junções: JP-01..04 parafusadas M8 (CHP-T/CHP-C onde há espera)
GM-01 guia-mestre U110×40×3,0 · guia-anel JP-04 U120×45×2,25

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vaos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

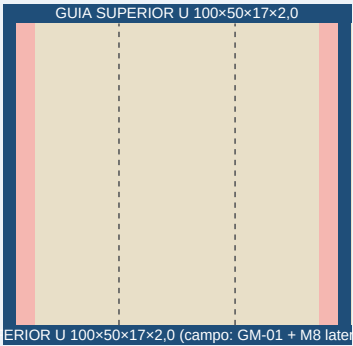

...sting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs F4-A-P01..P03
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2×32
Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²
MEP embutida: 1 circ. tomadas (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.62 t · ordem A-1 · rack 16 (carga inversa)


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 37 · PF-2 32 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. tomadas · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 16 · ordem A-1

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

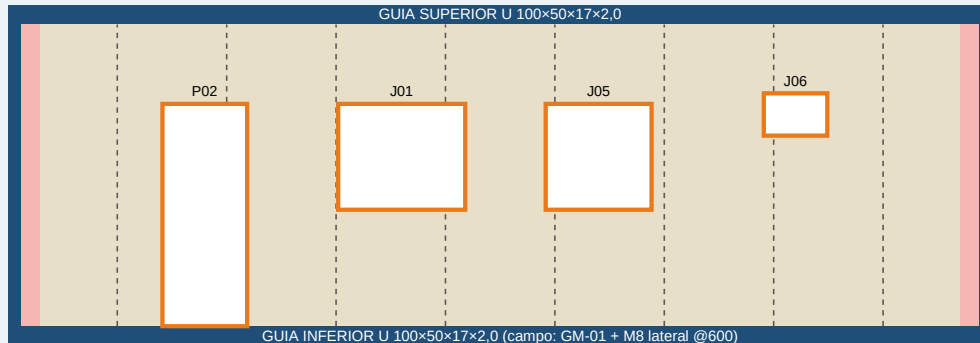

9.30 m — 9 painéis PIR 1,15x2,85 (nesting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 9.30 m = 18.6 m
 Montantes metálicos 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão + 2 OMBREIRAS P02 (MNT-A017/A018 · X 3,505/4,395)
 Painéis PIR 70 mm: 9 pç 1,15x2,85 · 29.5 m² · IDs F1-P01..P09
 Esquadria P02 0.80x2.10 m · porta
 Esquadria J01 1.20x1.00 m · janela · peitoril 1.10
 Esquadria J05 1.00x1.00 m · janela · peitoril 1.10
 Esquadria J06 0.60x0.40 m · janela · peitoril 1.80
 Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
 Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~26.5 m² + parafusos Ø4,2x32
 Gesso acartonado ST (face int.): ~26.5 m²
 MEP embutida: 2 circ. + 4 pontos (coords: abas 04/05)
 Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 4 (balancim) olhais no requadro
 Peso: 1.45 t · ordem A-2 · rack 15 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 126 · PF-2 160 · PF-3 14
 contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
 CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2x9.30 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2** 9 painéis PIR · 2 circ. + 4 pontos · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 9 placas (borda 20 mm) + gesso 9 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** esquadrias: P02 + J01 + J05 + J06 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 15 · ordem A-2

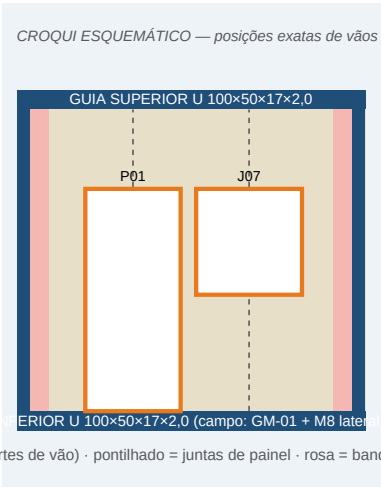

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão + 2 OMBREIRAS P01 (MNT-A015/A016 · Y 1,855/2,845)
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs F3-A-P01..P03
Esquadria P01 0.90×2.10 m · porta
Esquadria J07 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2×32
Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²
MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.6 t · ordem A-3 · rack 14 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 37 · PF-2 96 · PF-3 14
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3


cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: P01 + J07 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 14 · ordem A-3

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vaos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única



ecortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 2.10 m = 4.2 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 2 pç 1,15×2,85 · 6.6 m² · IDs F5-A-P01..P02

Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~6.0 m² + parafusos Ø4,2×32

Gesso acartonado ST (face int.): ~6.0 m²

MEP embutida: hidráulica: shaft cozinha (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.44 t · ordem A-4 · rack 13 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 22 · PF-2 32 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

W1 guias 2×2.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un

W2 2 painéis PIR · hidráulica: shaft cozinha · TESTE hydr. 1,5× / 60 min


W3 cimentícia 2 placas (borda 20 mm) + gesso 2 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W

W4 juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos

W5 mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex

W6 passaporte QR · proteções · rack posição 13 · ordem A-4

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

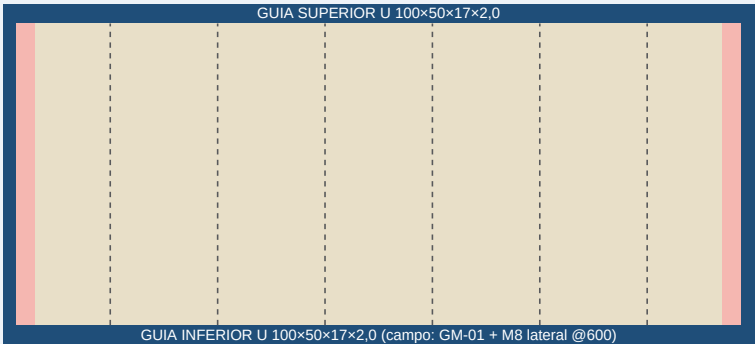

— 7 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 7.10 m = 14.2 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 7 pç 1,15×2,85 · 22.9 m² · IDs JUNTA-A-P01..P07
Gesso acartonado ST (2 faces): ~40.5 m²
MEP embutida: QD-01 + CXP + furação M12 (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 3 olhais no requadro
Peso: 1.02 t · ordem A-5 · rack 12 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 95 · PF-2 32 · PF-3 14 · M12: 12 (kit da casa)
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2×7.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2** 7 painéis PIR · QD-01 + CXP + furação M12 · teste 500 V no chicote
- W3** gesso 14 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 12 · ordem A-5

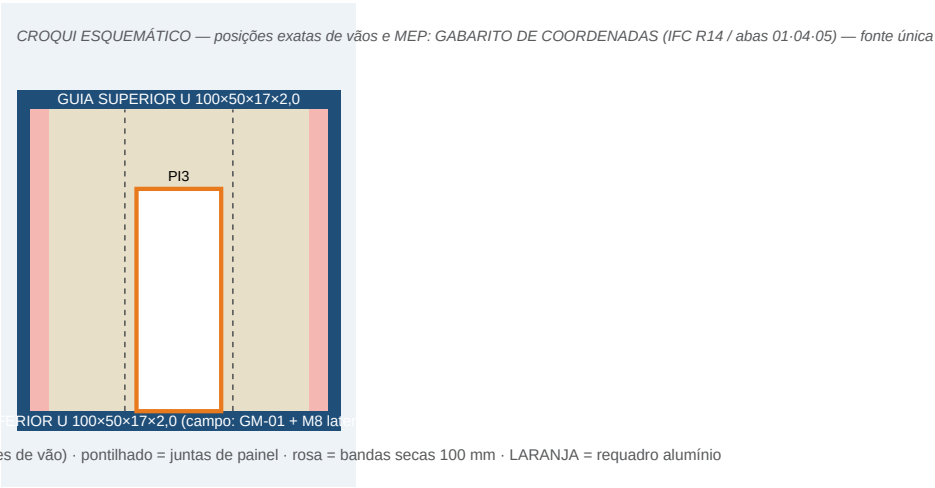

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 3.06 m = 6.1 m

Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15x2,85 · 9.8 m² · IDs IA1-P01..P03

Esquadria PI3 0.80x2.10 m · porta

Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)

Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.4 m² · RU no banheiro

MEP embutida: hidráulica banho (12/13 pts) (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.58 t · ordem A-6 · rack 11 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 64 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2x3.06 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2


3 painéis PIR · hidráulica banho (12/13 pts) · TESTE hydr. 1,5x / 60 min
- W3

gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: PI3 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 11 · ordem A-6

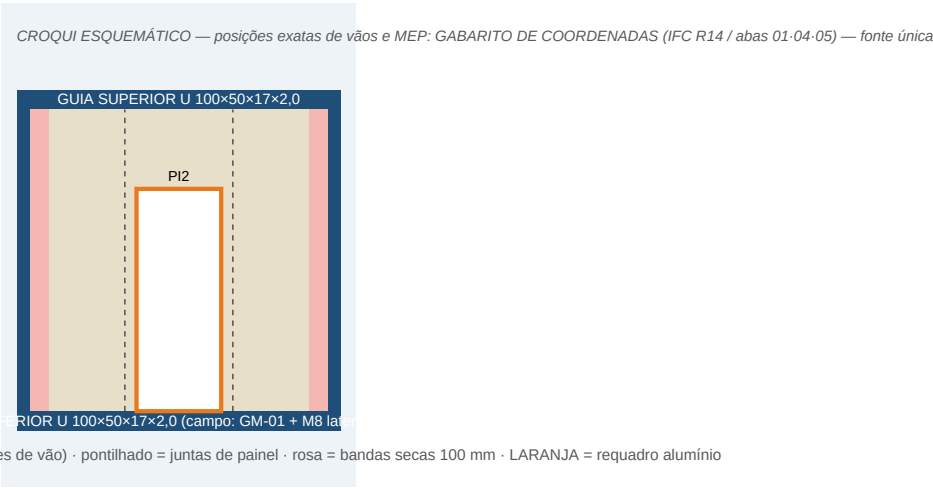

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 3.06 m = 6.1 m

Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15x2,85 · 9.8 m² · IDs IA2-P01..P03

Esquadria PI2 0.80x2.10 m · porta

Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)

Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.4 m²

MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.56 t · ordem A-7 · rack 10 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 64 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2x3.06 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3


gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: PI2 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 10 · ordem A-7

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP; GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única



es de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 1.40 m = 2.8 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 2 pç 1,15×2,85 · 6.6 m² · IDs IAN-P01..P02
Esquadria PI4 0.70×2.10 m · porta
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Gesso acartonado ST (2 faces): ~8.0 m²
Bordas: JP-03 / JP-01 · içamento: 1 olhais no requadro
Peso: 0.3 t · ordem A-8 (compensação) · rack 9 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 17 · PF-2 64 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2×1.40 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 2 painéis PIR · sem MEP · teste 500 V no chicote
- W3** gesso 4 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** esquadrias: PI4 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 9 · ordem A-8 (compensação)

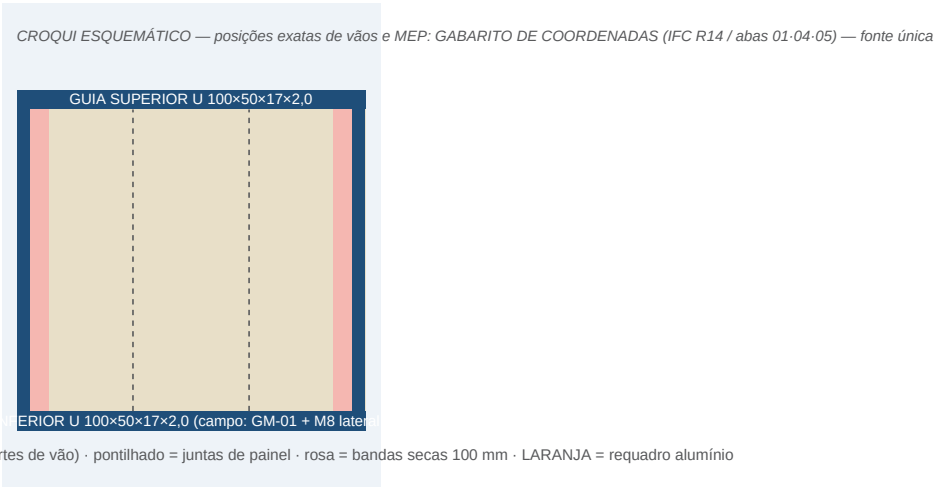

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs F4-B-P01..P03
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2×32
Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²
MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.62 t · ordem B-1 · rack 8 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 37 · PF-2 32 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3


cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 8 · ordem B-1

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

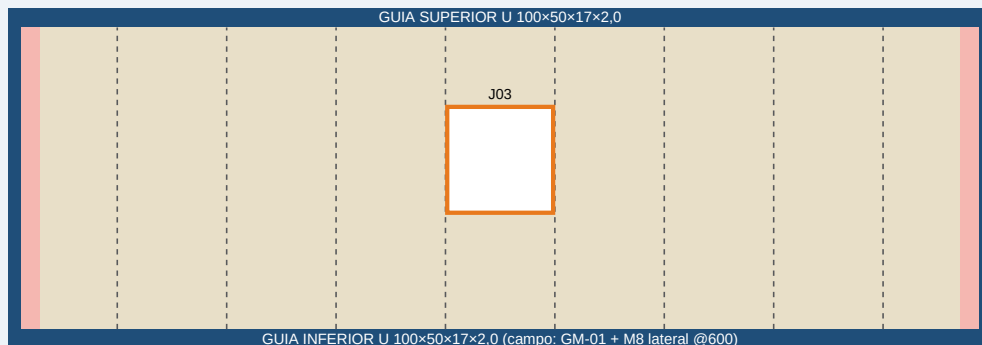

9.30 m — 9 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 9.30 m = 18.6 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 9 pç 1,15×2,85 · 29.5 m² · IDs F2-P01..P09

Esquadria J03 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10

Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)

Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~26.5 m² + parafusos Ø4,2×32

Gesso acartonado ST (face int.): ~26.5 m²

MEP embutida: 2 circ. + tomadas (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 4 (balancim) olhais no requadro

Peso: 1.42 t · ordem B-2 · rack 7 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 126 · PF-2 64 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

W1 guias 2×9.30 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un


W2 9 painéis PIR · 2 circ. + tomadas · teste 500 V no chicote

W3 cimentícia 9 placas (borda 20 mm) + gesso 9 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W

W4 esquadrias: J03 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos

W5 mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex

W6 passaporte QR · proteções · rack posição 7 · ordem B-2

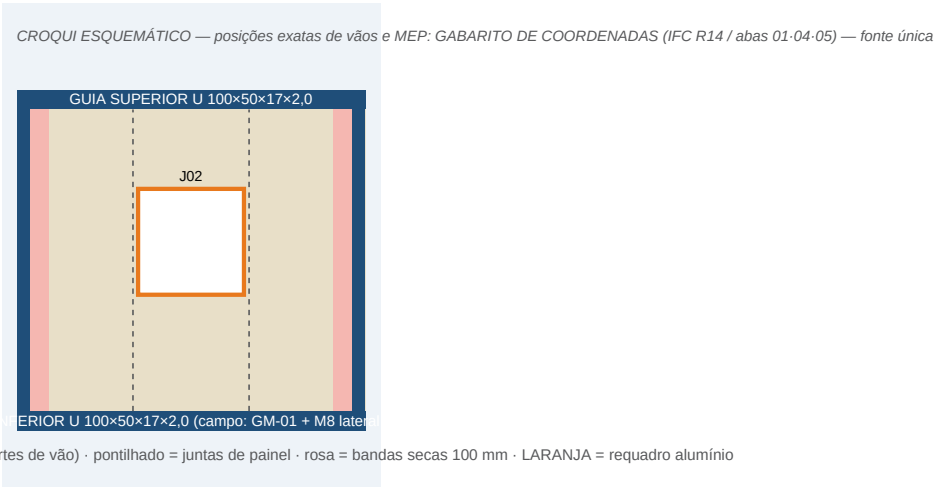

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs F3-B-P01..P03

Esquadria J02 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10

Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)

Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2×32

Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²

MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.6 t · ordem B-3 · rack 6 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 37 · PF-2 64 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3


cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: J02 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 6 · ordem B-3

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única



ecortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 2.10 m = 4.2 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 2 pç 1,15×2,85 · 6.6 m² · IDs F5-B-P01..P02
Esquadria J04 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~6.0 m² + parafusos Ø4,2×32
Gesso acartonado ST (face int.): ~6.0 m²
MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.42 t · ordem B-4 · rack 5 (carga inversa)


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 22 · PF-2 64 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2×2.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 2 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 2 placas (borda 20 mm) + gesso 2 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** esquadrias: J04 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 5 · ordem B-4

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

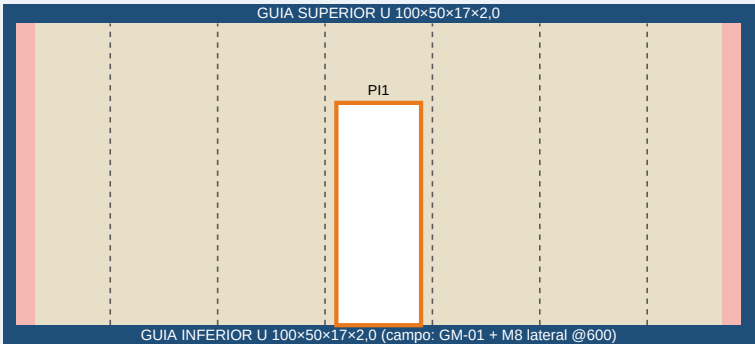

— 7 painéis PIR 1,15x2,85 (nesting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 7.10 m = 14.2 m
Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 7 pç 1,15x2,85 · 22.9 m² · IDs JUNTA-B-P01..P07
Esquadria PI1 0.80x2.10 m · porta
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Gesso acartonado ST (2 faces): ~40.5 m²
MEP embutida: CXP-JUNTA plug-in + M12 (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 3 olhais no requadro
Peso: 1.0 t · ordem B-5 · rack 4 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 95 · PF-2 64 · PF-3 14 · M12: 12 (kit da casa)
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2x7.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2** 7 painéis PIR · CXP-JUNTA plug-in + M12 · teste 500 V no chicote
- W3** gesso 14 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** esquadrias: PI1 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 4 · ordem B-5

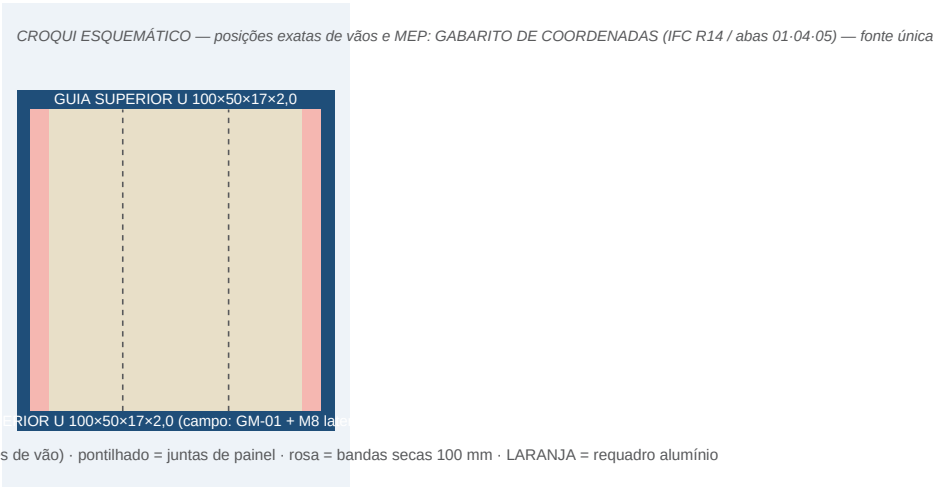

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.00 m = 6.0 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs I1-P01..P03
Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.1 m²
MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.55 t · ordem B-6 · rack 3 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 32 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3


gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 3 · ordem B-6

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

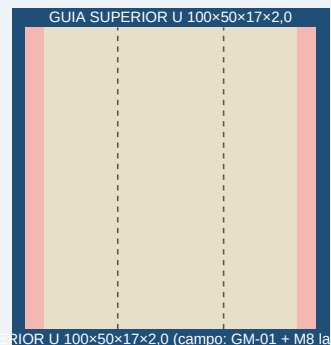

ing c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- | | |
|----|--|
| W1 | guias 2x3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un |
| W2 | 3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote |
| W3 | gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W |
| W4 | juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos |
| W5 | mascarar bandas secas + rebicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex |
| W6 | passaporte QR · proteções · rack posição 2 · ordem B-7 |

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.00 m = 6.0 m

Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP,
compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15x2,85 · 9.8 m² · IDs I2-P01..P03

Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.1 m²

MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-03 / JP-03 · içameuto: 2 olhais no requadro


Peso: 0.55 t · ordem B-7 · rack 2 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 32 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

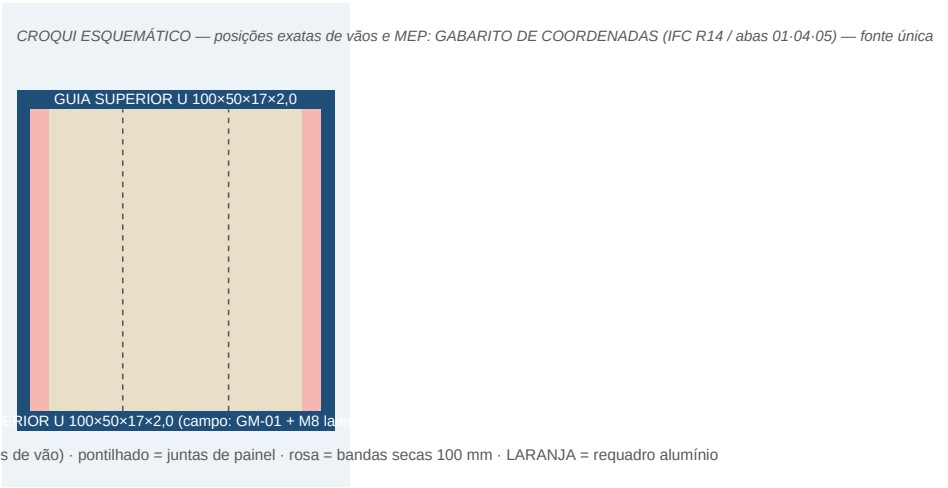

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 3.00 m = 6.0 m
Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15x2,85 · 9.8 m² · IDs I3-P01..P03
Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.1 m²
Bordas: JP-03 / JP-01 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.55 t · ordem B-8 (compensação) · rack 1 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 32 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2x3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · sem MEP · teste 500 V no chicote
- W3

gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 1 · ordem B-8 (compensação)

Perfil	Função	Qtd	Total (m)
Chapa galv. #4,75 (240×90)	Chapa de espera T — 2 porcas-rebite M8 (fábrica, W2)	1	0.24
Chapa galv. #4,75 (L 90×70)	Chapa de espera de canto — 2 porcas-rebite M8/aba (W1-B)	1	0.16
Chapa galvanizada 0,65mm	Calha galv. 0,65mm impermeabilizada	2	24.20
Metalon 70x70x1,90	Braco de balanço da marquise da lavanderia (duplo)	3	7.44
Metalon 70x70x1,90	Braco de balanço da marquise do portico (duplo)	3	7.44
Metalon 70x70x1,90	Montante de borda de junta	4	11.40
Metalon 70x70x1,90	Montante de canto (painel autoportante)	10	28.50
Metalon 70x70x1,90	Ombreira de vao (dupla)	4	11.40
Metalon 70x70x1,90	Viga cumeeira A	1	7.00
Metalon 70x70x1,90	Viga cumeeira B	1	7.00
Requadro aluminio	Requadro de vao aluminio branco	56	67.00
U 100x50x17x2,0	Guia inferior	16	65.11
U 100x50x17x2,0	Guia superior	16	65.11
U 44x30x2,0	Terca	8	72.80

REGRAS DE CORTE (R13/R14)

Serra corta em FEIXE: guias e montantes por comprimento · barras 12 m · kerf 5 mm · aferição semanal do gabarito (PIT-W1).
NÃO EXISTE mais corte de montante de vão, verga ou contraverga — retirar dos kits e do nesting de estação (R13). Aba 01 tem 18 montantes (10 canto + 4 borda de junta + 4 ombreiras).
Requadro alumínio: canal em barras 3,0 m c/ luva · cantos em peça pré-fabricada 90°. Furos Ø9 @400 dos montantes de extremidade no gabarito JP (W1-A).
CHP-T (240×90) e CHP-C (L 90×70) #4,75: corte/furação CNC + 2 porcas-rebite M8 — assentadas na fábrica (W1-B/W2) pelo gabarito · PIT-W2c.

BUFFER

perfis cortados (serra fita + puncionadeira JP) abastecem W1

W1

QUADRO: requadro U100 + montantes de extremidade + ombreiras · PF-3 25 N·m · PIT-W1 diagonais ±3 mm

W2

NÚCLEO PIR + MEP: painéis (PF-1/PF-2) · elétrica/hidráulica embutida · CHP porca-rebite · teste 500 V / hydr. 1,5× · PIT-W2/W2c

W3

PLACAS: cimentícia (borda 20 mm) + gesso (banda 100 mm) + PTB · paginação cf. Manual W

W4

ESQUADRIA + JUNTAS: requadro alumínio nos recortes · esquadria c/ rebite estrutural (PROIBIDO autobrocante na face 0,43 mm) · fita+massa

W5

ACABAMENTO: textura elastomérica ext. · 1 demão látex int. · bandas secas mascaradas (aposta W5: piloto decide demão de fábrica)

W6

QA + EMBALAGEM: passaporte QR · corte da guia da porta · proteções · rack em carga inversa · PIT-W6

CURA

24 h mín. antes do manuseio · pulmão de 8 posições

REGRAS DA LINHA + DRY-FIT

REGRA DE OURO: NADA entra na estação sem BIPE de início e NADA sai sem BIPE de fim — o takt nasce do bipe, não de planilha. Parafusadeiras c/ contador → ERP (divergência = alerta por etapa).

DRY-FIT da junta A/B em fábrica: pré-acoplamento M12 @600 + EPDM antes da expedição — furação CNC pareada garante o encaixe em campo.

PILOTO (R14): 1 casa rota A (volumétrica) + 1 casa rota B (kit plano) — indicadores: tempos por SKU × estação · retoque pós-montagem (aposta W5) · divergência contador×kit · vibração de transporte · NC por PIT-W.

Sequência de leitura por estação: W1 usa o quadro (croqui + requadro) · W2 usa MEP + painéis · W3 usa paginação · W4 usa esquadrias/juntas · W6 confere kit e posição de rack.

- OK** R13 (05/07/2026) — QUADRO SÓ DE REQUADRO: painel PIR 70 autoportante (Termilor TC 70, vão adm. 4,40 m > pé 2,85 m; folga 3× p/ vento 0,60 kN/m² NBR 6123). Fichas realinhadas: as R12 mandavam fabricar 58 montantes + vergas fantasma.
- OK** R13 — kit PF-3: 206 → 152 un/casa (-54) · aço de corte INALTERADO (aba 01/Nesting R9 já eram mínimos).
- OK** R13 — correções de cadastro aba 08 → fichas: J04 desenhada em F4-B pertence à F5-B · portas PI3/PI2 desenhadas em I1/I2 pertencem à IA1/IA2.
- OK** R13.1/R13.2 — chapas de espera CHP-T/CHP-C (#4,75, porca-rebite M8) detalhadas (Manual W + Caderno de Junções) e integradas ao Romaneio/Orçamento/QA (PIT-W2c): 140 chapas + 280 porcas-rebite/casa.
- OK** R13.2 — PF-2 recontado (32+32 por vão).
- OK** R13.6 — painéis PIR: repaginação sem tiras <300 mm · painéis de recorte de porta REMOVIDOS (recortes já modelados como aberturas nos painéis do modelo mestre).
- OK** R14 (06/07/2026) — EMISSÃO LOTE PILOTO: Caderno Mestre c/ ERRATA R13 integrada · fichas geradas do Romaneio R14 · termo de emissão 00_TERMO_EMISSAO_R14 (C1/ART = condição p/ SÉRIE).

PENDÊNCIA EXTERNA (fora do romaneio, com dono): C1 ART (junções JP/içamento + painel portante DATec SINAT nº 10) · C2 junta externa dupla-barreira · C3 estanqueidade NBR 15575-4 no protótipo.
