


MONTEX — PACOTE DE MONTAGEM R5

ISOMÉTRICOS 3D POR ETAPA · 24 passos parede-a-parede · junções em corte · planta sincronizada

Sistema PAREDE-PRONTA (aprovado) · storyboard V3 · cotas R4-2,60 · Romaneio R13 · rev. R13.2 · 06/07/2026

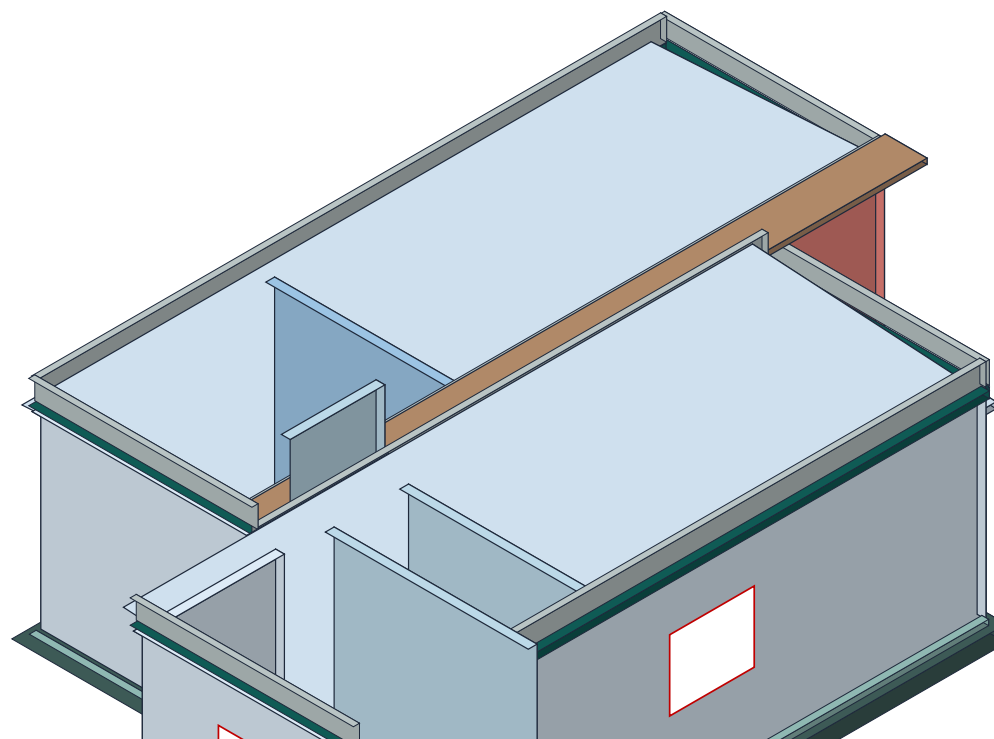

Vista isométrica do conjunto final — cada prancha deste pacote constrói esta casa uma parede por vez, na ordem exata do plano de fábrica.

ERRATA R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO

MTX-CM-2026-001 · 05/07/2026 · integra a revisão R13 (Adendo Caderno Técnico R13 + Fichas SKU R13 + Romaneio R13)

O QUE MUDA NESTA REVISÃO

Decisão R13 (05/07/2026): o quadro de cada parede-pronta passa a ser SÓ O REQUADRO — guias U100 contornando todos os painéis PIR 70 mm (autoportantes) — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas. Fundamento: catálogo Termilor Cold TC 70 — vão admissível 4.400 mm (bi-apoiado, L/120, 75 kg/m²) » pé-direito 2,85 m; folga ≈3× sobre o vento de cálculo 0,60 kN/m². Exceções mantidas: 10 montantes de canto (junções JP) · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01 (F3-A) / P02 (F1). Vãos de esquadria: recorte no painel + REQUADRO ALUMÍNIO. Aço de corte INALTERADO (aba 01 / Nesting R9 já eram mínimos). Kit PF-3: 206 → 152 un/casa.

EFEITO NO CAMPO: NENHUMA MUDANÇA DE PROCEDIMENTO

Todos os passos permanecem válidos: junções JP montante×montante M8 @400 + EPDM (os montantes de junção são os de EXTREMIDADE, mantidos na R13) · guia-mestre GM-01 e guia-anel JP-04 · consolo de terço fixado NA GUIA-ANEL · içamento pelos olhais do requadro, somente com 100% dos PF painel-guia instalados (o diafragma é o painel). O que muda é a CONFERÊNCIA: usar fichas SKU R13 e Romaneio R13 no QR (fichas R12 SUPERADAS — mostravam montantes/vergas que não existem no produto); kit PF-3 recontado (152 un/casa).

FIXAÇÕES EM PAREDE ACABADA (equipes de acabamento/pós-obra)

No meio da parede NÃO há montante: fixações leves (≤10 kg/ponto) com bucha basculante própria para painel sanduíche; cargas maiores somente em montante de extremidade/junção (detector de metal) ou com chapa de reforço.

AVISO

AVISO ESTRUTURAL (bloqueante — C1): premissa 'painel portante' condicionada à validação do DATec SINAT nº 10 (compressão + vento + diafragma + recortes), dos apoios de cumeeira na junta e a memorial revisado com ART antes da produção em série.

COMO LER ESTE PACOTE (convenções)

Isométrico da etapa

projeção axonométrica 30° · 3 tons por volume (topo claro / direita média / frente escura) · parede DESTE passo em TEAL c/ seta de descida

Pontos dourados

parafusamento executado no passo (bordas JP + fixação na GM-01)

Cores dos volumes

PIR externo azul-claro · internas azul-médio · paredes de JUNTA salmão · hidráulicas azul · anel verde-escuro · PTB cinza · cassete gelo

Planta sincronizada

canto sup. direito: nº = ordem · teal = agora · cinza = instaladas · pontilhado = futuras · tracejado vermelho = junta A/B

Corte da junção-chave

o detalhe construtivo executado no passo (GM/JP-01..04/anel/consolo/M12) com parafuso e torque

Bloco de dados

SKU (dim·peso·olhais·MEP·esquadrias do R12) · FIXAÇÃO (tipo·torque·qtd) · INÍCIO (checklist de entrada) · REGRA didática


Rotas A e B

a sequência é IDÊNTICA — muda apenas o local (baia/campo) e os tempos-alvo (piloto calibra)


Regra transversal (vale em TODAS as pranchas): a parede parafusa em ≥ 1 já instalada ANTES de soltar do gancho · escora provisória só na nº 1 de cada módulo · parafusadeira AZUL 25 N·m nas JP · torquímetro VERMELHO 85 N·m só no M12 · contador fecha o kit no QR.

PASSO 0 — GM-01 · GUIA-MESTRE NO RADIER


o esquadro da casa inteira · locação a laser 1x · cota ABSOLUTA (erro não acumula)

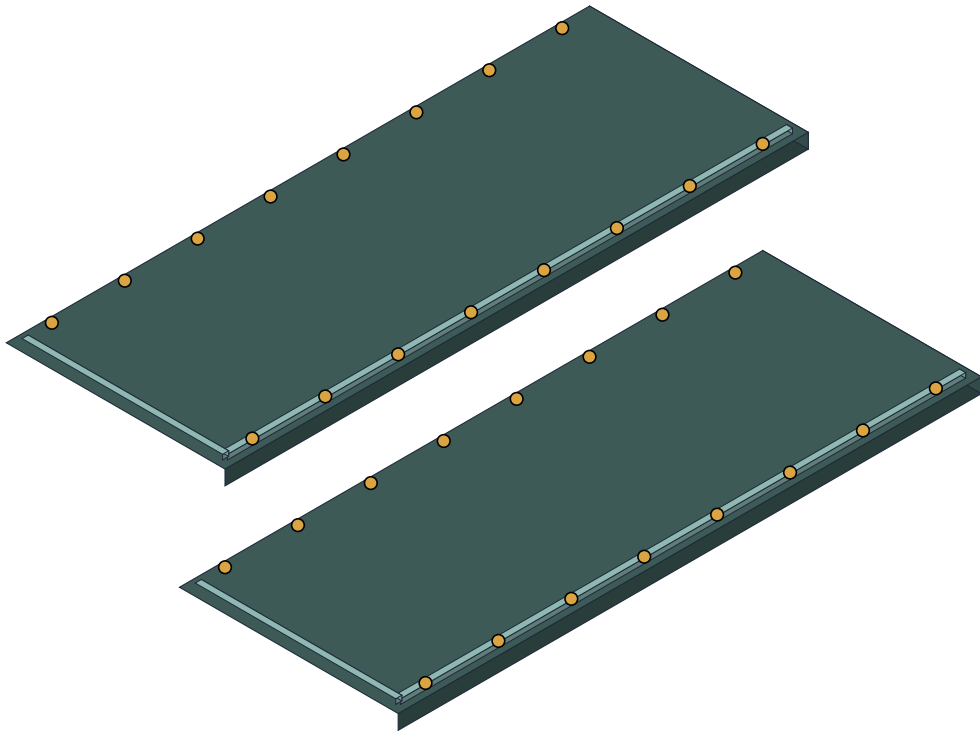

PLANTA · SEQUÊNCIA

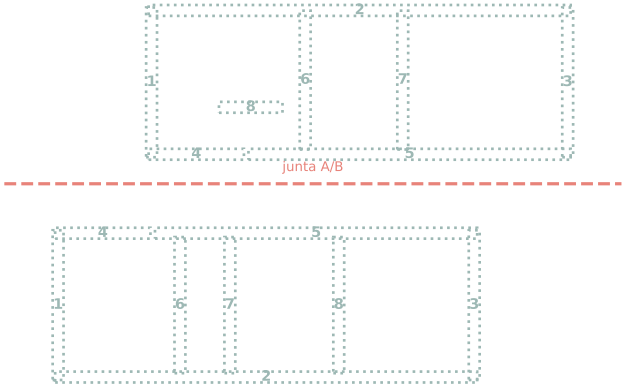

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

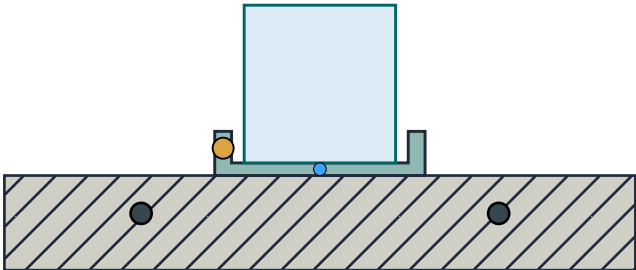

GM-01: encaixe · calços 3 mm · M8 lateral @600 · dreno

FIXAÇÃO

- parabolt M10 @600 · 45 N·m
- PU contínuo sob o canal · drenos Ø8 @1200

PLANO DE INÍCIO


- radier nivelado ± 2 mm/3 m (laser)
- locação conferida: 2 diagonais
- PIT-00 assinado

REGRA


- 10 min a mais no laser aqui poupam horas de calço nas 16 paredes

PASSO A-1 — PAREDE F4-A (3,30×2,85 m · 0,62 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-02/JP-02 · 2 olhais · MEP: 1 circ. tomadas · esquadrias: —

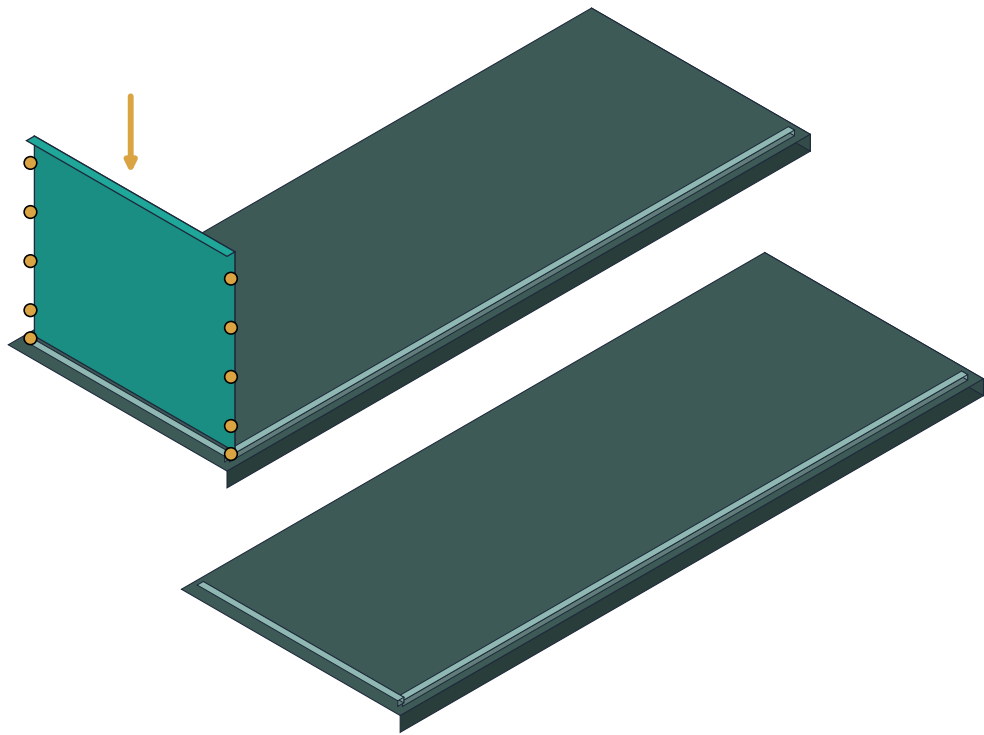

PLANTA · SEQUÊNCIA

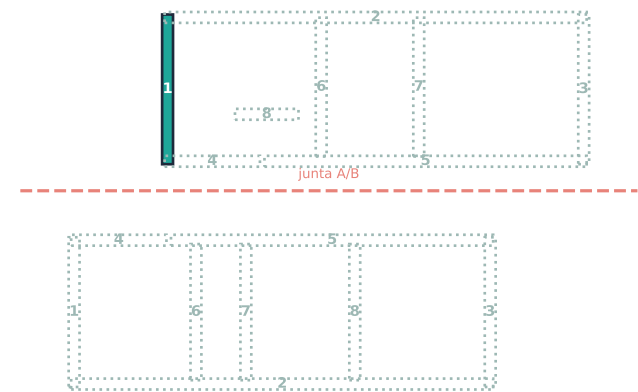

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

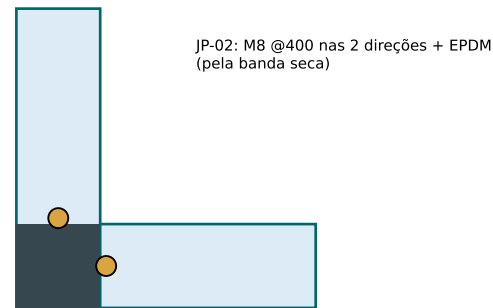

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- GM-01 conferida · PIT-00 ok
- Passaporte QR do F4-A: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Única com escora provisória (2× 45°) até a próxima chegar

PASSO A-2 — PAREDE F1 (9,30×2,85 m · 1,45 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-02/JP-02 · 4 balancim olhais · MEP: 2 circ.+4 pts · esquadrias: P02·J01·J05·J06

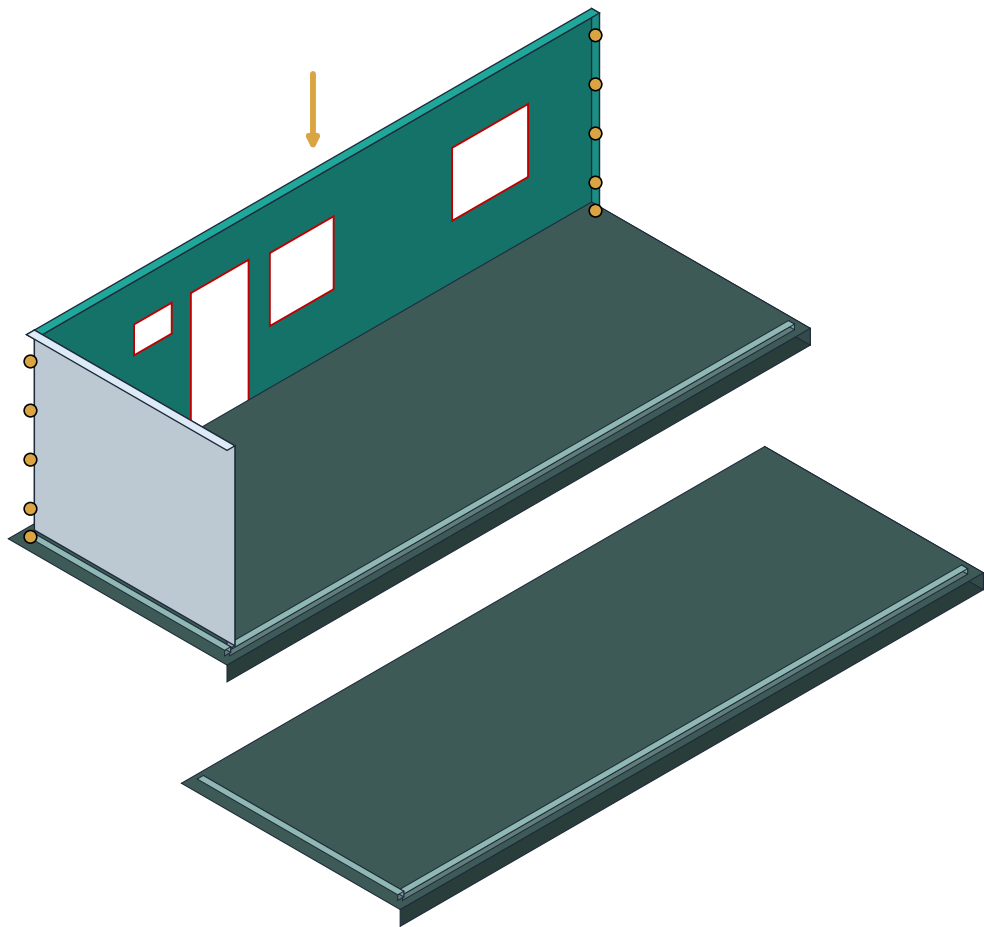

PLANTA · SEQUÊNCIA

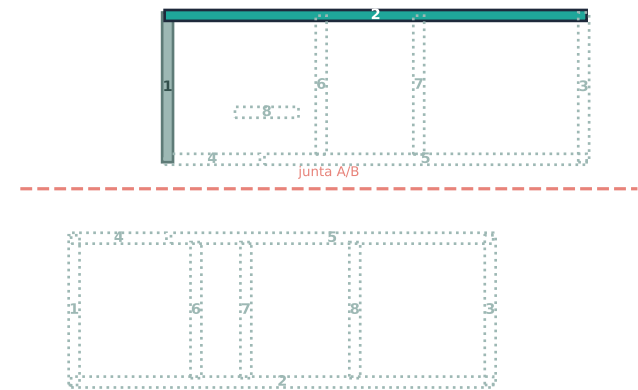

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

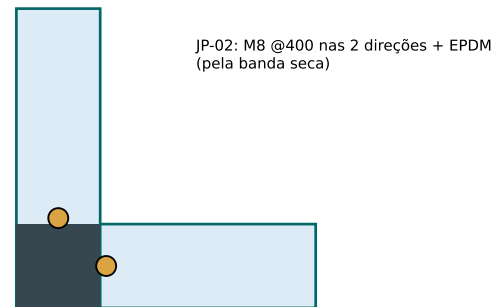

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- F4-A instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do F1: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Balancim 4 pts · içamento VERTICAL

REGRA


- Parafusa em F4-A antes de soltar o gancho

PASSO A-3 — PAREDE F3-A (3,30×2,85 m · 0,60 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-02/JP-02 · 2 olhais · MEP: 1 circ. · esquadrias: P01-J07

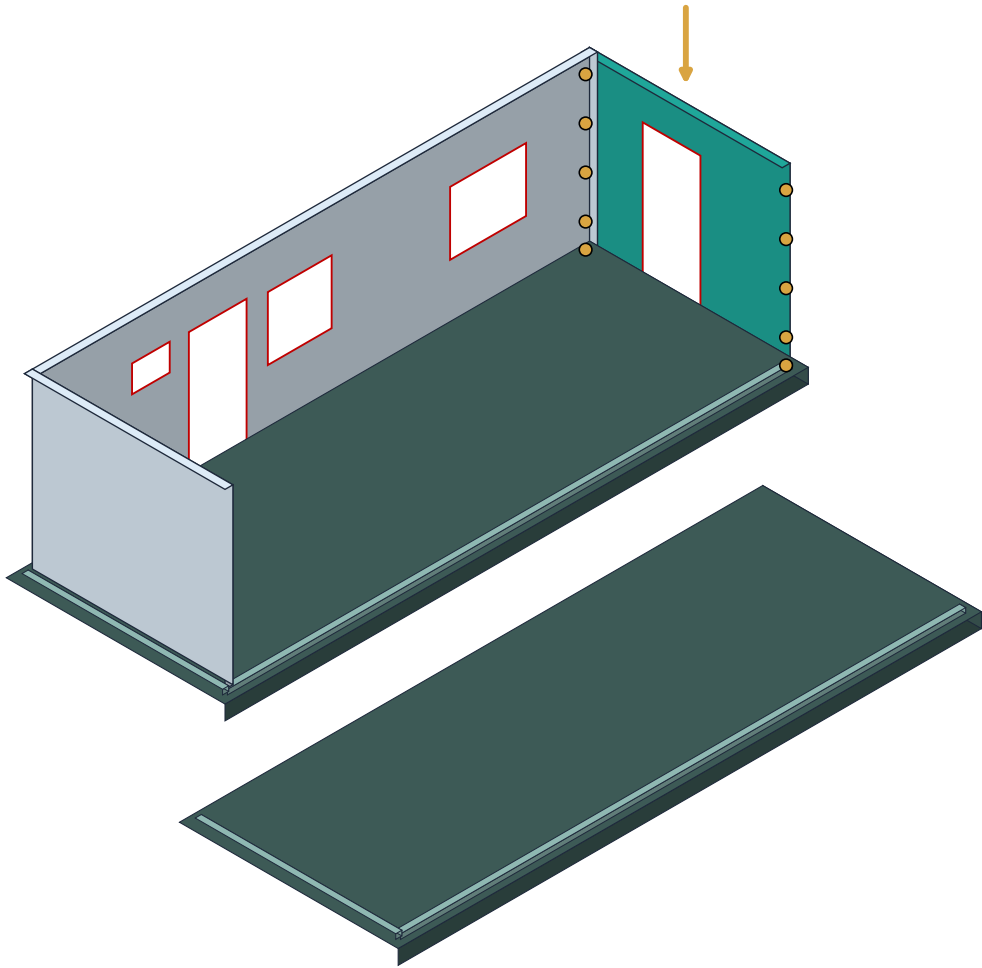

PLANTA · SEQUÊNCIA

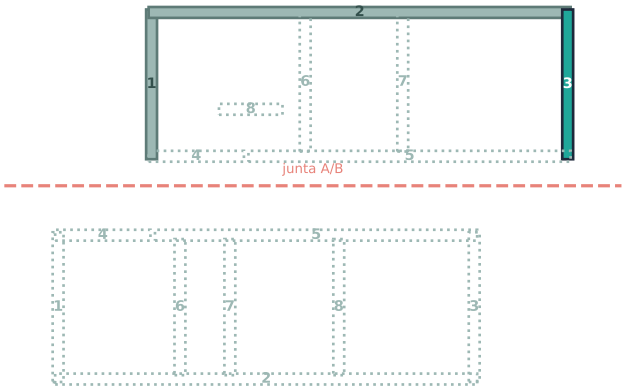

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

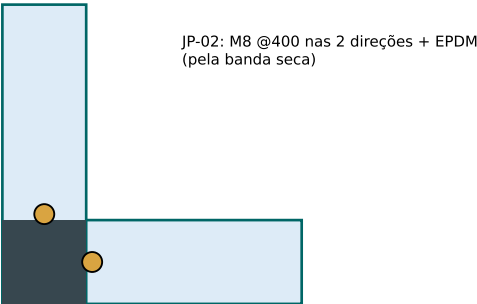

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- F1 instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do F3-A: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parafusa em F1 antes de soltar o gancho

PASSO A-4 — PAREDE F5-A (2,10×2,85 m · 0,44 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-02/JP-02 · 2 olhais · MEP: shaft cozinha · esquadrias: —

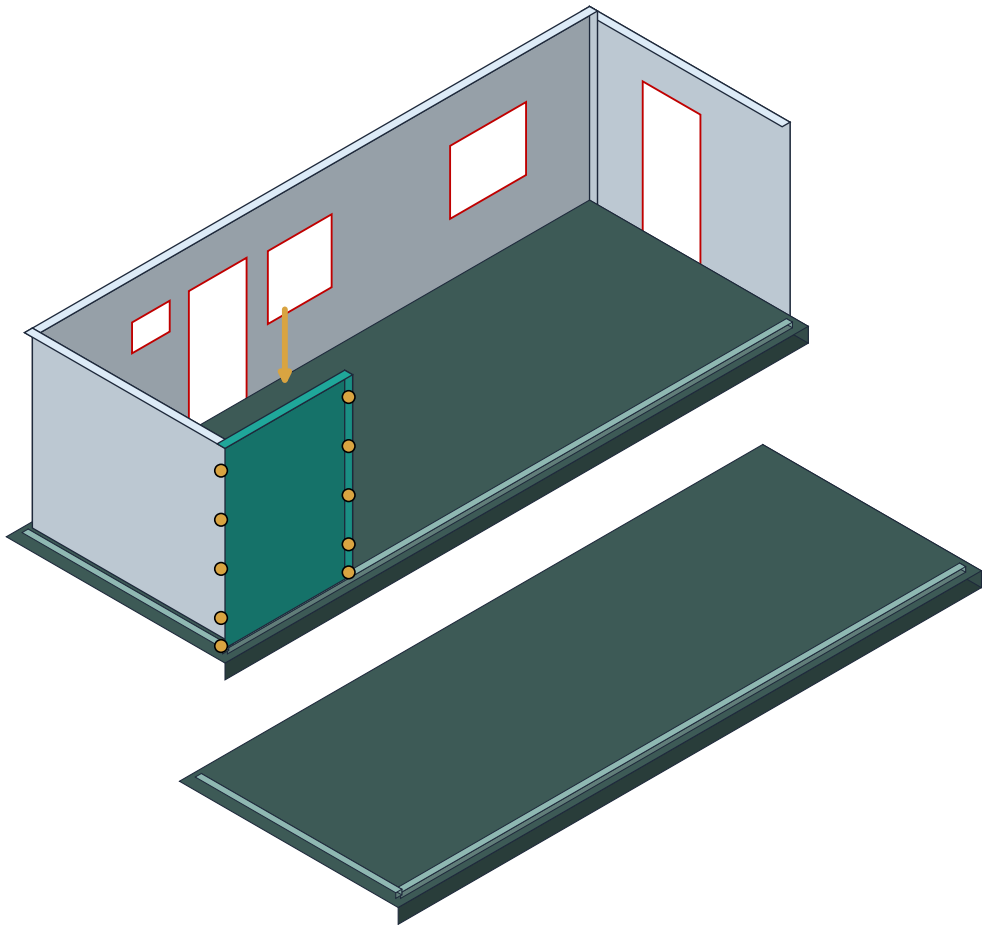

PLANTA · SEQUÊNCIA

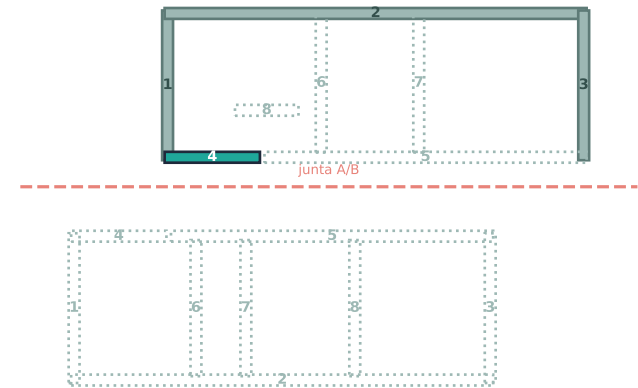

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

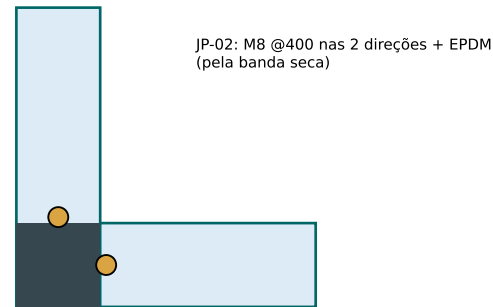

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- F3-A instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do F5-A: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Água mora AQUI: shaft testado 1,5× na fábrica — nada de hidráulica em outras paredes

PASSO A-5 — PAREDE JUNTA-A (7,10×2,85 m · 1,02 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-02/JP-02 · 3 olhais · MEP: QD-01·CXP·M12 · esquadrias: —

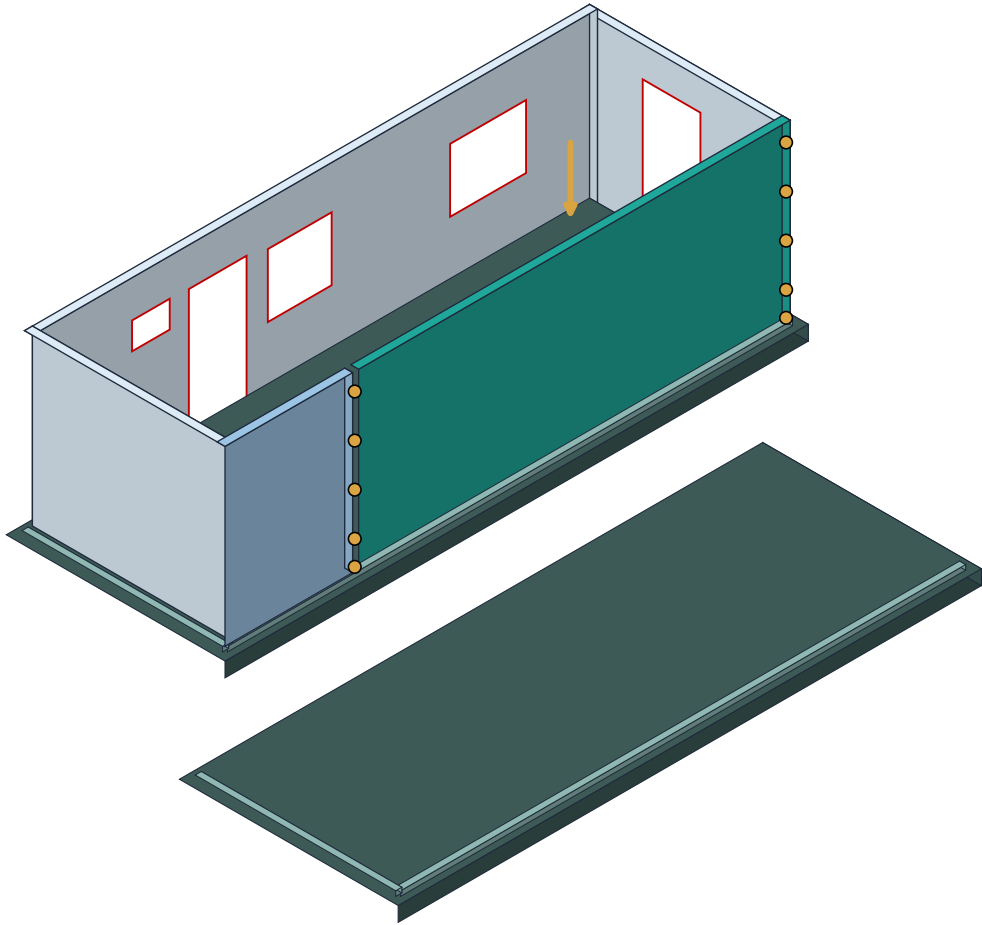

PLANTA · SEQUÊNCIA

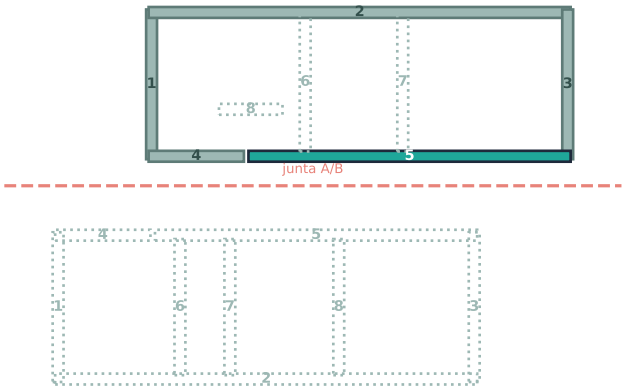

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

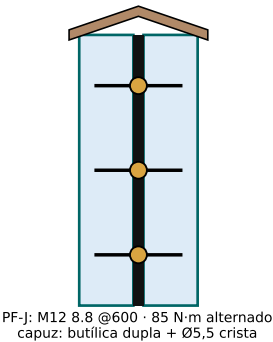

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N·m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600
- Conferir furação Ø14 (M12) no gabarito ANTES de fixar

PLANO DE INÍCIO


- F5-A instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do JUNTA-A: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Balancim 4 pts · içamento VERTICAL

REGRA


- Fecha o perímetro do módulo — o M12 pareado é o dry-fit embutido

PASSO A-6 — PAREDE IA1 (3,06×2,85 m · 0,58 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-03/JP-03 · 2 olhais · MEP: SHAFT 12/13 pts · esquadrias: PI3

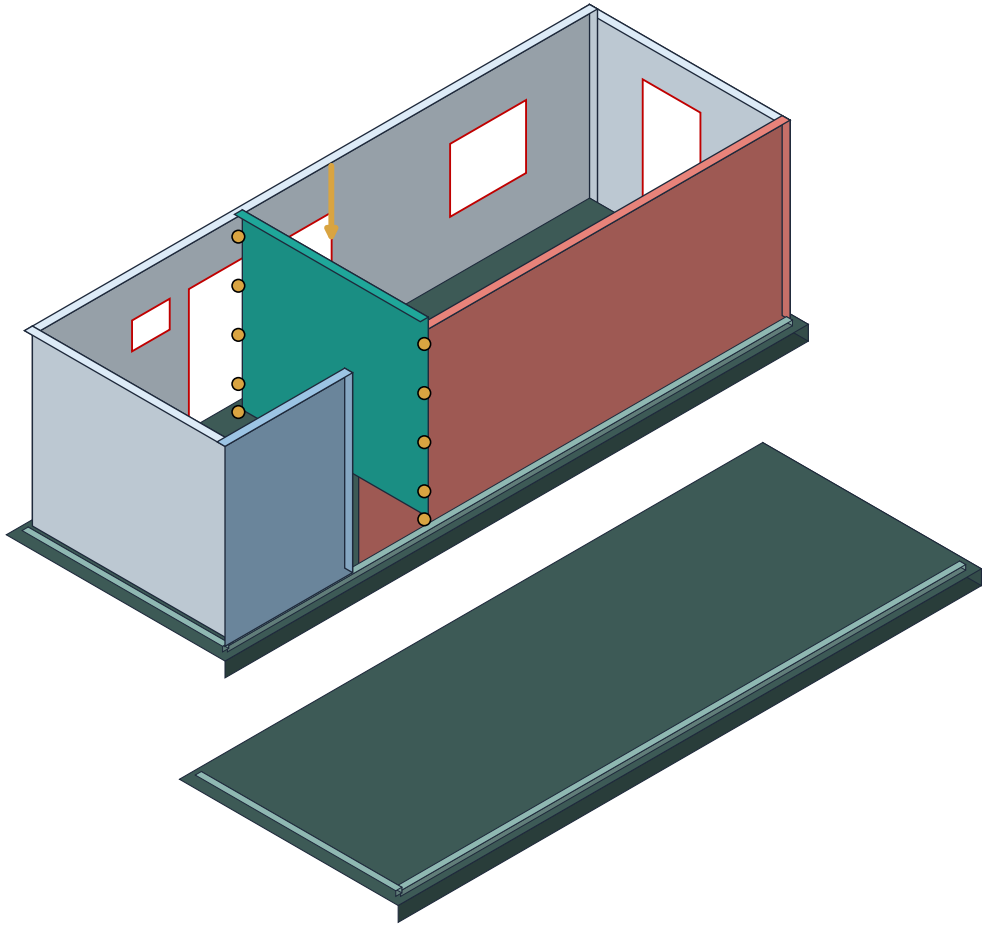

PLANTA · SEQUÊNCIA

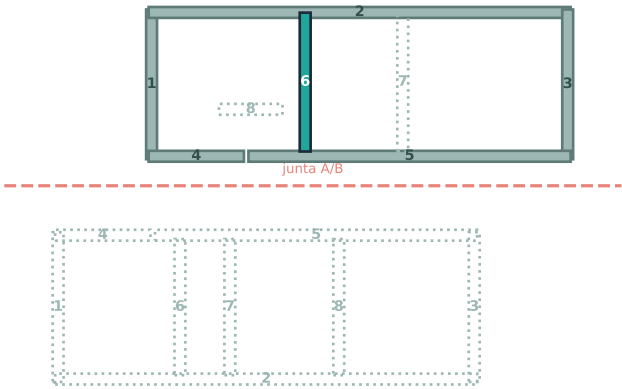

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

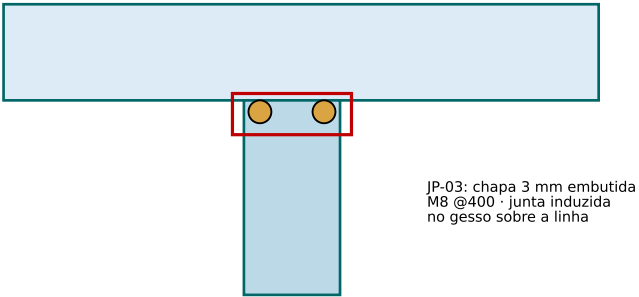

JP-03: chapa 3 mm embutida
M8 @400 · junta induzida
no gesso sobre a linha

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N·m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- JUNTA-A instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do IA1: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Água mora AQUI: shaft testado 1,5× na fábrica — nada de hidráulica em outras paredes

PASSO A-7 — PAREDE IA2 (3,06×2,85 m · 0,56 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-03/JP-03 · 2 olhais · MEP: 1 circ. · esquadrias: PI2

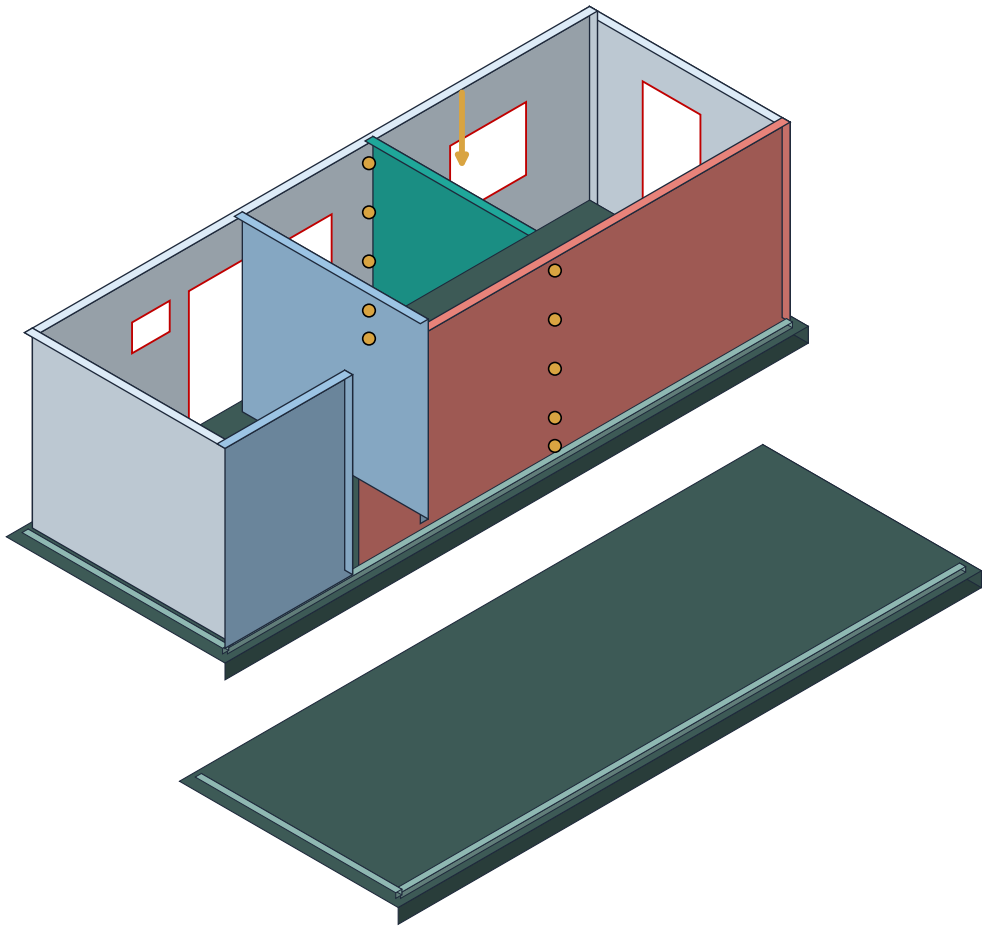

PLANTA · SEQUÊNCIA

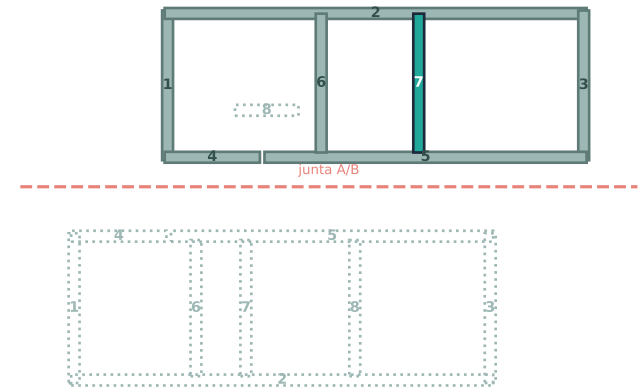

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

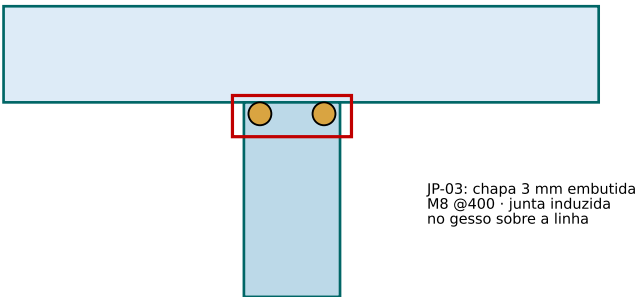

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- IA1 instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do IA2: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parafusa em IA1 antes de soltar o gancho

PASSO A-8 — PAREDE IAN (1,40x2,85 m · 0,30 t)


módulo SOCIAL · bordas JP-03/JP-01 · 1 olhais · MEP: — · esquadrias: PI4

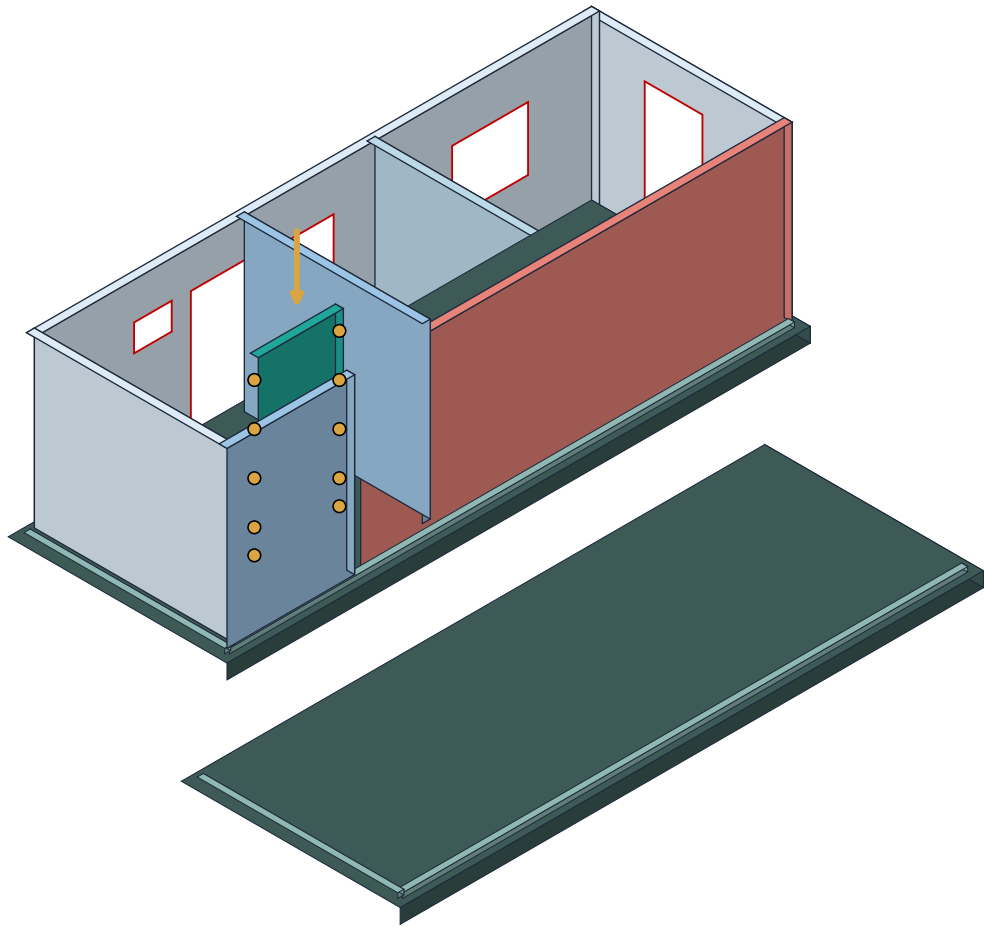

PLANTA · SEQUÊNCIA

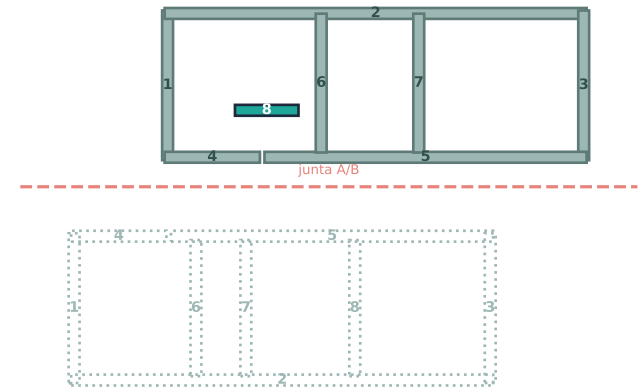

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

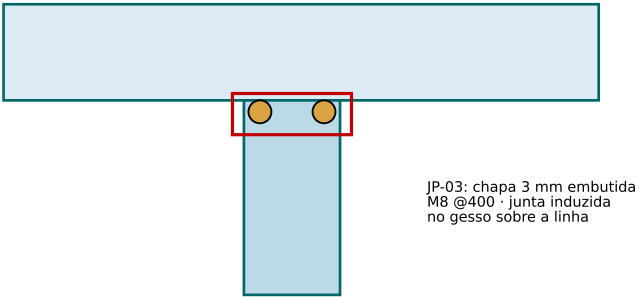

JP-03: chapa 3 mm embutida
M8 @400 · junta induzida
no gesso sobre a linha

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- IA2 instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do IAN: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parede de COMPENSAÇÃO: mede o vão real e fecha o anel (folga ±10 mm)

PASSO B-1 — PAREDE F4-B (3,30×2,85 m · 0,62 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-02/JP-02 · 2 olhais · MEP: 1 circ. · esquadrias: J04

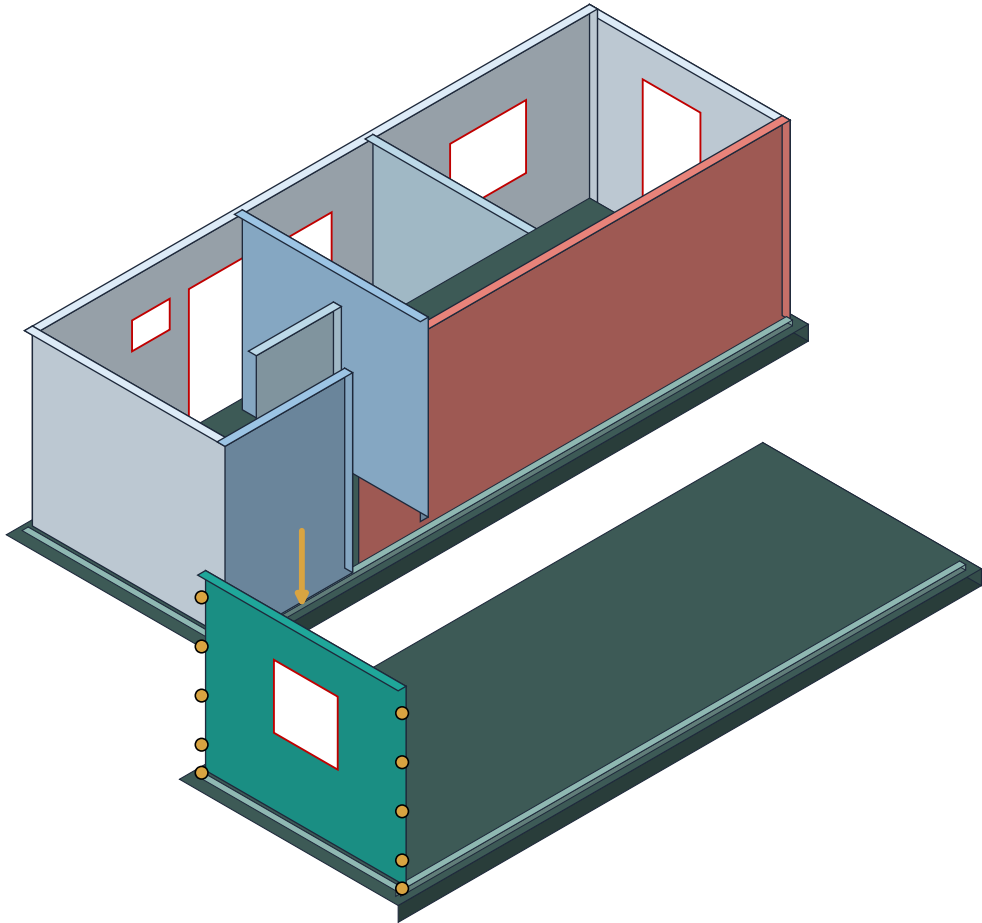

PLANTA · SEQUÊNCIA

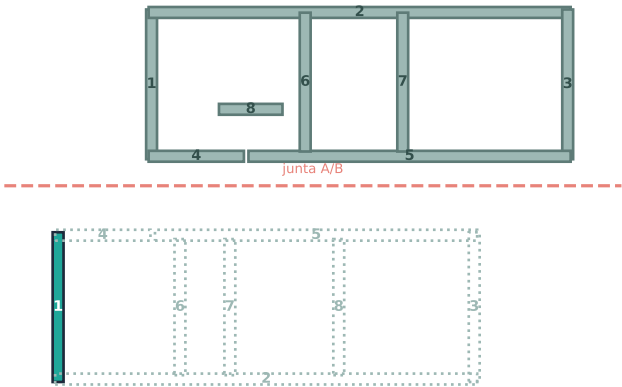

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

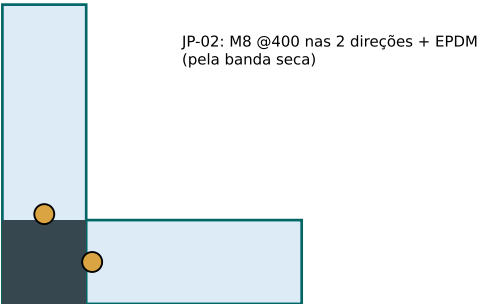

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- GM-01 conferida · PIT-00 ok
- Passaporte QR do F4-B: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Única com escora provisória (2× 45°) até a próxima chegar

PASSO B-2 — PAREDE F2 (9,30×2,85 m · 1,42 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-02/JP-02 · 4 balancim olhais · MEP: 2 circ.+tomadas · esquadrias: J03

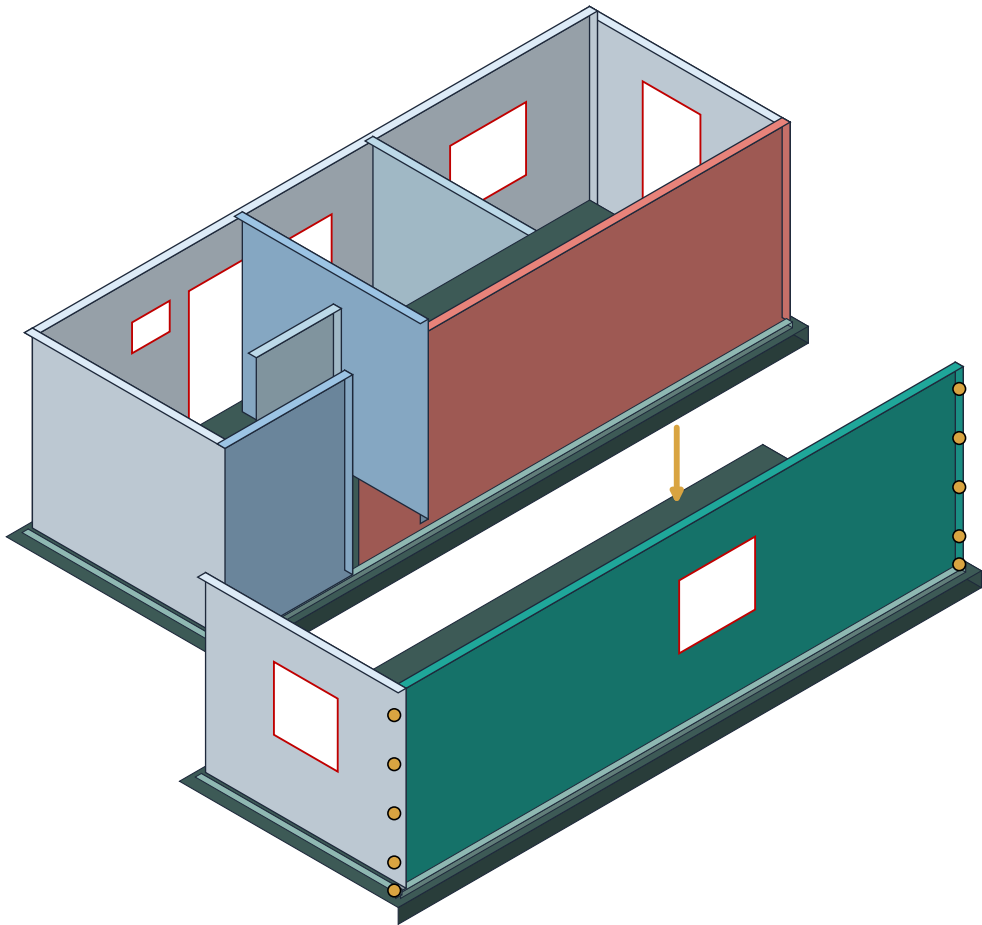

PLANTA · SEQUÊNCIA

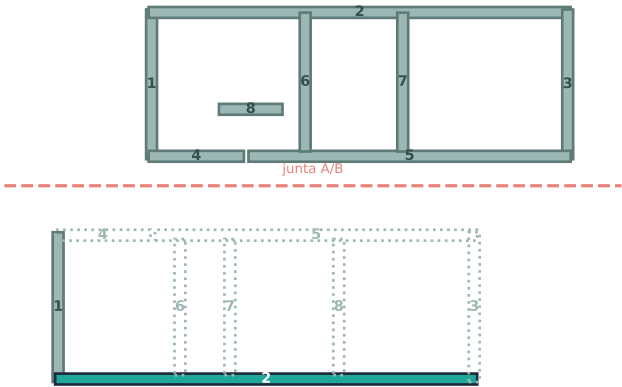

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

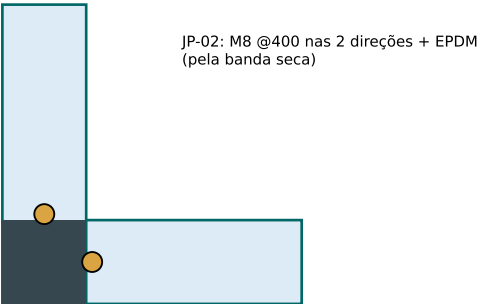

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- F4-B instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do F2: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Balancim 4 pts · içamento VERTICAL

REGRA


- Parafusa em F4-B antes de soltar o gancho

PASSO B-3 — PAREDE F3-B (3,30×2,85 m · 0,60 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-02/JP-02 · 2 olhais · MEP: 1 circ. · esquadrias: J02

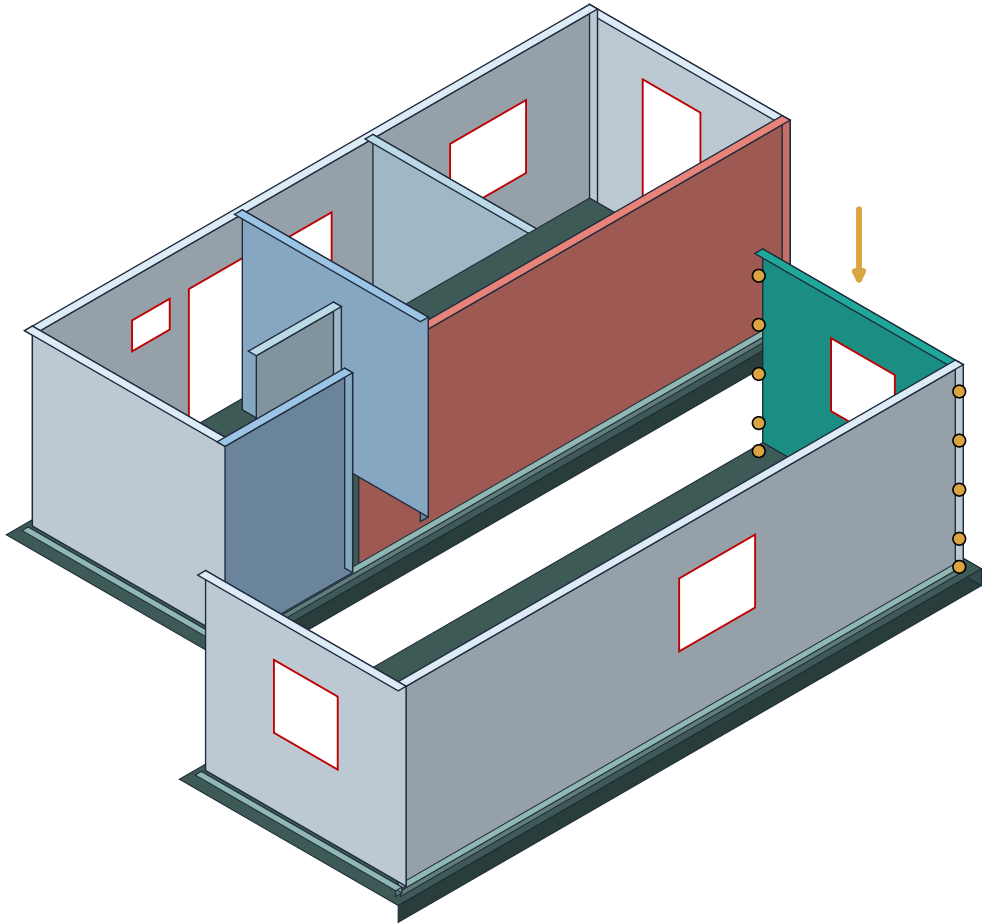

PLANTA · SEQUÊNCIA

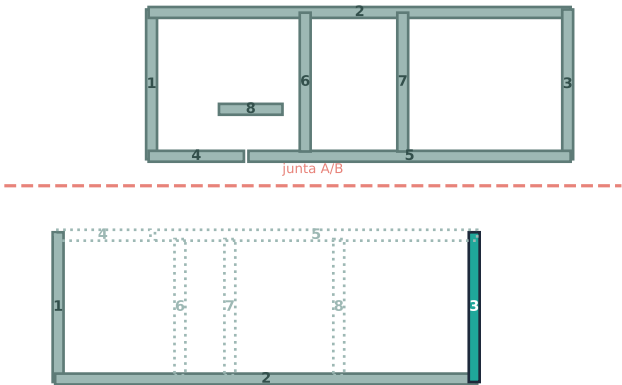

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

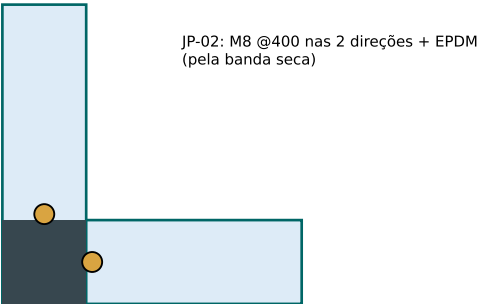

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- F2 instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do F3-B: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parafusa em F2 antes de soltar o gancho

PASSO B-4 — PAREDE F5-B (2,10×2,85 m · 0,42 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-02/JP-02 · 2 olhais · MEP: 1 circ. · esquadrias: —

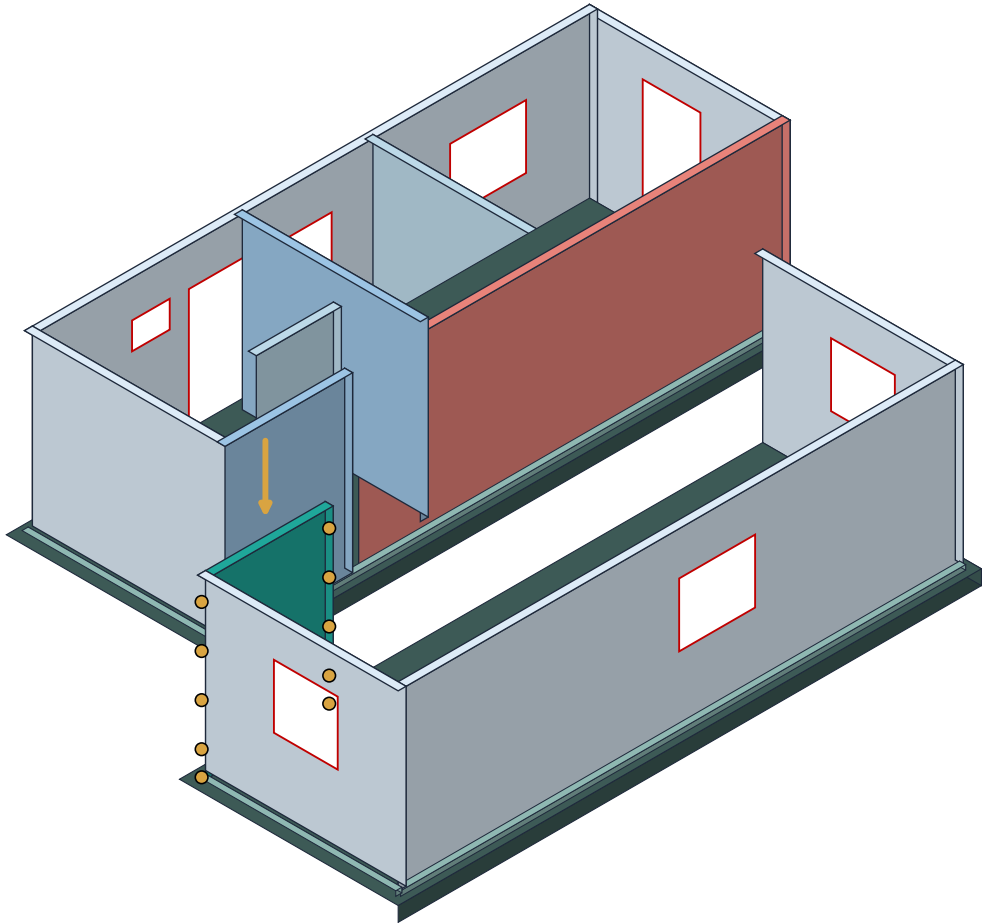

PLANTA · SEQUÊNCIA

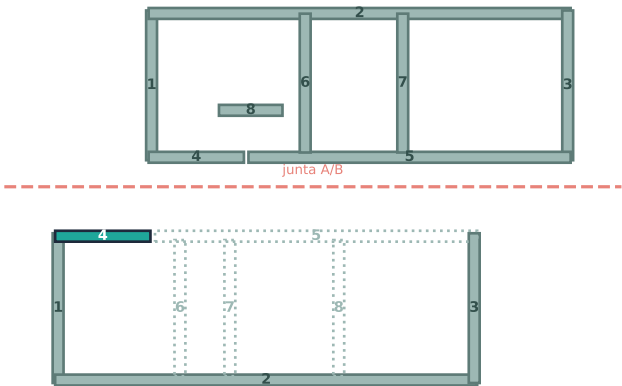

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

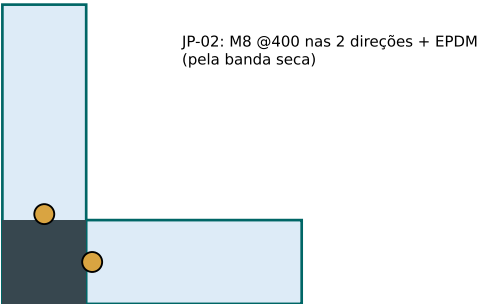

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- F3-B instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do F5-B: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parafusa em F3-B antes de soltar o gancho

PASSO B-5 — PAREDE JUNTA-B (7,10×2,85 m · 1,00 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-02/JP-02 · 3 olhais · MEP: CXP plug-in·M12 · esquadrias: PI1

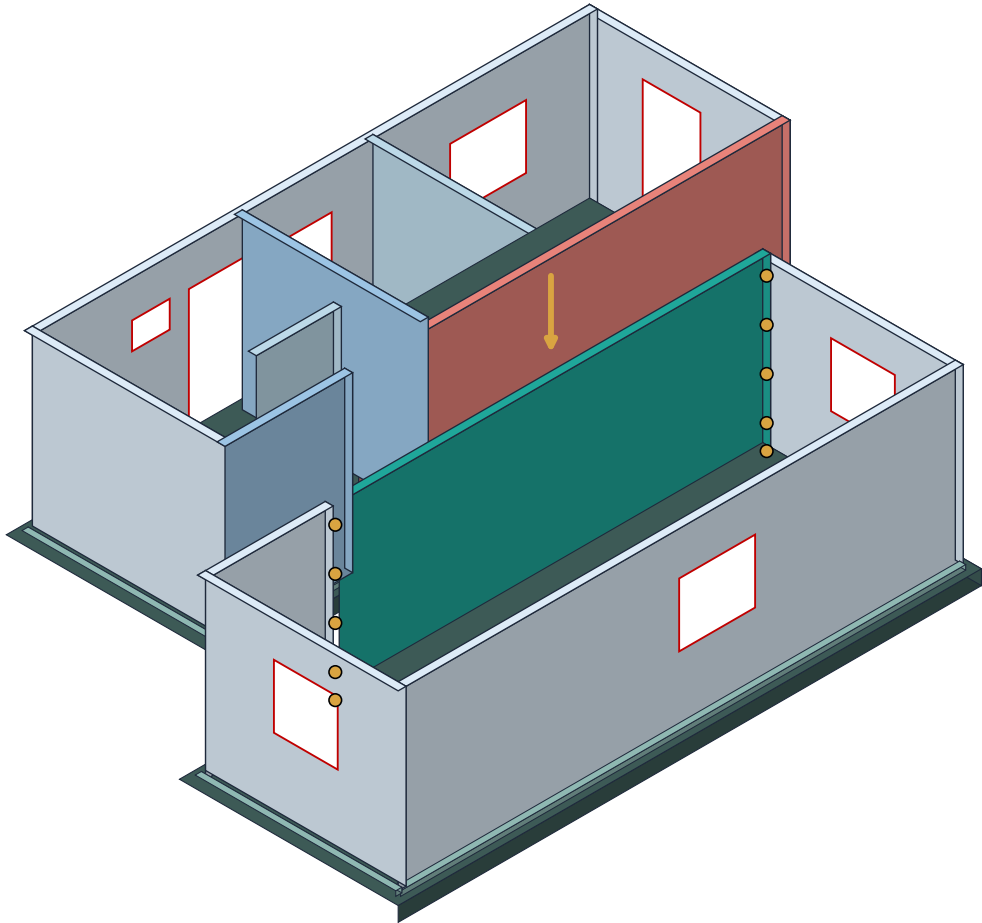

PLANTA · SEQUÊNCIA

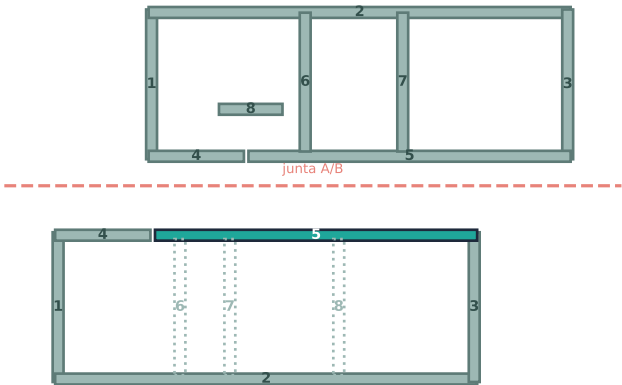

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

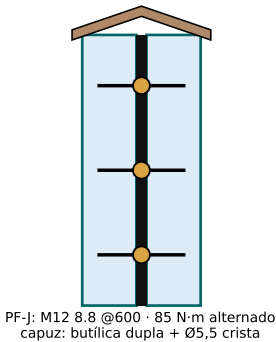

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N·m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600
- Conferir furação Ø14 (M12) no gabarito ANTES de fixar

PLANO DE INÍCIO


- F5-B instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do JUNTA-B: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Fecha o perímetro do módulo — o M12 pareado é o dry-fit embutido

PASSO B-6 — PAREDE I1 (3,00×2,85 m · 0,55 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-03/JP-03 · 2 olhais · MEP: 1 circ. · esquadrias: PI3

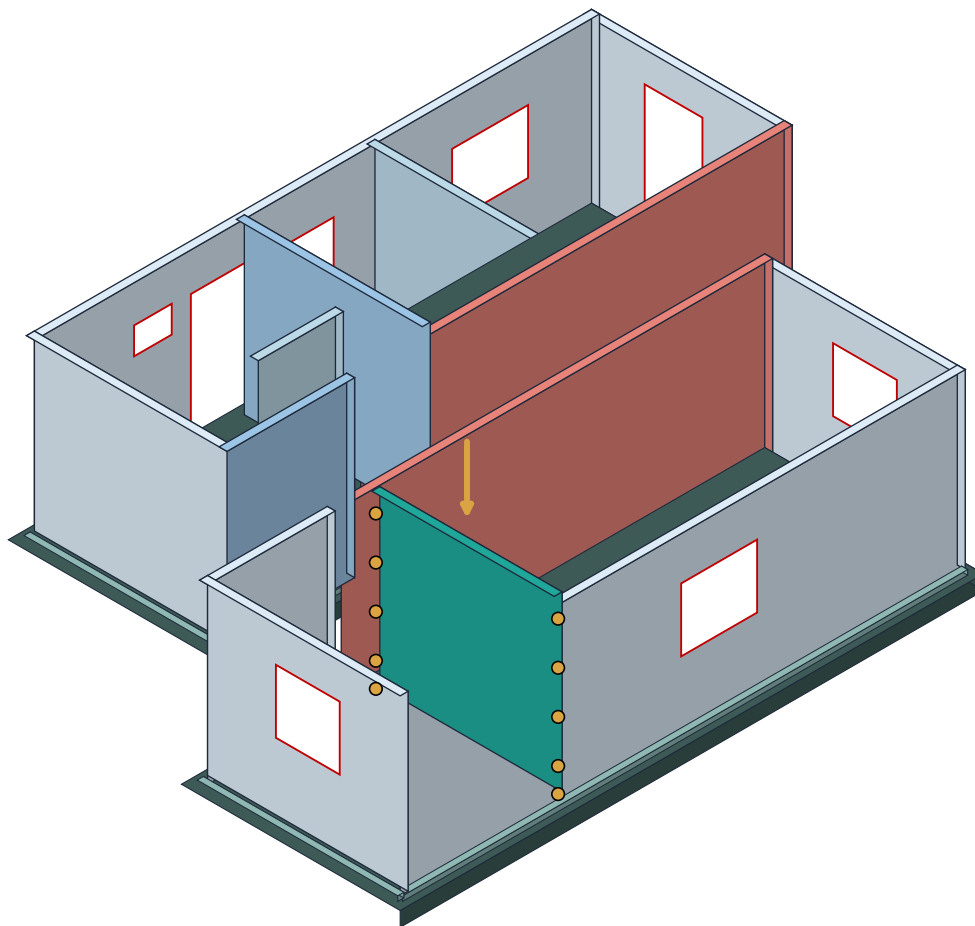

PLANTA · SEQUÊNCIA

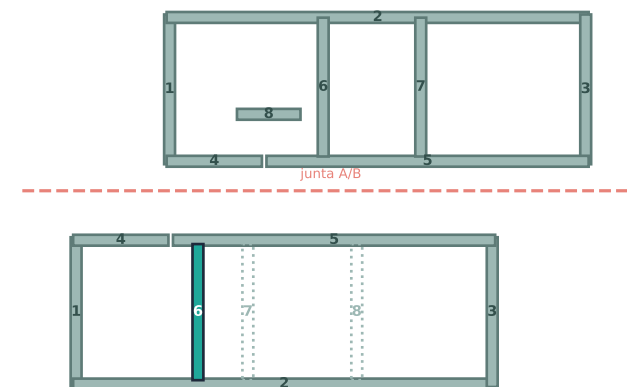

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

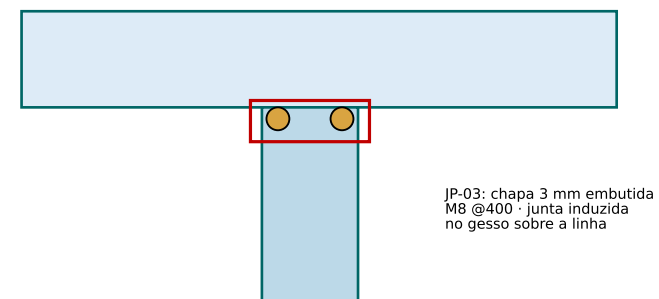

JP-03: chapa 3 mm embutida
M8 @400 · junta induzida
no gesso sobre a linha

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- JUNTA-B instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do I1: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parafusa em JUNTA-B antes de soltar o gancho

PASSO B-7 — PAREDE I2 (3,00×2,85 m · 0,55 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-03/JP-03 · 2 olhais · MEP: 1 circ. · esquadrias: PI2

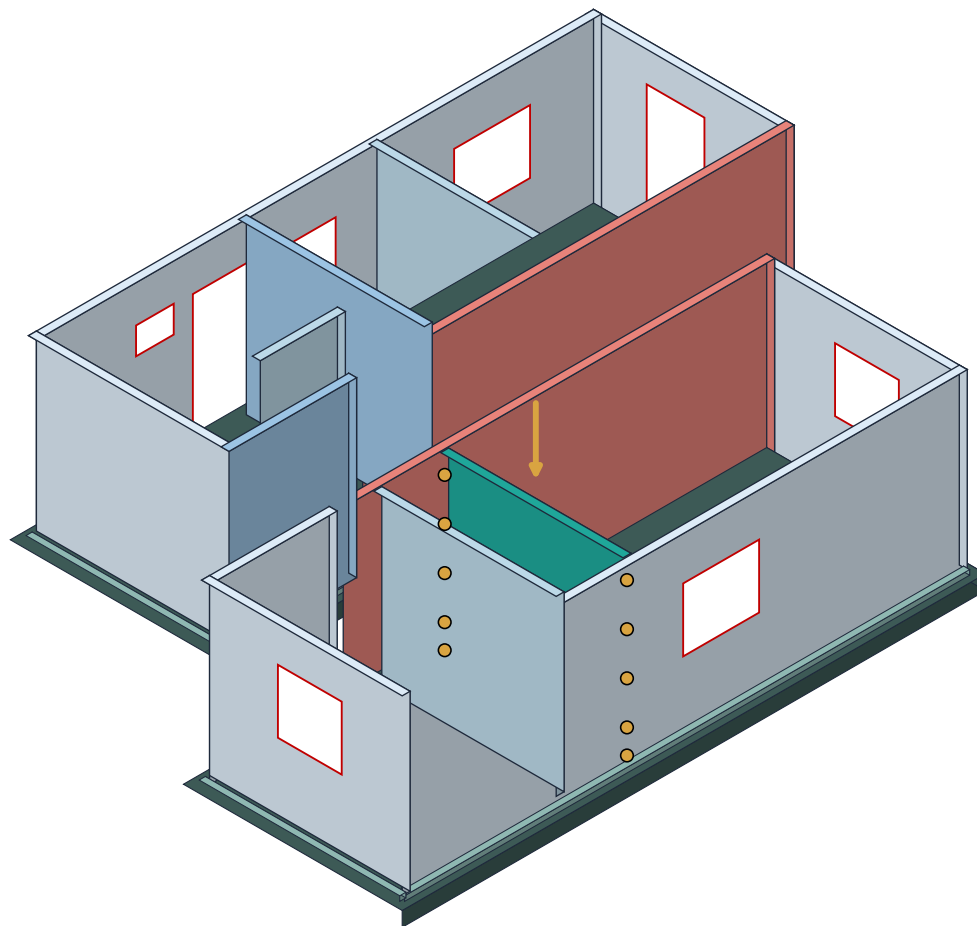

PLANTA · SEQUÊNCIA

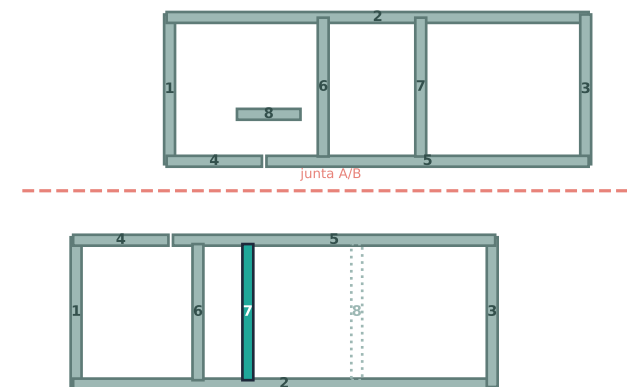

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

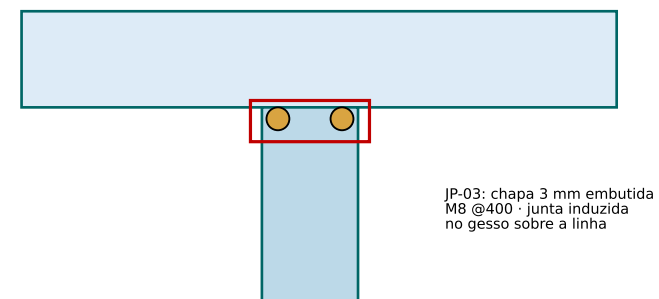

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- I1 instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do I2: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parafusa em I1 antes de soltar o gancho

PASSO B-8 — PAREDE I3 (3,00×2,85 m · 0,55 t)


módulo QUARTOS · bordas JP-03/JP-01 · 2 olhais · MEP: — · esquadrias: —

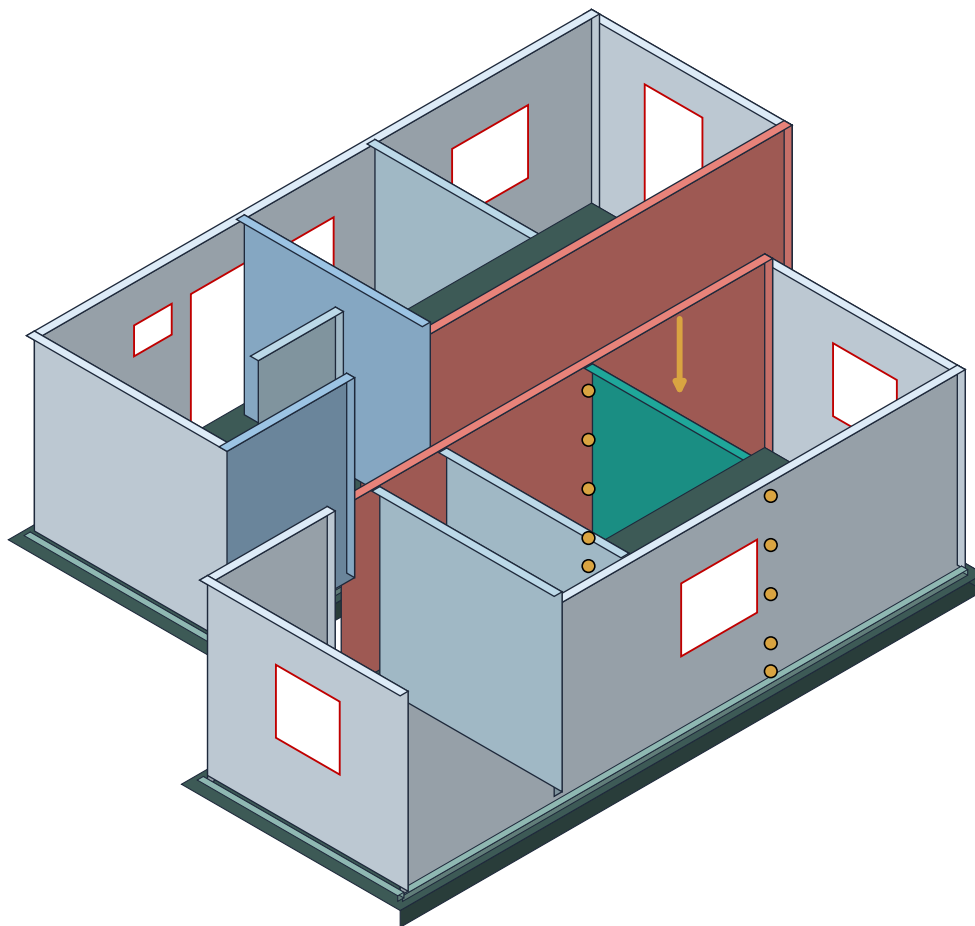

PLANTA · SEQUÊNCIA

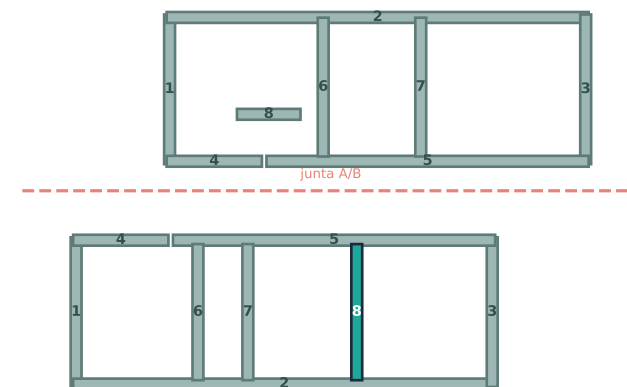

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

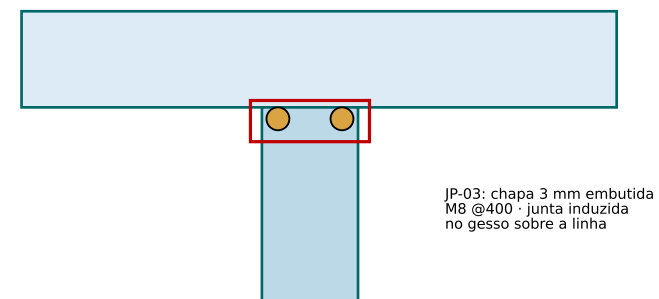

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP: M8 @400 + EPDM (parafusadeira AZUL 25 N-m)
- GM-01: encaixe + calços 3 mm + M8 lateral @600

PLANO DE INÍCIO


- I2 instalada e parafusada (PIT anterior)
- Passaporte QR do I3: torques + teste elétrico + fotos
- Rack: posição correta (carga inversa)
- Olhais conferidos · içamento vertical

REGRA


- Parede de COMPENSAÇÃO: mede o vão real e fecha o anel (folga ±10 mm)

FECHAMENTO — GUIA-ANEL JP-04


a cinta que une 16 paredes em UMA estrutura

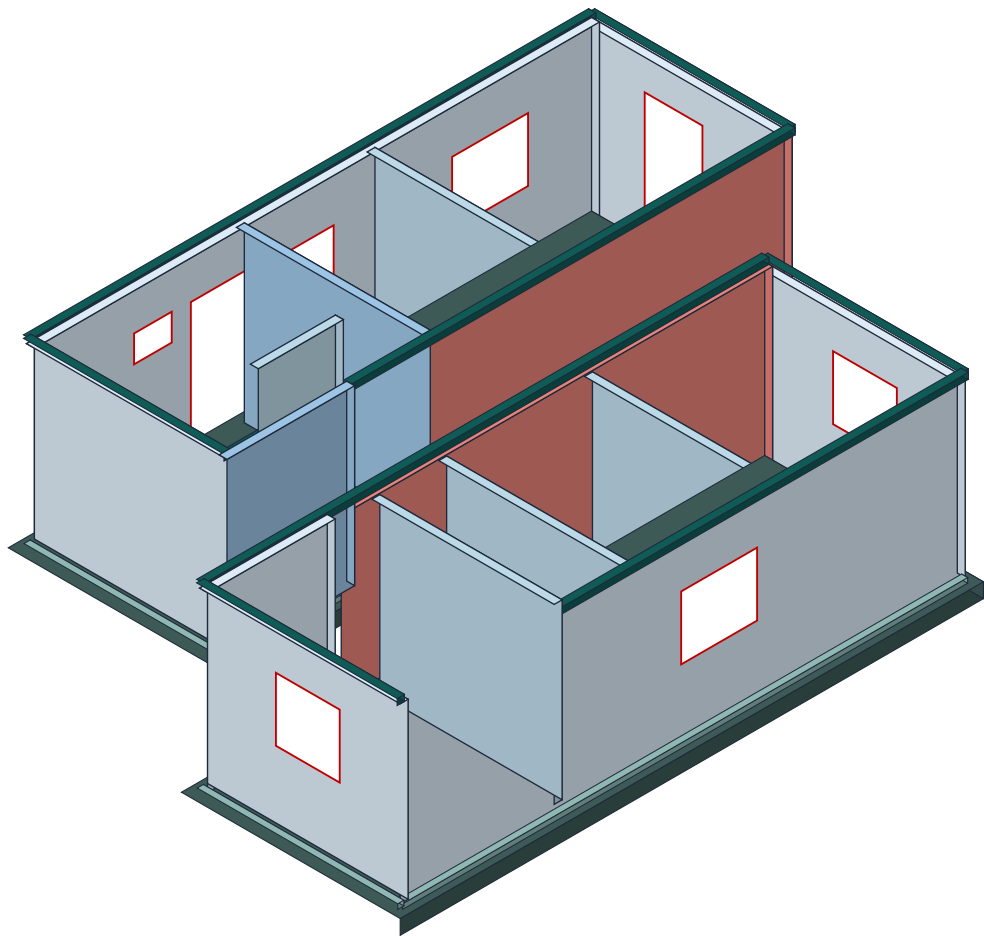

PLANTA · SEQUÊNCIA

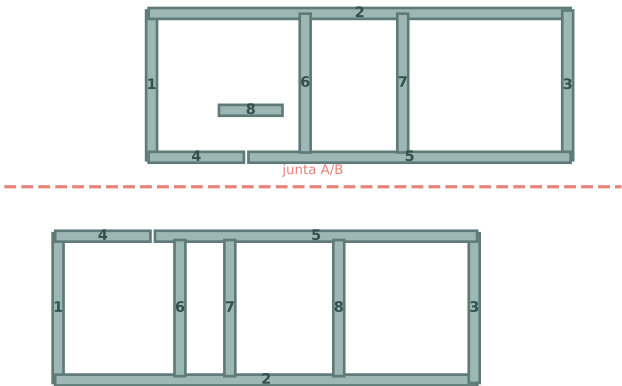

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE



JP-04 anel U120×45:
M8 @600 na guia sup.
consolos/gussets fixam nele

FIXAÇÃO DO PASSO

- JP-04: U120×45 · M8 @600 em toda guia superior
- emendas: 2xM8 + luva interna

PLANO DE INÍCIO


- 16 paredes instaladas · prumo geral ok
- M12 internos conferidos no gabarito
- anéis pré-cortados (kit)

REGRA


- Nada de forro/PTB/cassete antes do anel — ele é o pré-requisito estrutural dos três (verificação C1).

FECHAMENTO — JUNTAS E BANDAS SECAS


o único acabamento pós-montagem (~0,5 d/módulo)

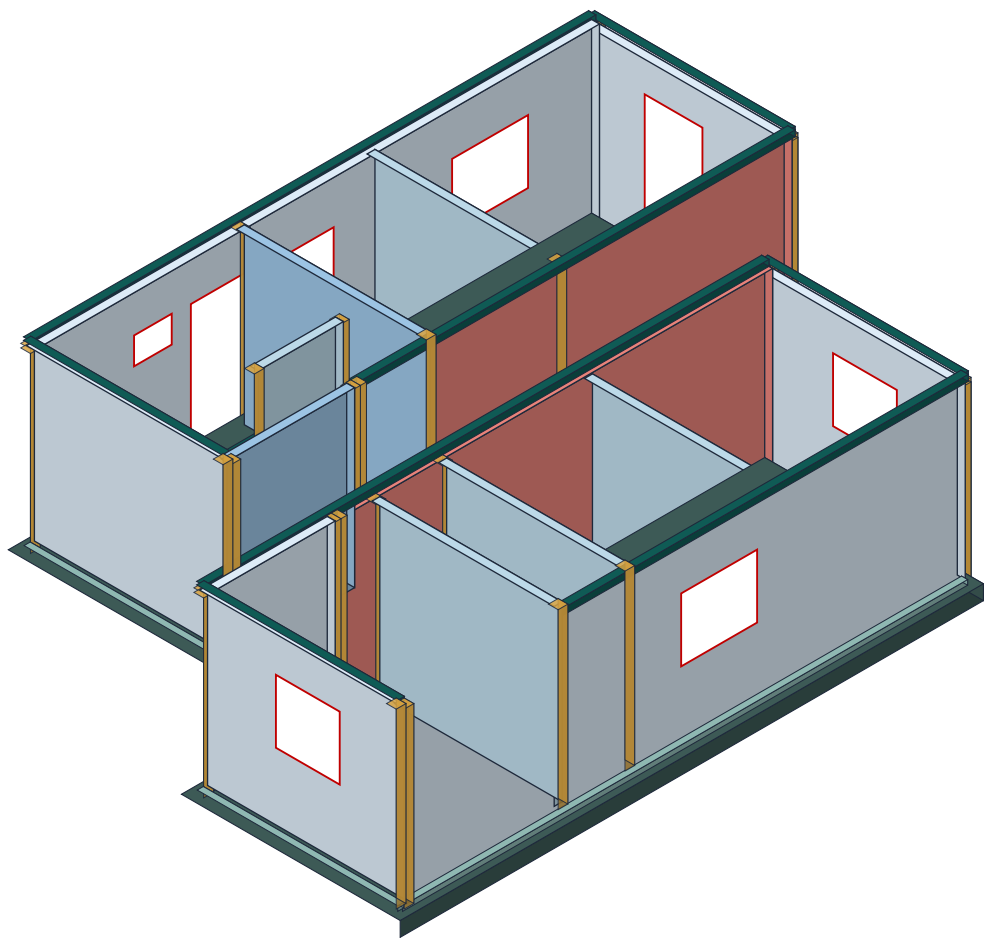

PLANTA · SEQUÊNCIA

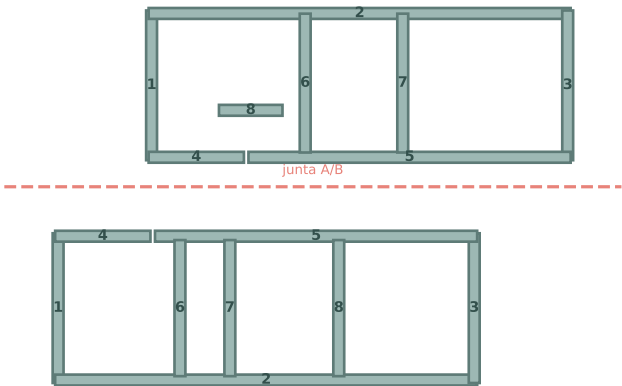

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE



FIXAÇÃO DO PASSO

- interno: tira + fita + massa ELÁSTICA + retoque
- externo: fundo de junta + selante PU (dupla-barreira C2)

PLANO DE INÍCIO


- anel instalado
- kit de juntas da casa (QR)
- PU + fundo 25 mm no kit

REGRA


- Massa rígida na junta = fissura garantida. Externo NUNCA leva 1 barreira só — teste de jato é o GO/NO-GO.

FECHAMENTO — FORRO AUTOPORTANTE


travessas na guia-anel · pé-direito 2,60

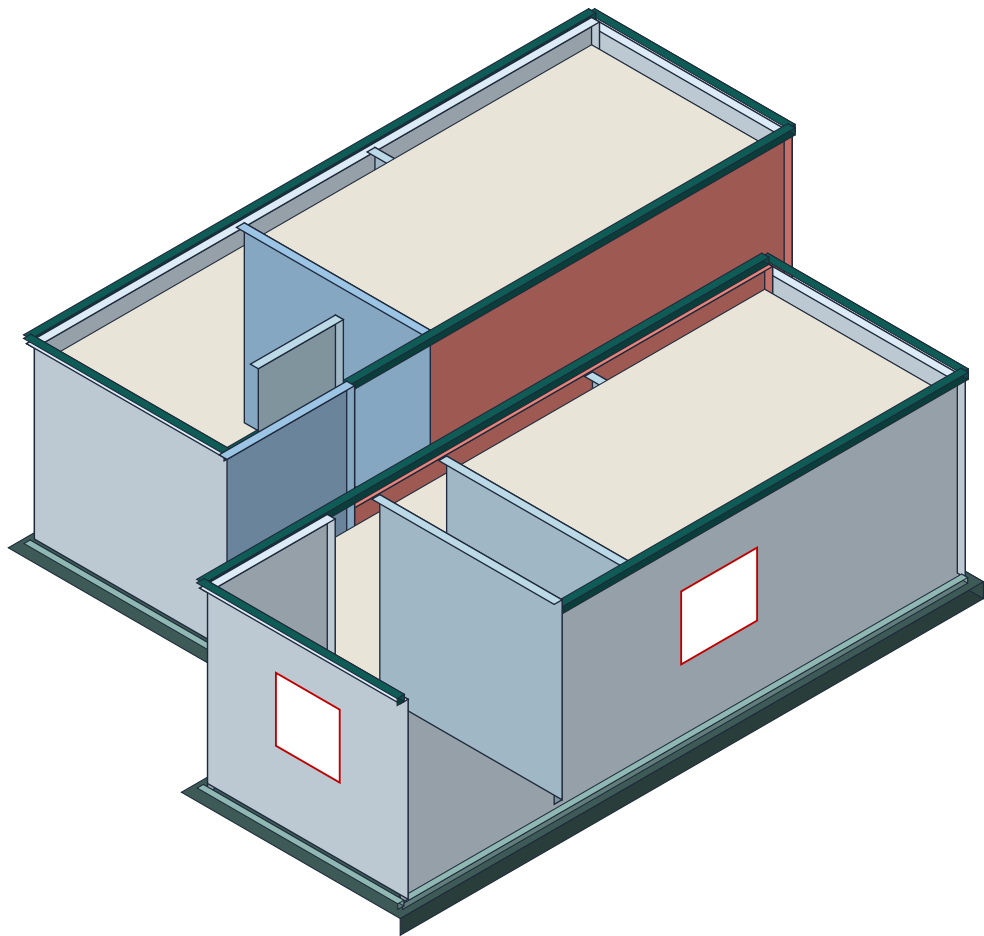

PLANTA · SEQUÊNCIA

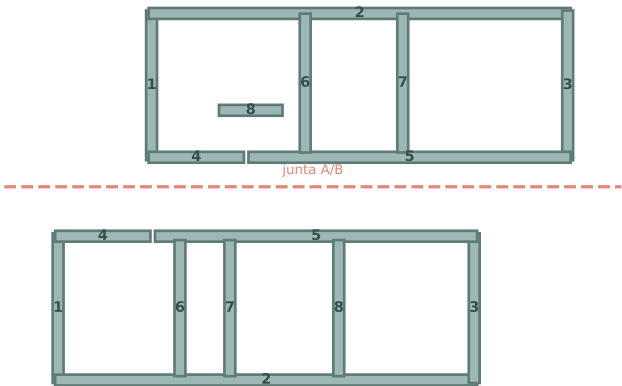

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

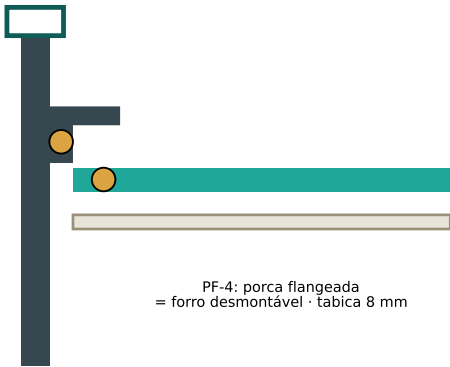

FIXAÇÃO DO PASSO

- PF-4: 2×M8 porca flangeada/apoio · 25 N·m
- GN25 @250 nas placas · tabica folga 8 mm

PLANO DE INÍCIO


- MEP de teto plugada e TESTADA
- kit forro (QR) · laser a 2,60

REGRA


- Forro fecha SÓ depois do teste elétrico — reabrir placa nova para achar conector custa uma manhã.

FECHAMENTO — PLATIBANDA PTB


painéis prontos: 0,33 fachadas · 0,37 junta

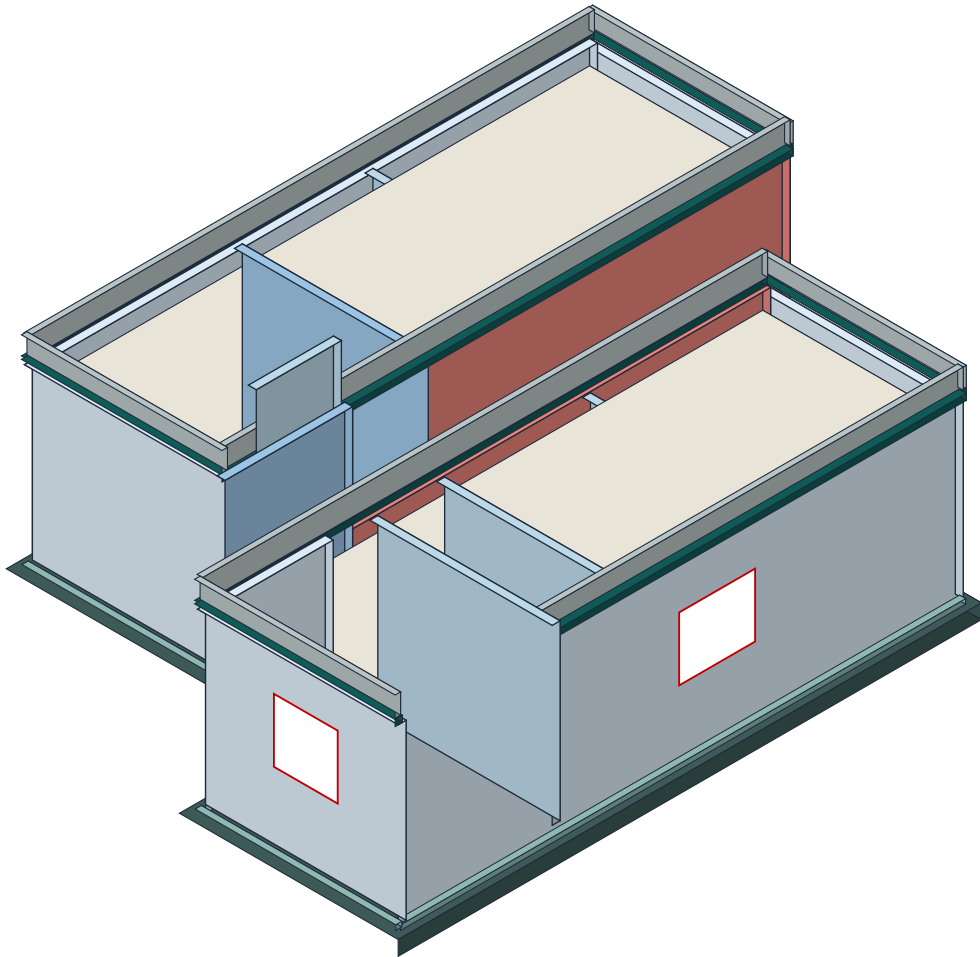

PLANTA · SEQUÊNCIA

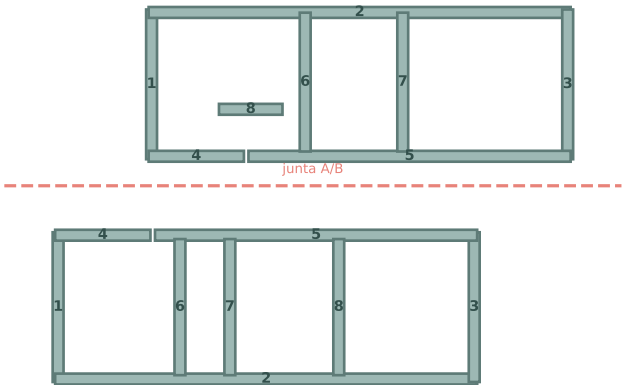

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

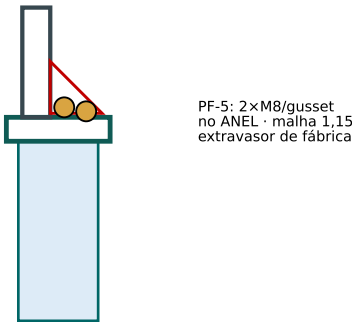

PF-5: 2×M8/gusset
no ANEL · malha 1,15
extravador de fábrica

FIXAÇÃO DO PASSO

- PF-5: 2×M8/gusset no ANEL · malha 1,15
- junta paredexPTB: 3 mm flexível

PLANO DE INÍCIO


- anel instalado
- PTB na ordem (rack próprio)
- pórtico p/ PTB-A (85 kg)

REGRA


- Calha se testa com ÁGUA antes do cassette cobrir — depois é arqueologia.

FECHAMENTO — CASSETES DE COBERTURA


testados no chão · consolos no anel · i=7%

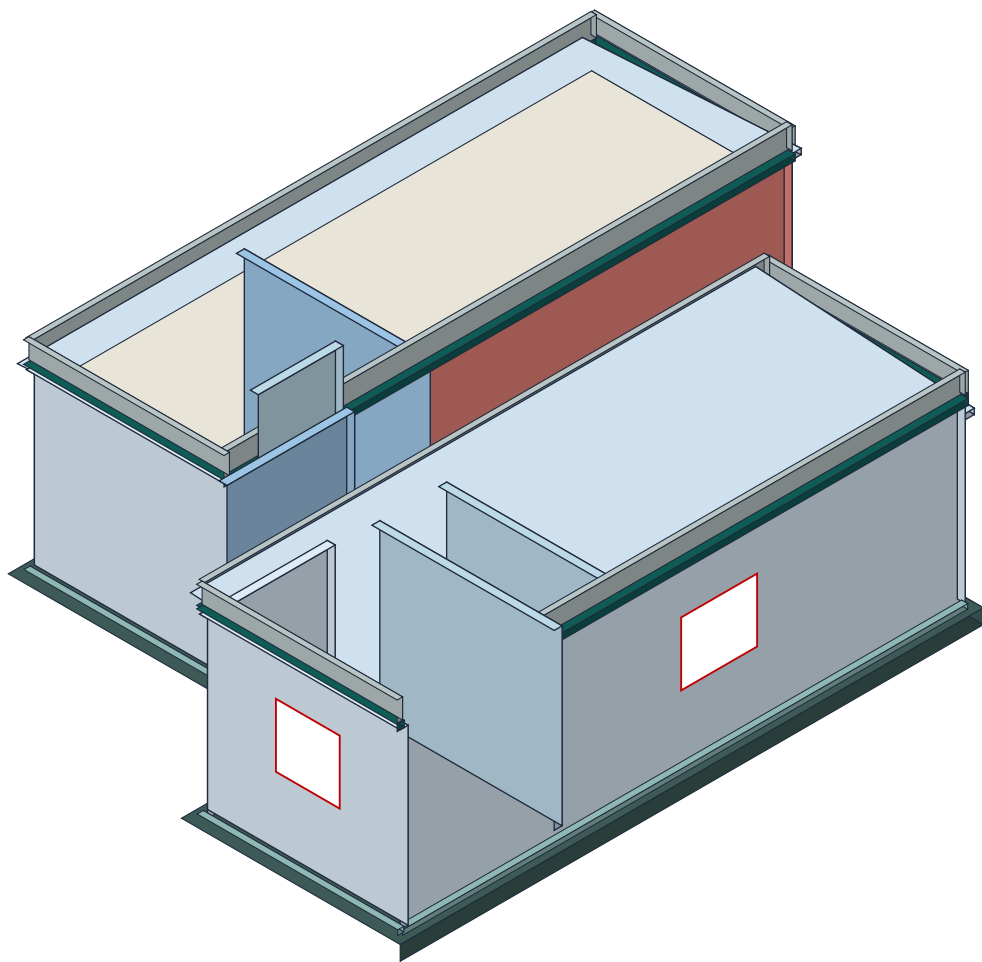

PLANTA · SEQUÊNCIA

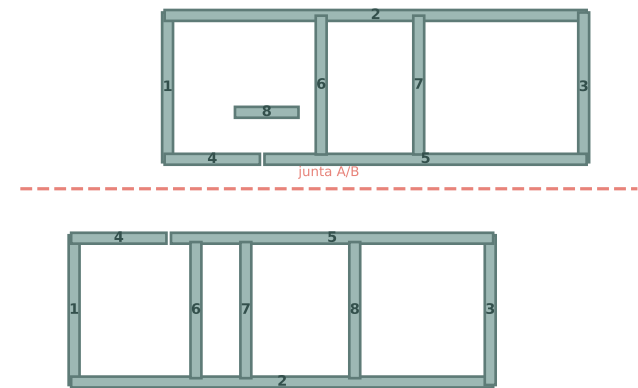

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

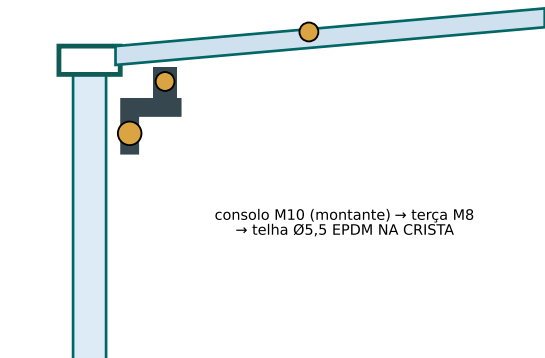

consolo M10 (montante) → terça M8
→ telha Ø5,5 EPDM NA CRISTA

FIXAÇÃO DO PASSO

- terça×consolo M8 · consolo M10 45 N·m
- telha Ø5,5 EPDM @300 NA CRISTA

PLANO DE INÍCIO


- laudo de chuva do cassette (QR)
- consolos 3,06/3,01/2,97/2,92 conferidos
- balancim aferido (~0,40 t)

REGRA


- Parafuso na calha da onda = vazamento assinado. Crista, sempre.

FECHAMENTO — ACOPLAMENTO + CUMEEIRA


24×M12 · 85 N·m · a casa vira UMA

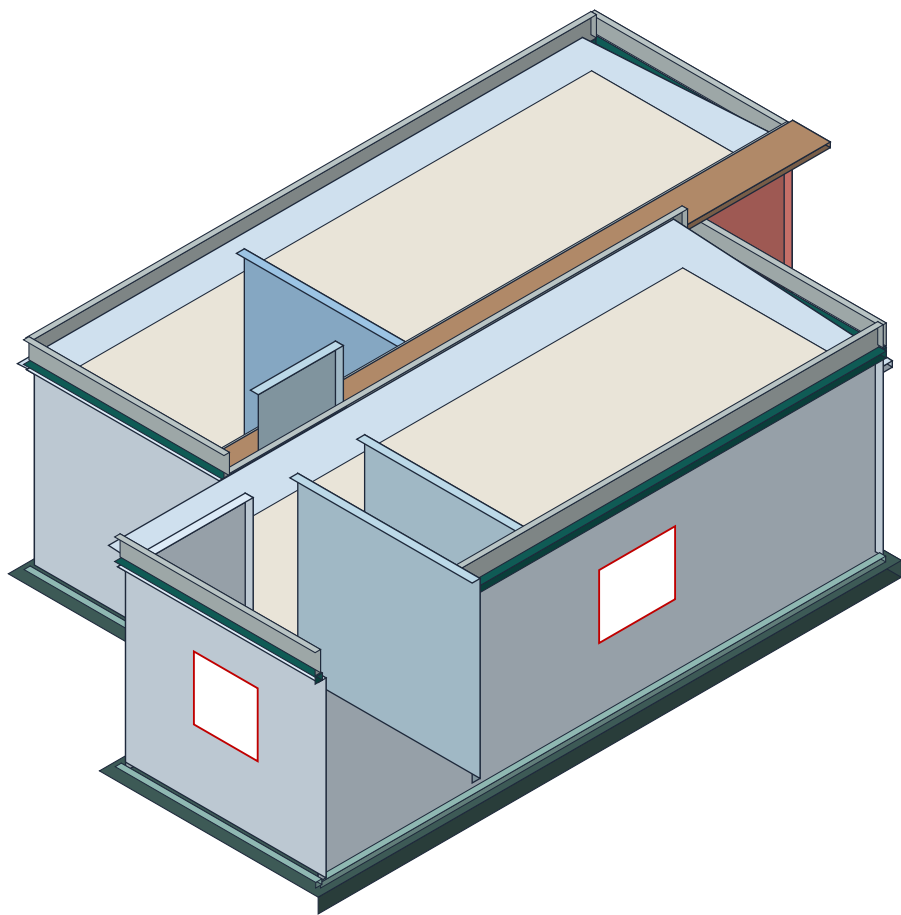

PLANTA · SEQUÊNCIA

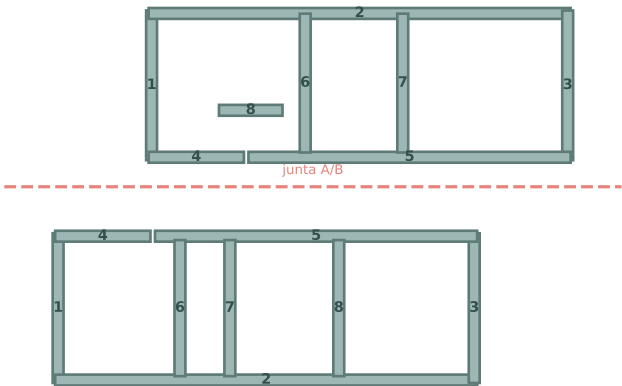

CORTE DA JUNÇÃO-CHAVE

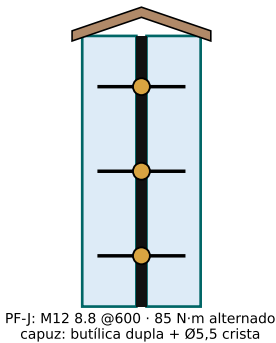

FIXAÇÃO DO PASSO

- PF-J: 24×M12 8.8 @600 · 85 N·m ALTERNADO centro→pontas
- capuz: butílica dupla + Ø5,5 · PL-D nas 4 pontas · plug-ins

PLANO DE INÍCIO


- PIT-07 dos 2 módulos
- faces limpas + EPDM contínuo
- torquímetro VERMELHO aferido (selo)

REGRA

- Teste de mangueira na cumeeira + teste elétrico geral ANTES da vistoria — PIT-08 é o passaporte da casa.

CORTES GERAIS DO CONJUNTO + REGISTRO

CORTE TRANSVERSAL COTADO (pela junta)

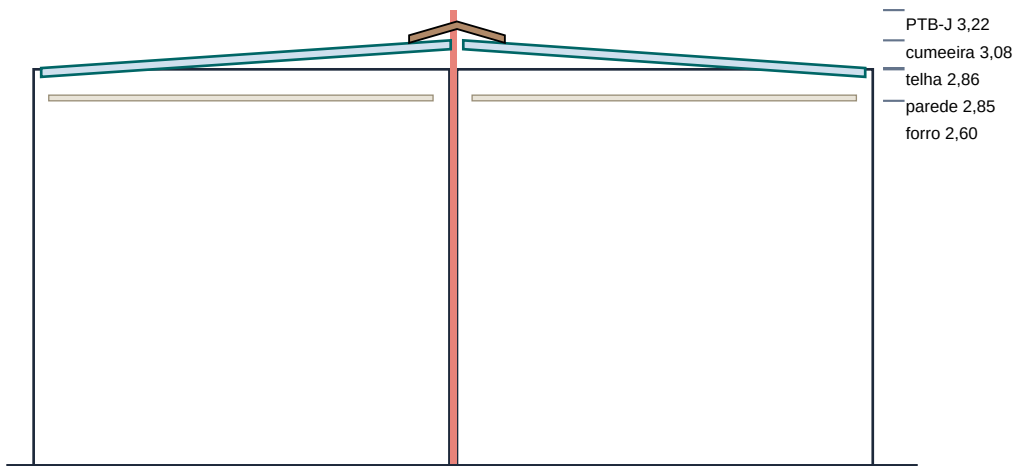

CADEIA DE PIT (quem libera quem)

- ▶ PIT-00 radier+GM → paredes A-1..A-8
- ▶ PIT módulo A → paredes B-1..B-8
- ▶ PIT módulo B → guia-anel
- ▶ anel → juntas || (forro → PTB → cassetes)
- ▶ PIT-07 ×2 → acoplamento M12
- ▶ PIT-08 → entrega/medição

REGISTRO (melhoria por uso): este pacote nasce da fusão dos 3 formatos anteriores — storyboard em planta (didática da sequência), isométricos (leitura volumétrica que faltava no papel) e cortes de junção (execução) — na MESMA prancha, um passo por página.

FILA V-NEXT (dados do piloto): tempo-alvo REAL por passo entra no bloco de dados · fotos de obra substituem isométricos como referência visual dupla · IFC R12 → geometria exata (vãos milimétricos, shaft, QD) regenerada no mesmo renderer · QR de cada prancha abre o passo correspondente do plano interativo (HTML) no tablet.

ERRATA R15 - DESAMBIGUACAO DE CAMPO

MTX-CM-2026-001 - inserida na consolidacao de pipeline R15 (06/07/2026)

1) NOMENCLATURA DE PAREDES INTERNAS - nao confundir os dois conjuntos

Existem dois conjuntos de paredes internas parecidos, um por modulo:

MODULO A (passos A-6, A-7, A-8): IA1 . IA2 . IAN

MODULO B (passos B-6, B-7, B-8): I1 . I2 . I3

Fonte de verdade: Romaneio_Fabricacao_R15.xlsx, aba 08_Paredes_Prontas. Se esta prancha ou o Manual de Campo A5 usar "I1/I2/I3" para descrever um passo do MODULO A (A-6/A-7/A-8), esta errado -- o correto para o modulo A e sempre o prefixo "IA" (IA1/IA2/IAN). Os codigos sem prefixo (I1, I2, I3) pertencem exclusivamente ao modulo B.

Esquadrias associadas (aba 08, coluna D): IA1->PI3 | IA2->PI2 | IAN->PI4 | I1/I2/I3 -> sem esquadria.

2) CHAPAS DE ESPERA CHP-T / CHP-C - peca critica da juncao em T

As chapas de espera sao a peca que recebe o parafuso PF-3 na juncao tipo T: "em campo NINGUEM fura o painel" (Caderno de Juncoes R14).

- CHP-T: chapa de espera para juncao em T (parede que encontra outra no meio do vao).

- CHP-C: chapa de espera para juncao em canto (L).

- 140 chapas + 280 porcas-rebite M8 por casa (Nesting R15, aba 03).

- PF-3 = 152 un/casa fixam nessas chapas, 2xM8 por encontro, torque 25 N.m (ficha PIT-W2c).

- Instrucao de campo: identificar a chapa de espera embutida na borda de juncao (JP-01/JP-02/JP-03) ANTES de aproximar as duas paredes -- ela ja vem de fabrica; nao fure o painel para criar um ponto de fixacao novo.

Detalhe completo: Manual_Fabricacao_W_R15.pdf (Detalhe JP 1/2, 2/2, 2/2-B, 2/2-C) e Caderno_Juncoes_R14.pdf (6 pranchas).

Ver MTX-CM-2026-001_Nota_Consolidacao_R15.txt para a lista completa de correcoes do pipeline documental R14->R15 e para as pendencias que exigem decisao de engenharia.
