

16 PAREDES-PRONTAS · GERADAS DO ROMANEIO R13

1 ficha = 1 parede = 1 QR · croqui + W1-W6 + kit paramétrico · cotas R4-2,60 · rev. R13.2 · 06/07/2026 · PF-2 recontado · CHP integradas (romaneio/orçamento/PIT-W2c)

R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO (painel PIR autoportante)

guias U100 contornando todos os painéis PIR 70 mm — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas. Base: catálogo Termilor Cold TC 70 — vão admissível 4,40 m (bi-apoiado, flecha L/120, 75 kg/m²) >> pé-direito 2,85 m; folga ≈3x para vento de cálculo 0,60 kN/m² (NBR 6123). Vãos de esquadria: requadro alumínio (recorte no painel). Exceções mantidas: 10 montantes de canto (junções JP) · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01/P02. PF-3: 206 → 152 un/casa.

Data-driven

estas fichas são GERADAS da aba 08 do Romaneio R13 — editar a planilha e rodar o gerador reemite as 16 fichas (nenhuma edição manual)

Conjunto: 16 SKUs · 11.3 t/casa

módulo SOCIAL: F4-A→IAN (ordem A-1..A-8) · módulo QUARTOS: F4-B→I3 (B-1..B-8) · rack em carga inversa · aço INALTERADO vs R12 (a aba 01 já era mínima — a R13 alinha as fichas ao modelo)

Correções de alinhamento aba 08 → fichas (bugs R12)

J04 desenhada em F4-B → pertence à F5-B · portas PI3/PI2 desenhadas em I1/I2 → pertencem à IA1/IA2 · W1 citava 58 montantes + vergas inexistentes no romaneio de corte (aba 01 tem 18 montantes)


Coordenadas exatas de MEP

as caixas no croqui são posicionais; a furação real usa o GABARITO DE COORDENADAS (Anexo B / transparência X·Z) — fonte única

AVISO ESTRUTURAL (bloqueante — C1): a premissa 'painel PIR 70 portante' exige validação dos limites do DATec SINAT nº 10 (compressão + vento + diafragma), dos apoios de cumeeira na junta e memorial revisado com ART antes da produção em série. Sequência de leitura por estação: W1 usa o quadro (croqui + requadro) · W2 usa MEP + painéis · W3 usa paginação · W4 usa esquadrias/juntas (requadro alumínio) · W6 confere o kit e a posição de rack. Regras completas: Manual de Fabricação W (Mestre R5, Vol. 2).

SKU F4-A — 3,29×2,85 m · 0.62 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-1 · posição no rack 16 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais

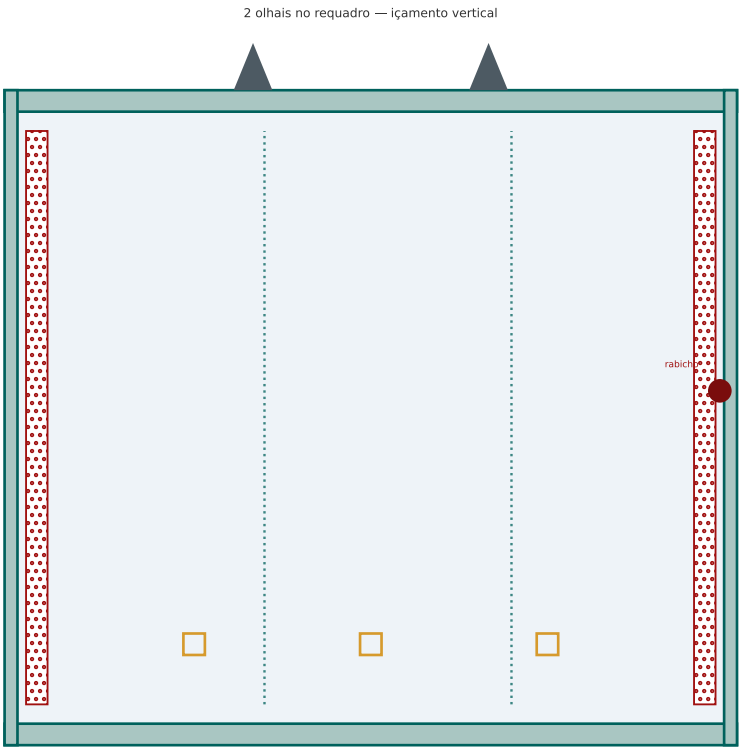

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. tomadas · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 3 placas (borda —20 mm) + gesso 3 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** juntas internas fita+massa
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 16 · ordem A-1


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 37 · PF-2 ≈ 32 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU F1 — 9,30×2,85 m · 1.45 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-2 · posição no rack 15 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 4 (balancim) olhais

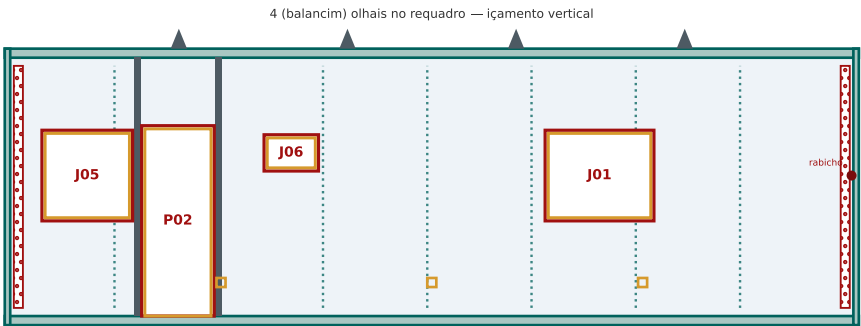

9 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×9.30 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · ombreira dupla P02 (2× metalon 70×70) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2** 9 painéis PIR · 2 circ. + 4 pontos · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 9 placas (borda —20 mm) + gesso 9 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: P02 + J01 + J05 + J06 em requadro alumínio (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos de vão
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 15 · ordem A-2


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 126 · PF-2 ≈ 160 · PF-3 = 14

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU F3-A — 3,29×2,85 m · 0.60 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-3 · posição no rack 14 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais

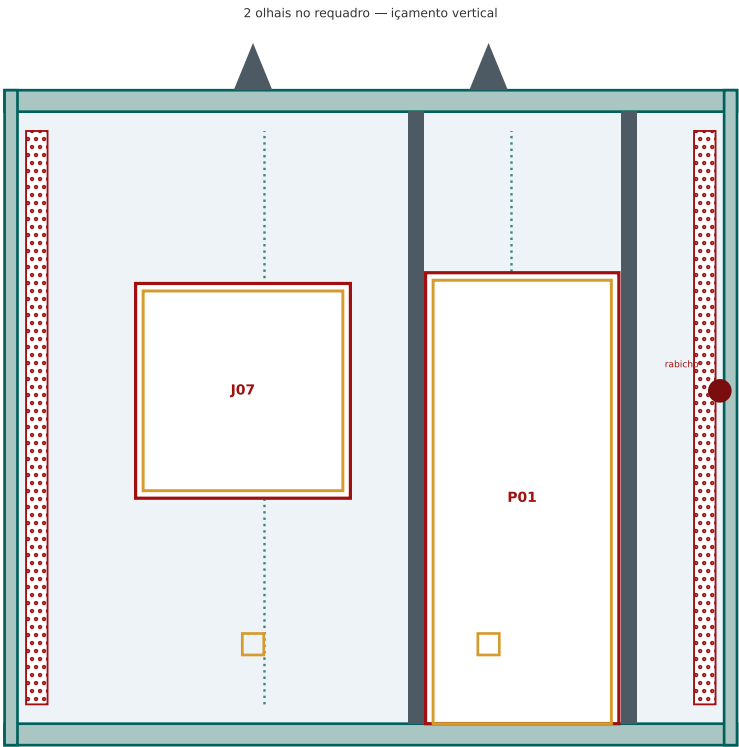

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · ombreira dupla P01 (2× metalon 70×70) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 3 placas (borda –20 mm) + gesso 3 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: P01 + J07 em requadro alumínio (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos de vão
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 14 · ordem A-3


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 37 · PF-2 ≈ 96 · PF-3 = 14

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU F5-A — 2,10×2,85 m · 0.44 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-4 · posição no rack 13 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais

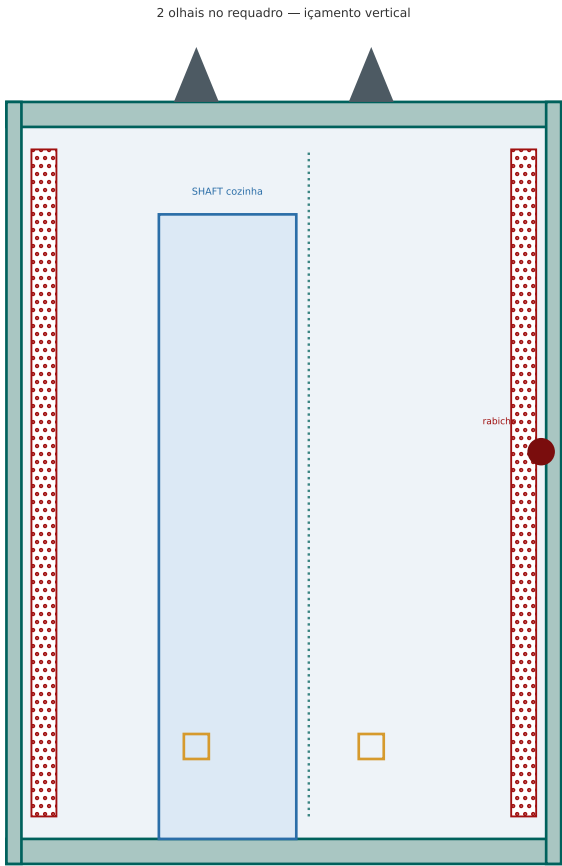

2 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×2.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 2 painéis PIR · hidráulica: shaft cozinha · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 2 placas (borda –20 mm) + gesso 2 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** juntas internas fita+massa
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 13 · ordem A-4


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 22 · PF-2 ≈ 32 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU JUNTA-A — 7,10×2,85 m · 1.02 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-5 · posição no rack 12 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 3 olhais

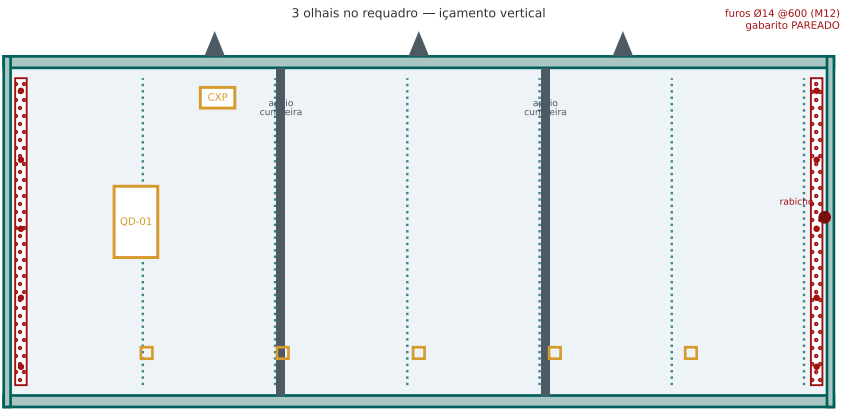

7 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×7.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · 2 montantes de borda de junta (apoio cumeeira) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un · furação Ø14 no gabarito PAREADO
- W2** 7 painéis PIR · QD-01 + CXP + furação M12 · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 7 placas (borda —20 mm) + gesso 7 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** juntas internas fita+massa
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 12 · ordem A-5


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 95 · PF-2 ≈ 32 · PF-3 = 14 · M12: 12 (kit da casa)

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU IA1 — 3,06×2,85 m · 0.58 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-6 · posição no rack 11 (carga inversa) · bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais

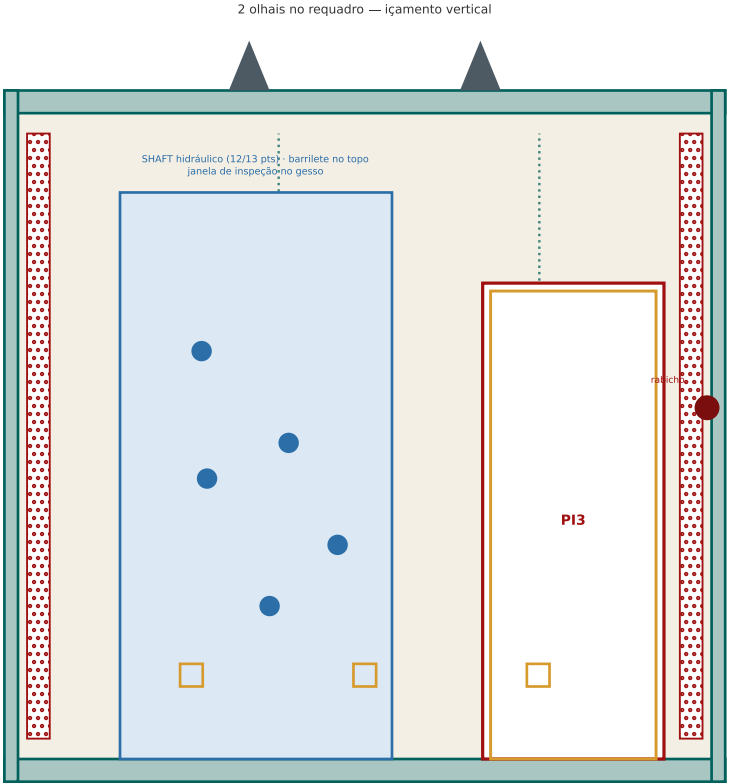

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.06 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · hidráulica banho (12/13 pts) · TESTE hidr. 1,5×/60 min
- W3** interna: gesso 2 faces — gesso 6 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: PI3 em requadro alumínio · juntas internas
- W5** mascarar bandas · 1 demão látex nas 2 faces
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 11 · ordem A-6


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 36 · PF-2 ≈ 64 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU IA2 — 3,06×2,85 m · 0.56 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-7 · posição no rack 10 (carga inversa) · bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais

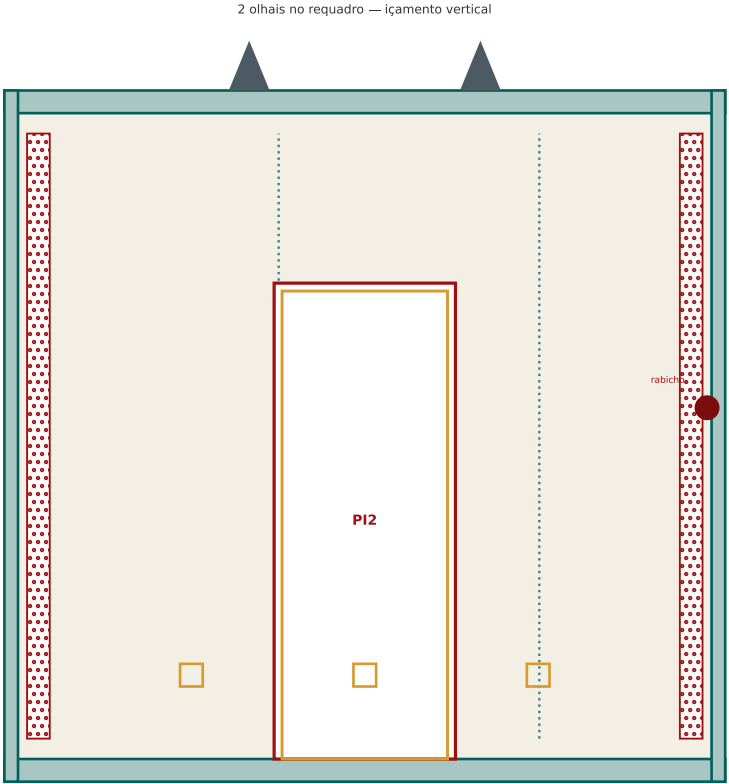

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.06 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** interna: gesso 2 faces — gesso 6 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: PI2 em requadro alumínio · juntas internas
- W5** mascarar bandas · 1 demão látex nas 2 faces
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 10 · ordem A-7


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 36 · PF-2 ≈ 64 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU IAN — 1,40×2,85 m · 0.30 t · módulo SOCIAL

ordem de montagem A-8 (compensação) · posição no rack 9 (carga inversa) · bordas: JP-03 / JP-01 · içamento: 1 olhais

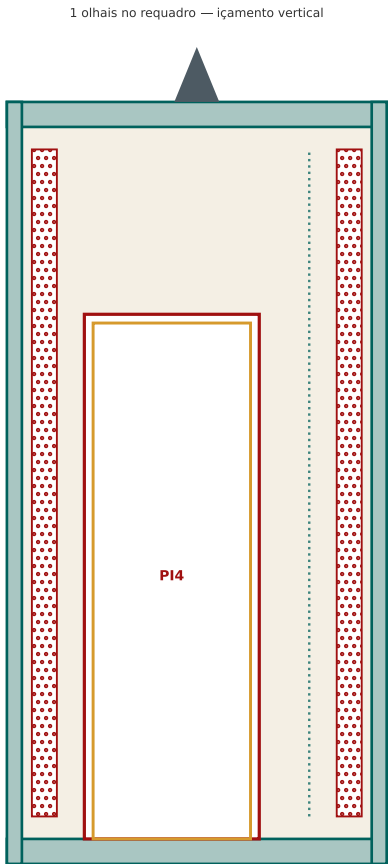

2 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×1.40 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 2 painéis PIR · —
- W3** interna: gesso 2 faces — gesso 4 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: PI4 em requadro alumínio (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos de vão
- W5** mascarar bandas · 1 demão látex nas 2 faces
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 9 · ordem A-8 (compensação)


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 17 · PF-2 ≈ 64 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU F4-B — 3,29×2,85 m · 0.62 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-1 · posição no rack 8 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais

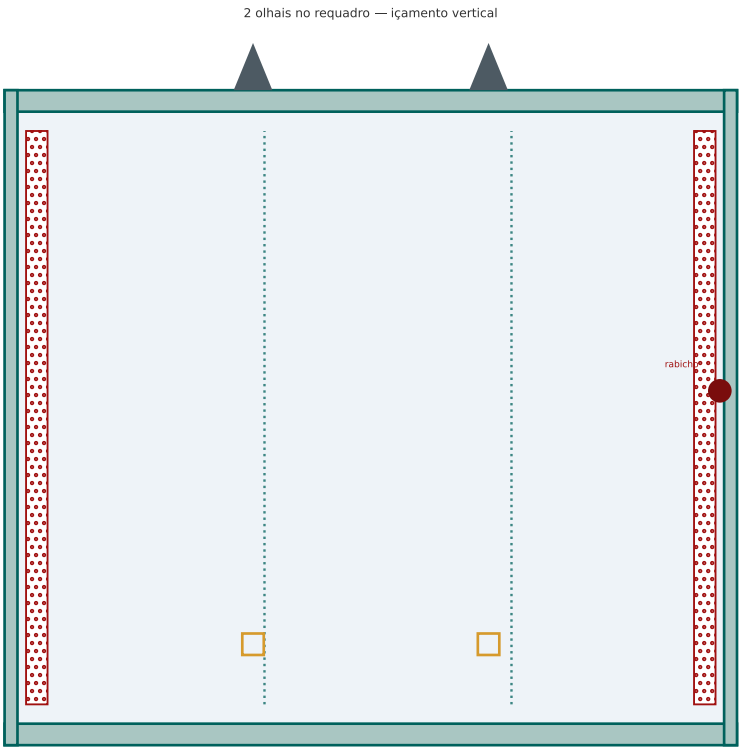

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 3 placas (borda —20 mm) + gesso 3 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** sem esquadria (correção R13: J04 pertence à F5-B, cf. aba 08) · juntas internas fita+massa
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 8 · ordem B-1


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 37 · PF-2 ≈ 32 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU F2 — 9,30×2,85 m · 1.42 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-2 · posição no rack 7 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 4 (balancim) olhais

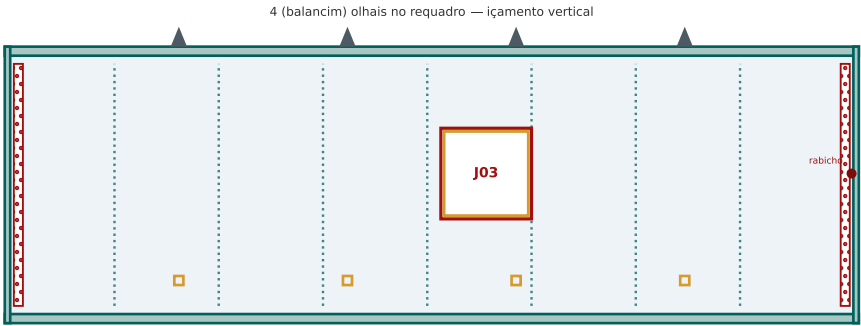

9 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×9.30 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 9 painéis PIR · 2 circ. + tomadas · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 9 placas (borda —20 mm) + gesso 9 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: J03 em requadro alumínio (demais cegas) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos de vão
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 7 · ordem B-2


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 126 · PF-2 ≈ 64 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU F3-B — 3,29×2,85 m · 0.60 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-3 · posição no rack 6 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais

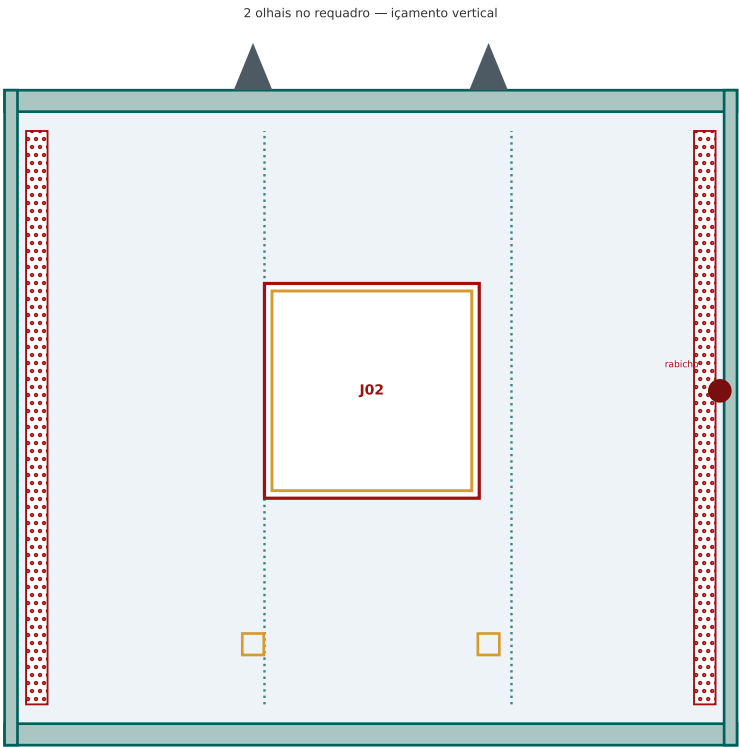

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 3 placas (borda —20 mm) + gesso 3 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: J02 em requadro alumínio · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos de vão
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 6 · ordem B-3


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 37 · PF-2 ≈ 64 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU F5-B — 2,10×2,85 m · 0.42 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-4 · posição no rack 5 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais

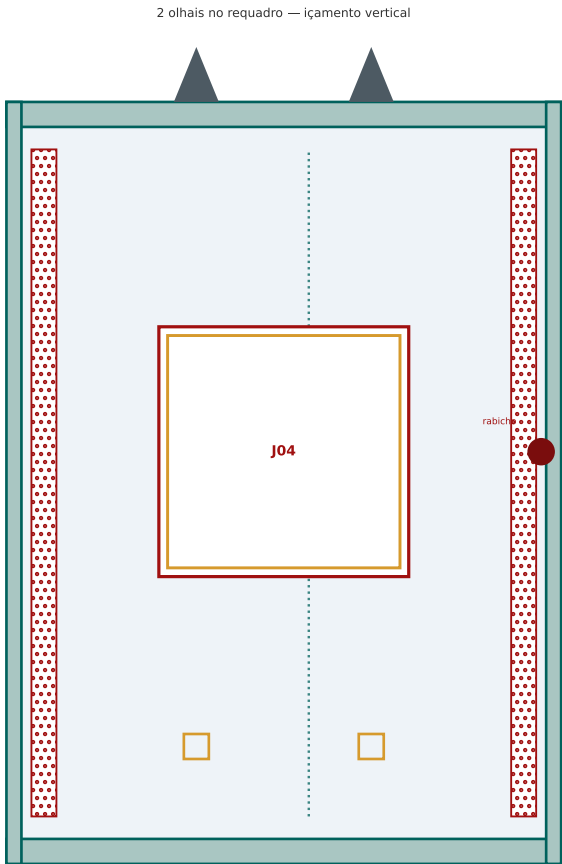

2 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×2.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 2 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 2 placas (borda –20 mm) + gesso 2 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** esquadrias: J04 em requadro alumínio (correção R13: croqui R12 omitia o vão) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos de vão
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 5 · ordem B-4

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 22 · PF-2 ≈ 64 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU JUNTA-B — 7,10×2,85 m · 1.00 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-5 · posição no rack 4 (carga inversa) · bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 3 olhais

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1

guias 2×7.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · 2 montantes de borda de junta (apoio cumeeira) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un · furação Ø14 no gabarito PAREADO
- W2


7 painéis PIR · CXP-JUNTA plug-in + M12 · teste 500 V no chicote
- W3

cimentícia 7 placas (borda –20 mm) + gesso 7 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4

esquadrias: PI1 em requadro alumínio · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos de vão
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 4 · ordem B-5

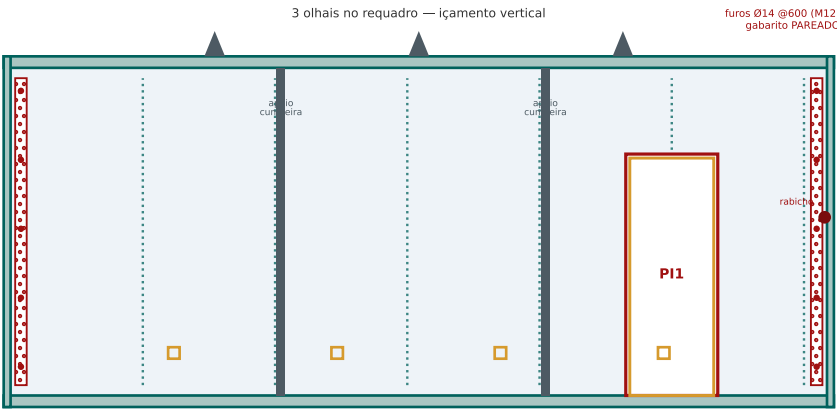

7 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 95 · PF-2 ≈ 64 · PF-3 = 14 · M12: 12 (kit da casa)

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU I1 — 3,00×2,85 m · 0.55 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-6 · posição no rack 3 (carga inversa) · bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais

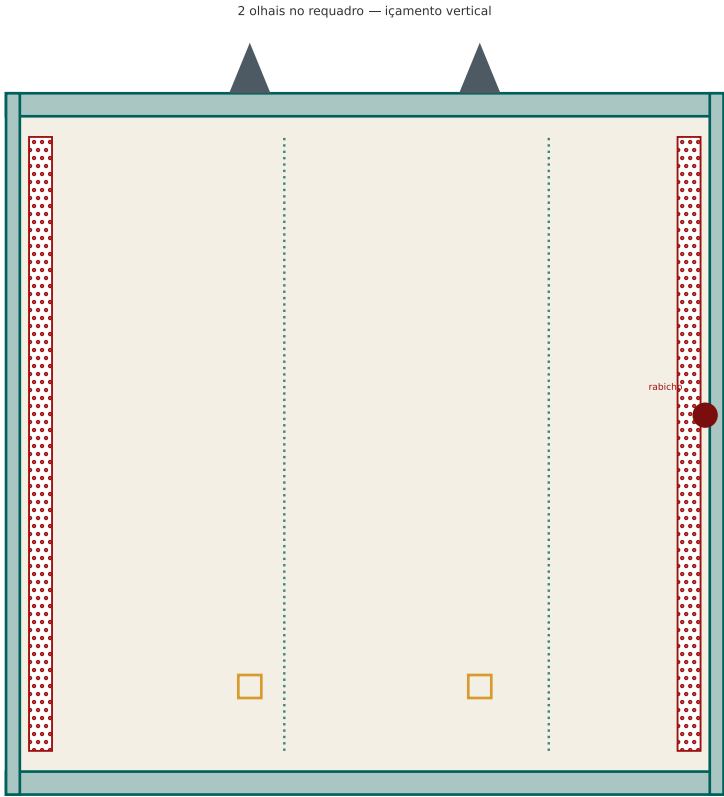

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** interna: gesso 2 faces — gesso 6 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** sem esquadria (correção R13: PI3 pertence à IA1, cf. aba 08) · juntas internas fita+massa
- W5** mascarar bandas · 1 demão látex nas 2 faces
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 3 · ordem B-6


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 36 · PF-2 ≈ 32 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU I2 — 3,00×2,85 m · 0.55 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-7 · posição no rack 2 (carga inversa) · bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais

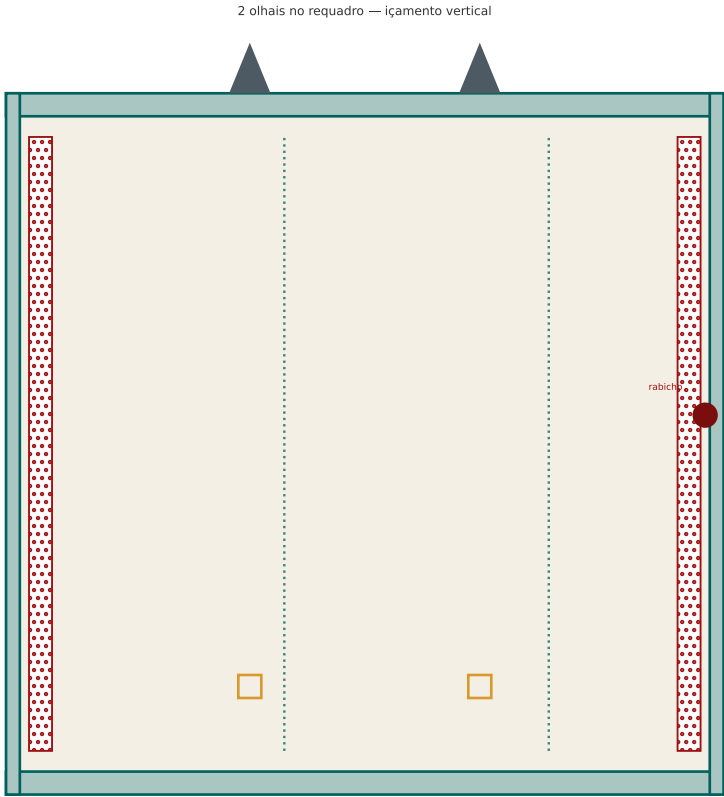

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3** interna: gesso 2 faces — gesso 6 chapas (banda –100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** sem esquadria (correção R13: PI2 pertence à IA2, cf. aba 08) · juntas internas fita+massa
- W5** mascarar bandas · 1 demão látex nas 2 faces
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 2 · ordem B-7

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 36 · PF-2 ≈ 32 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c

SKU I3 — 3,00×2,85 m · 0.55 t · módulo QUARTOS

ordem de montagem B-8 (compensação) · posição no rack 1 (carga inversa) · bordas: JP-03 / JP-01 · içamento: 2 olhais

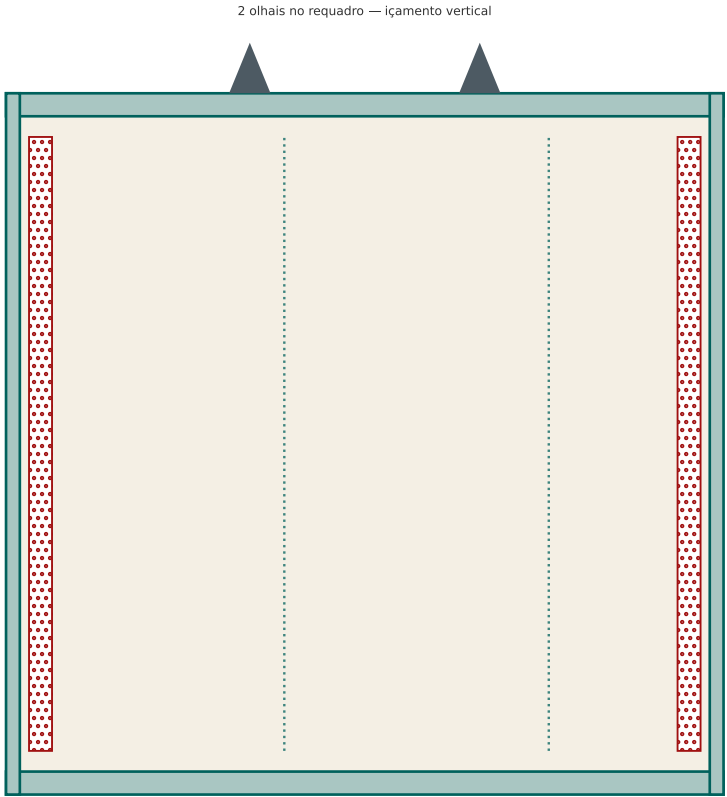

3 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes) · pontilhado = juntas de painel · hachura vermelha = bandas secas 100 mm
LARANJA = requadro alumínio de vão · R13: quadro só de requadro — sem montantes intermediários/vergas

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU)

- W1** guias 2×3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 3 painéis PIR · —
- W3** interna: gesso 2 faces — gesso 6 chapas (banda —100 mm) · desencontros conforme Manual W
- W4** juntas internas fita+massa
- W5** mascarar bandas · 1 demão látex nas 2 faces
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 1 · ordem B-8 (compensação)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 ≈ 36 · PF-2 ≈ 32 · PF-3 = 8

contador fecha o kit no QR · PF-2 RECONTADO R13.2 (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar conforme gabarito — inspeção PIT-W2c
