


ROMANEIO DE CARGA — ROTA B · 1 CASA / CARRETA COMUM

sem AET · largura máx. ocupada 2,45 m · altura total $\leq$ 4,40 m · peso do kit $\approx$ 13,5 t · sequência de carga INVERSA à montagem (do R12)

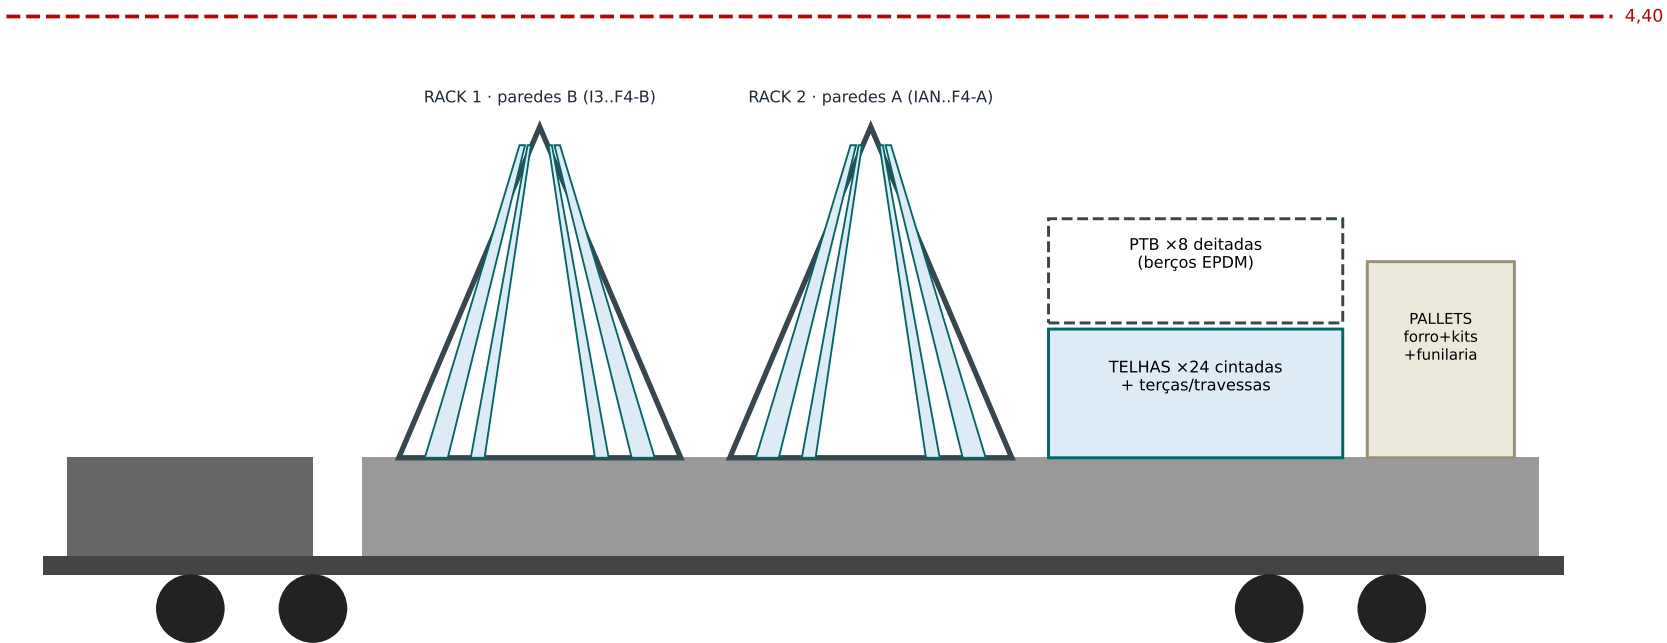

Distribuição de eixos

racks (9 t) sobre o conjunto de eixos traseiro · telhas/PTB ao centro · pallets na traseira — conferir balança se disponível

Amarração

cintas catraca 5 t em pontos MARCADOS dos racks · NUNCA cinta sobre vão de janela · telhas: 2 cintas + cantoneiras · rechecar após 50 km

Proteção

paredes já saem protegidas da W6 (filme+cantoneiras+vidro c/ chapa) · lona apenas sobre pallets de gesso (chuva)

SEQUÊNCIA DE CARGA (gerada do Romaneio R12 — carga inversa à montagem)

posição 1 entra primeiro (fundo do rack) · na obra, a boca do rack entrega exatamente a próxima parede do storyboard

Pos. carga	SKU	Dim (m)	Peso	Rack	Vira montagem nº
1	I3	3,00×2,85	0,55 t	RACK 1	B-8 (compensação)
2	I2	3,00×2,85	0,55 t	RACK 1	B-7
3	I1	3,00×2,85	0,55 t	RACK 1	B-6
4	JUNTA-B	7,10×2,85	1,00 t	RACK 1	B-5
5	F5-B	2,10×2,85	0,42 t	RACK 1	B-4
6	F3-B	3,29×2,85	0,60 t	RACK 1	B-3
7	F2	9,30×2,85	1,42 t	RACK 1	B-2
8	F4-B	3,29×2,85	0,62 t	RACK 1	B-1
9	IAN	1,40×2,85	0,30 t	RACK 2	A-8 (compensação)
10	IA2	3,06×2,85	0,56 t	RACK 2	A-7
11	IA1	3,06×2,85	0,58 t	RACK 2	A-6
12	JUNTA-A	7,10×2,85	1,02 t	RACK 2	A-5
13	F5-A	2,10×2,85	0,44 t	RACK 2	A-4
14	F3-A	3,29×2,85	0,60 t	RACK 2	A-3
15	F1	9,30×2,85	1,45 t	RACK 2	A-2
16	F4-A	3,29×2,85	0,62 t	RACK 2	A-1

Conferência dupla: o QR de cada parede é bipado na CARGA (fecha o romaneio) e na DESCARGA (abre o plano de início do passo).
Divergência de sequência = parada: parede fora de ordem no rack obriga descarregar para reordenar no site.

KIT DA CASA — ITENS SOLTOS (pallets)

tudo que não é parede/telha viaja kitado por QR

Kit	Conteúdo	Local
KIT-COB	8 terças + travessas de forro + consolos + capuz de cumeeira + PL-D x4 + rufos/luvas	pallet 1
KIT-FORRO	F530 + placas de gesso do forro + tabica + GN25	pallet 2 (lonar)
KIT-JUNTAS	tiras de gesso das bandas secas + fita + massa elástica + PU + fundo de junta 25 mm	pallet 3
KIT-FIX	24xM12 8.8 + M8 do anel/JP + parabolts GM (se radier local) + EPDM	caixa QR
KIT-ESQUADRIA	folhas de porta internas (marcos já nas paredes) + ferragens	pallet 3
KIT-MEP	chicotes de teto + conectores reserva + luminárias/plafons + QD tampa	caixa QR
KIT-ACAB	tinta p/ retoque (mesmo lote da W5!) + rodapés + soleiras	pallet 3
FERRAMENTAL	parafusadeiras caladas (amarela/azul) + torquímetro vermelho + laser + jig de chuva portátil	retorna c/ a equipe

Regra do lote de tinta: o retoque das juntas usa O MESMO LOTE da demão de fábrica (registrado no passaporte QR da parede) — lote diferente = mancha de tom visível a luz rasante.

CHECKLISTS — EXPEDIÇÃO (fábrica) × RECEBIMENTO (site)

a foto no QR transfere a responsabilidade — dano descoberto sem bipe de recebimento é da obra

EXPEDIÇÃO (W6 → carreta)

- ☐ 16 QRs bipados na ordem de carga (sistema trava fora de ordem)
- ☐ Cintas nos pontos marcados + checagem do torque das catracas
- ☐ Fotos das 4 vistas da carga no QR do romaneio
- ☐ Altura conferida c/ vara telescópica $\leq 4,40 \cdot$ largura $\leq 2,45$
- ☐ Kits 1-3 + caixas QR conferidos contra este romaneio
- ☐ Documentos: NF + romaneio impresso + contato do líder de campo

RECEBIMENTO (site)

- ☐ Bipar os 16 QRs ANTES de descarregar (confere ordem e integridade)
- ☐ Inspeção visual c/ foto: qualquer dano registrado no ato
- ☐ Racks posicionados em solo nivelado e calçado
- ☐ Área de içamento isolada · munck posicionado
- ☐ Kits conferidos → almoxarifado de obra
- ☐ Assinatura digital do líder de campo = transferência de responsabilidade

PILOTO: nesta viagem, instalar o datalogger no RACK 1 (suporte próprio), ligar ANTES de sair do pátio e registrar km/eventos na aba 05_Transporte da planilha de coleta. A inspeção de pintura c/ luz rasante acontece no recebimento (antes/depois já fotografados).

REGISTRO E MELHORIA

Este romaneio é GERADO da coluna 'posição rack' do Romaneio R12 — alterar a ordem de montagem na planilha reordena a carga aqui.

Fila por dados: peso real por eixo (1ª pesagem) ajusta o mapa de carga · tempos de carga/descarga do piloto entram como alvo ·

divergências de bipe alimentam o ERP · versão por-obra sai com endereço/rota/contatos preenchidos pela ordem de produção.
