

ORDEM DE SERVIÇO — LOTE PILOTO DE DOBRA INTERNA (GM-01 + ANEL-JP04)

Célula de dobra Galpão B (guilhotina TH-6X3100 + dobradeira FOBESA 6 mm) · prazo: semana S6 da implantação · decide a REV.13 do orçamento

Peça	Qtd	Matéria-prima	Sequência de processo	Controle dimensional
GM-01 · guia de montagem	20 pç	chapa galv. Z275 #14 (1,95 mm)	tira 180×2.440 → 2 dobras 90° (perfil U 40×100×40)	furação Ø9 em gabarito JP (4 furos) · tol. ±1,0 mm
ANEL-JP04 · reforço	20 pç	chapa galv. Z275 #12 (2,66 mm)	tira 120×480 → 4 dobras (anel aberto) → fech. solda ponto MIG	gabarito de fechamento · tol. Ø ±1,5 mm
Amostra PTB (bônus)	6 m	chapa galv. #20 (0,90 mm)	perfil Z 35×80×35 na dobradeira	encaixe no mock-up de platibanda
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO (PIT-DOBRA-01)				

- 1 · Dimensional: 100% das peças no gabarito passa/não-passa (dry-fit contra montante e junção JP reais do estoque R5)
- 2 · Dobra: raio interno ≥ 1,5×espessura · zero trinca no vinco (inspeção visual + líquido penetrante em 3 amostras)
- 3 · Galvanização: retoque de zinco frio nos vincos/cortes · ensaio de aderência em 2 amostras
- 4 · Tempo: cronometrar ciclo por peça (bipe início/fim no ERP) — alimenta o custo interno real da REV.13
- 5 · Montagem: 4 GM + 4 anéis instalados em 1 parede do piloto (C4) sem retrabalho = APROVADO


DECISÃO

APROVADO → emitir REV.13 do orçamento (ganho R\$ 330–390 mil/300 casas) e transferir GM-01/JP-04/PTB p/ produção interna.
REPROVADO → manter fornecimento terceirizado e registrar causa (máquina, ferramental ou espessura) p/ nova tentativa.

Responsáveis: célula de dobra (execução) · QA (PIT-DOBRA-01) · engenharia (gabaritos, desenhos R5 anexos: DET-GM01, DET-JP04, DET-PTB)

CROQUIS DE DOBRA (cotas de desenvolvimento — conferir com DET R5 antes de cortar)

GM-01 — perfil U 40×100×40 (desenv. 180 mm)

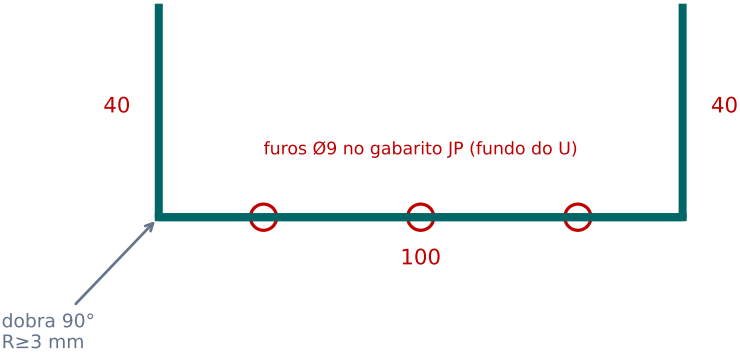

ANEL-JP04 — anel aberto 4 dobras (desenv. 480 mm)

