

Conteúdo

1. Planta-chave com códigos de parede e ordem de montagem
2. Fichas de parede (16) COM EIXO DE COORDENADAS: croqui + composição + posições globais
3. Fichas de cobertura (cassetes R2, cumeeira na junta) e forro autoportante — 4 fichas
4. Croqui de corte — nesting 12 m (kerf 5 mm) · 5. Processo linha W1-W6
6. ANEXO DE COORDENADAS: todas as peças de aço (126), pontos elétricos (42) e hidráulicos (13) — X·Y·Z
7. Registro de correções R13 → R14 e decisões R2

Fontes: Modelo BIM IFC R14 · Romaneio R14 (abas 01·02·03·04·05·06·08) · Nesting R14 · Orçamento REV.14

Uso: fabricação/planejamento do LOTE PILOTO. Produção em SÉRIE exige ART (condicionante C1 — Termo de Emissão R14).

REGRA DO PIPELINE: documento DERIVADO e REGENERÁVEL do Romaneio/IFC — nunca editar à mão.

O QUE MUDA NA BASE R13/R14 (aplicado em todo este caderno)


QUADRO SÓ DE REQUADRO: guias U100 contornando os painéis PIR 70 mm — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas (Termilor TC 70: vão adm. 4,40 m > pé 2,85 m).

Exceções: 10 montantes de canto · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01 (F3-A) / P02 (F1). Vãos: recorte no painel + REQUADRO ALUMÍNIO (56 pç · 67 m/casa).

PF-3: 206 → 152 un/casa · PF-2 recontado (32+32/vão) · CHP-T/CHP-C #4,75 c/ porca-rebite M8 nas junções JP-02/JP-03 (140 chapas/casa · PIT-W2c).

Correções de cadastro: J04 pertence à F5-B (não F4-B) · portas PI3/PI2 pertencem à IA1/IA2 (não I1/I2) · fichas antigas citavam 58 montantes + vergas inexistentes.


AVISO (C1): emissão p/ LOTE PILOTO — produção em série exige ART (painel portante DATec SINAT nº 10 + junções JP/içamento).

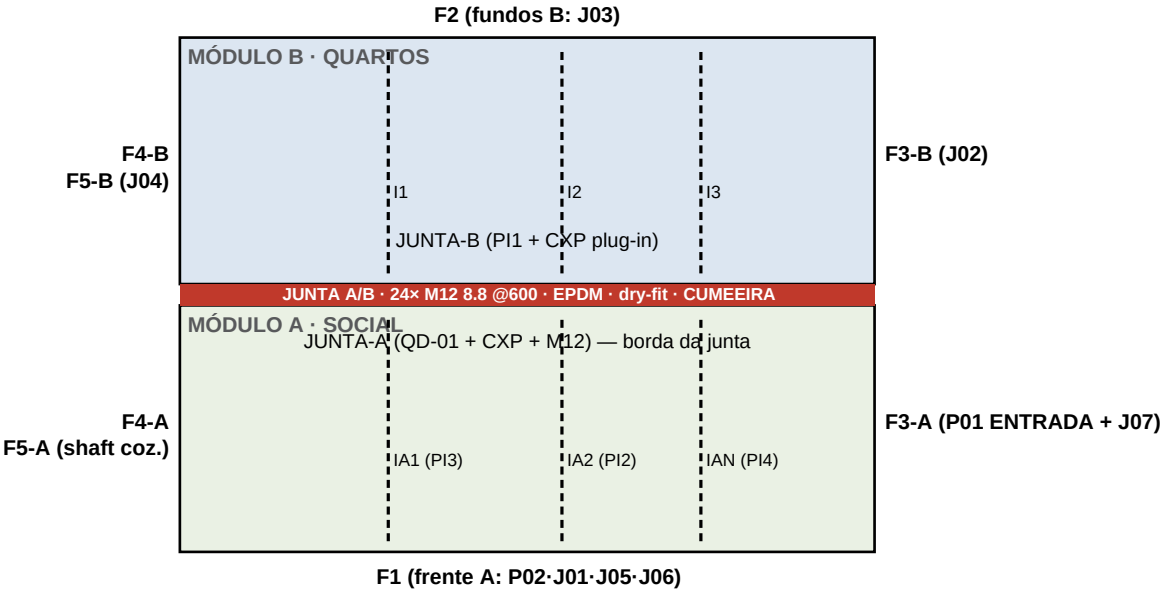

ORDEM DE MONTAGEM · RACK (carga inversa)

SOCIAL A-1 F4-A · A-2 F1 · A-3 F3-A · A-4 F5-A · A-5 JUNTA-A ·
A-6 IA1 · A-7 IA2 · A-8 IAN (compensação)
QUARTOS B-1 F4-B · B-2 F2 · B-3 F3-B · B-4 F5-B · B-5 JUNTA-B ·
B-6 I1 · B-7 I2 · B-8 I3 (compensação)
rack: posição 16 (F4-A, 1ª a sair) → 1 (I3) · carga INVERSA à montagem

TOTAIS: 16 paredes · 11,3 t/casa · 18 montantes de extremidade
(10 canto + 4 borda de junta + 4 ombreiras) · guias U100 2×65,1 m
bordas/junções: JP-01..04 parafusadas M8 (CHP-T/CHP-C onde há espera)
GM-01 guia-mestre U110×40×3,0 · guia-anel JP-04 U120×45×2,25

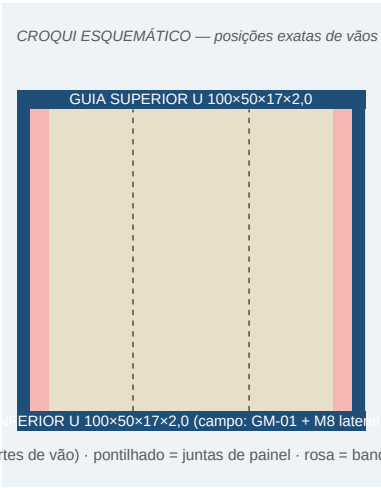

esting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2x3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. tomadas · teste 500 V no chicote
- W3

cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 16 · ordem A-1

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m
Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15x2,85 · 9.8 m² · IDs F4-A-P01..P03
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2x32
Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²
MEP embutida: 1 circ. tomadas (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.62 t · ordem A-1 · rack 16 (carga inversa)


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 37 · PF-2 32 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A007	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	2.143	· Y	0.000	Guia inferior
GUI-A008	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	2.143	· Y	0.000	Guia superior

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

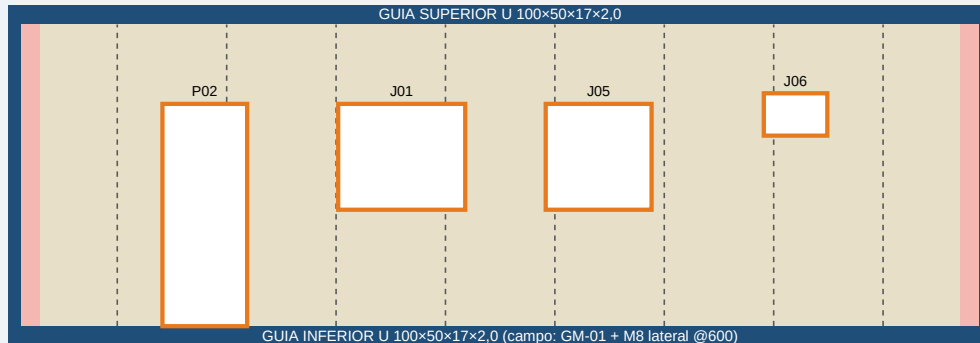

9.30 m — 9 painéis PIR 1,15×2,85 (nesting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2×9.30 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2** 9 painéis PIR · 2 circ. + 4 pontos · teste 500 V no chicote
- W3** cimentícia 9 placas (borda 20 mm) + gesso 9 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** esquadrias: P02 + J01 + J05 + J06 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 15 · ordem A-2

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 9.30 m = 18.6 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão + 2 OMBREIRAS P02 (MNT-A017/A018 · X 3,505/4,395)
Painéis PIR 70 mm: 9 pç 1,15×2,85 · 29.5 m² · IDs F1-P01..P09
Esquadria P02 0.80×2.10 m · porta
Esquadria J01 1.20×1.00 m · janela · peitoril 1.10
Esquadria J05 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10
Esquadria J06 0.60×0.40 m · janela · peitoril 1.80
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~26.5 m² + parafusos Ø4,2×32
Gesso acartonado ST (face int.): ~26.5 m²
MEP embutida: 2 circ. + 4 pontos (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 4 (balancim) olhais no requadro
Peso: 1.45 t · ordem A-2 · rack 15 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 126 · PF-2 160 · PF-3 14
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A001	U 100x50x17x2,0	9.30 m	X	2.100	· Y	0.043	Guia inferior
GUI-A002	U 100x50x17x2,0	9.30 m	X	2.100	· Y	0.043	Guia superior
MNT-A017	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	3.505	· Y	0.120	Ombreira de vao (dupla)
MNT-A018	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	4.395	· Y	0.120	Ombreira de vao (dupla)
REQ-001	Requadro aluminio	1.00 m	X	2.450	· Y	0.000	Requadro de vao aluminio branco
REQ-002	Requadro aluminio	1.00 m	X	2.450	· Y	0.000	Requadro de vao aluminio branco

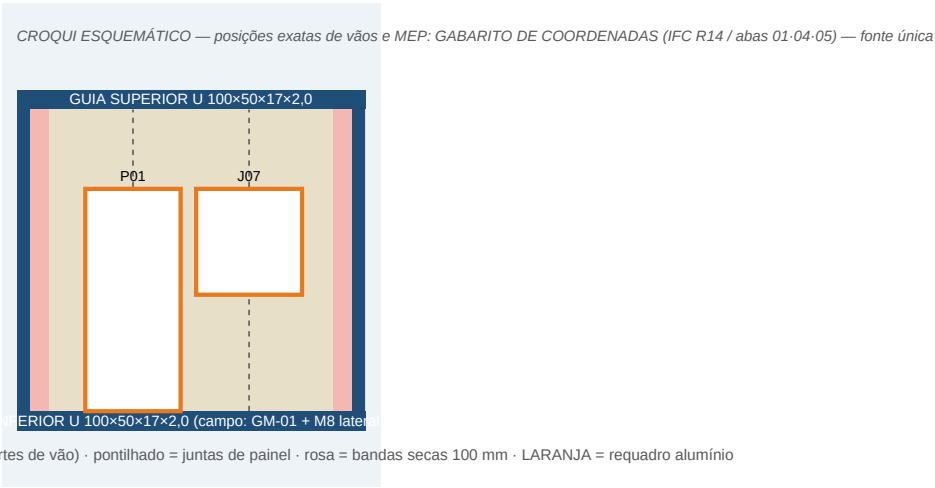

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3

cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: P01 + J07 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 14 · ordem A-3

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão + 2 OMBREIRAS P01 (MNT-A015/A016 · Y 1,855/2,845)

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs F3-A-P01..P03

Esquadria P01 0.90×2.10 m · porta

Esquadria J07 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10

Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)

Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2×32

Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²

MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.6 t · ordem A-3 · rack 14 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 37 · PF-2 96 · PF-3 14

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A005	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	11.357	· Y	0.000	Guia inferior
GUI-A006	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	11.357	· Y	0.000	Guia superior
MNT-A015	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	11.280	· Y	1.855	Ombreira de vao (dupla)
MNT-A016	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	11.280	· Y	2.845	Ombreira de vao (dupla)
REQ-021	Requadro aluminio	1.00 m	X	11.400	· Y	0.550	Requadro de vao aluminio branco
REQ-022	Requadro aluminio	1.00 m	X	11.400	· Y	0.550	Requadro de vao aluminio branco



CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2×2.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2** 2 painéis PIR · hidráulica: shaft cozinha · TESTE hydr. 1,5× / 60 min
- W3** cimentícia 2 placas (borda 20 mm) + gesso 2 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 13 · ordem A-4

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 2.10 m = 4.2 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 2 pç 1,15×2,85 · 6.6 m² · IDs F5-A-P01..P02

Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~6.0 m² + parafusos Ø4,2×32

Gesso acartonado ST (face int.): ~6.0 m²

MEP embutida: hidráulica: shaft cozinha (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.44 t · ordem A-4 · rack 13 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 22 · PF-2 32 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A013 U 100x50x17x2,0	2.10 m	X	9.300	· Y	3.247	Guia inferior
GUI-A014 U 100x50x17x2,0	2.10 m	X	9.300	· Y	3.247	Guia superior

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única



— 7 painéis PIR 1,15x2,85 (nesting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- | | |
|----|---|
| W1 | guias 2x7.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un |
| W2 | 7 painéis PIR · QD-01 + CXP + furação M12 · teste 500 V no chicote |
| W3 | gesso 14 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W |
| W4 | juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos |
| W5 | mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex |
| W6 | passaporte QR · proteções · rack posição 12 · ordem A-5 |

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 7.10 m = 14.2 m

Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 7 pç 1,15x2,85 · 22,9 m² · IDs JUNTA-A-P01...P07

Gesso acartonado ST (2 faces): ~40.5 m²

MEP embutida: QD-01 + CXP + furação M12 (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 3 olhais no requadro

Peso: 1.02 t · ordem A-5 · rack 12 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)


PF-1 95 · PF-2 32 · PF-3 14 · M12: 12 (kit da casa)

contador da parafusadeira fecha o kit no OR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A017	U 100x50x17x2,0	7.00 m	X	2.250	·	Y	3.245	Guia inferior
GUI-A018	U 100x50x17x2,0	7.00 m	X	2.250	·	Y	3.245	Guia superior
MNT-A011	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	4.600	·	Y	3.245	Montante de borda de junta
MNT-A013	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	6.900	·	Y	3.245	Montante de borda de junta
REQ-037	Requadro aluminio	0.80 m	X	6.900	·	Y	3.245	Requadro de vao aluminio branco
REQ-038	Requadro aluminio	0.80 m	X	6.900	·	Y	3.245	Requadro de vao aluminio branco

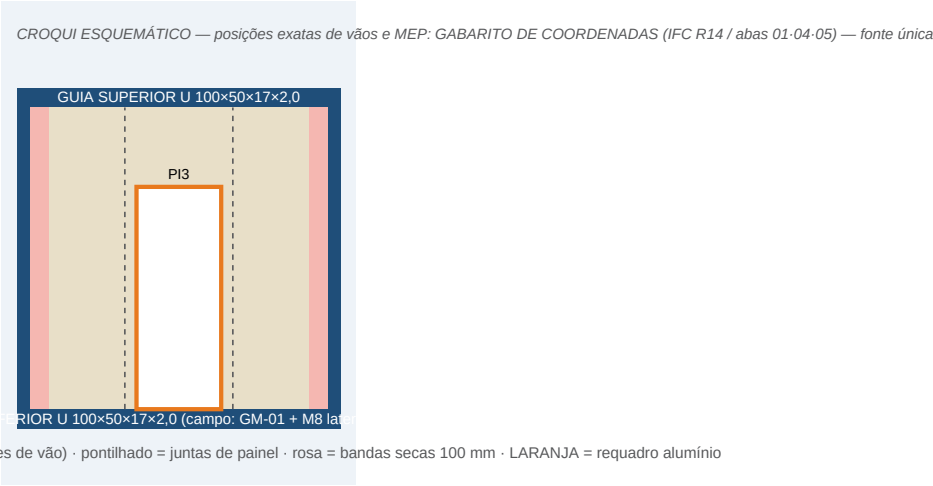

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.06 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · hidráulica banho (12/13 pts) · TESTE hydr. 1,5× / 60 min
- W3

gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: PI3 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 11 · ordem A-6

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.06 m = 6.1 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs IA1-P01..P03
Esquadria PI3 0.80×2.10 m · porta
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.4 m² · RU no banheiro
MEP embutida: hidráulica banho (12/13 pts) (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.58 t · ordem A-6 · rack 11 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 64 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A021 U 100x50x17x2,0	2.30 m	X	4.500	· Y	0.150	Guia inferior
GUI-A022 U 100x50x17x2,0	2.30 m	X	4.500	· Y	0.150	Guia superior

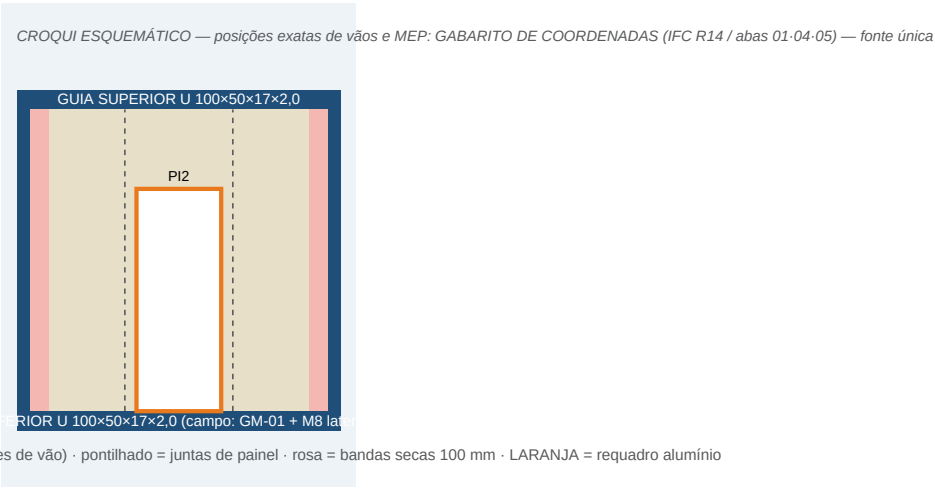

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2x3.06 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3

gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: PI2 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 10 · ordem A-7

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 3.06 m = 6.1 m
Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15x2,85 · 9.8 m² · IDs IA2-P01..P03
Esquadria PI2 0.80x2.10 m · porta
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.4 m²
MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.56 t · ordem A-7 · rack 10 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 64 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A023 U 100x50x17x2,0	2.30 m	X	5.900	· Y	0.150	Guia inferior
GUI-A024 U 100x50x17x2,0	2.30 m	X	5.900	· Y	0.150	Guia superior

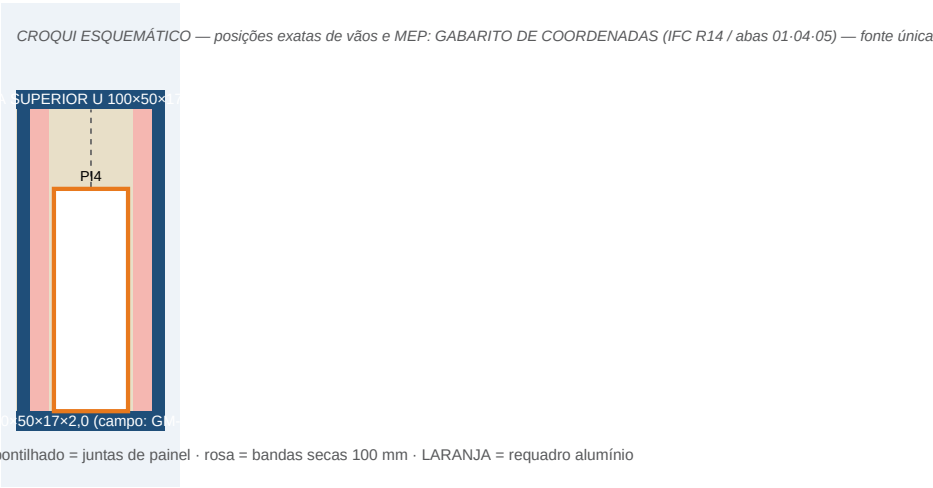

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×1.40 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

2 painéis PIR · sem MEP · teste 500 V no chicote
- W3

gesso 4 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: PI4 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 9 · ordem A-8 (compensação)

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 1.40 m = 2.8 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 2 pç 1,15×2,85 · 6.6 m² · IDs IAN-P01..P02
Esquadria PI4 0.70×2.10 m · porta
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Gesso acartonado ST (2 faces): ~8.0 m²
Bordas: JP-03 / JP-01 · içamento: 1 olhais no requadro
Peso: 0.3 t · ordem A-8 (compensação) · rack 9 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 17 · PF-2 64 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-A025	U 100x50x17x2,0	1.40 m	X	4.500	· Y	2.500	Guia inferior
GUI-A026	U 100x50x17x2,0	1.40 m	X	4.500	· Y	2.500	Guia superior
REQ-045	Requadro aluminio	0.70 m	X	4.900	· Y	2.500	Requadro de vao aluminio blanc
REQ-046	Requadro aluminio	0.70 m	X	4.900	· Y	2.500	Requadro de vao aluminio blanc
REQ-047	Requadro aluminio	2.10 m	X	4.900	· Y	2.500	Requadro de vao aluminio blanc
REQ-048	Requadro aluminio	2.10 m	X	5.600	· Y	2.500	Requadro de vao aluminio blanc

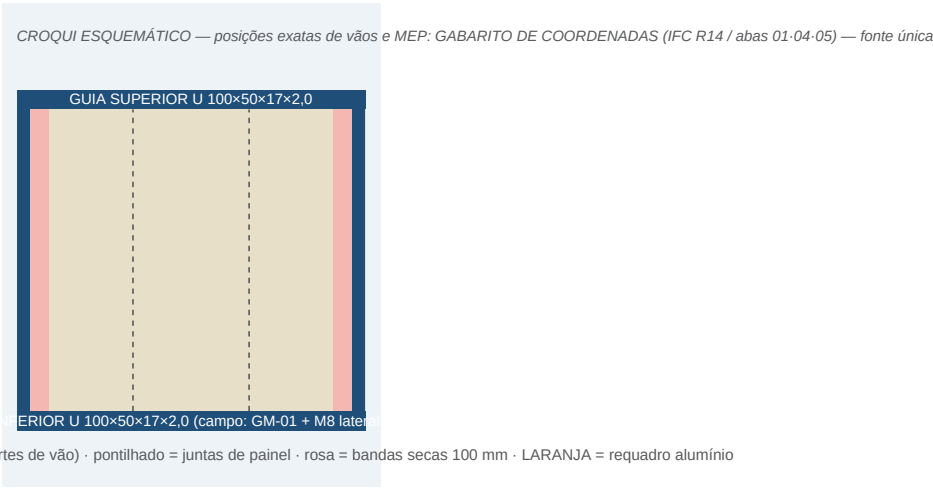

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3

cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 8 · ordem B-1

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs F4-B-P01..P03

Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2×32

Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²

MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.62 t · ordem B-1 · rack 8 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)


PF-1 37 · PF-2 32 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B011	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	0.043	· Y	3.310	Guia inferior
GUI-B012	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	0.043	· Y	3.310	Guia superior
REQ-033	Requadro alumínio	1.00 m	X	0.000	· Y	4.710	Requadro de vao aluminio branco
REQ-034	Requadro alumínio	1.00 m	X	0.000	· Y	4.710	Requadro de vao aluminio branco
REQ-035	Requadro alumínio	1.00 m	X	0.000	· Y	4.710	Requadro de vao aluminio branco
REQ-036	Requadro alumínio	1.00 m	X	0.000	· Y	5.710	Requadro de vao aluminio branco

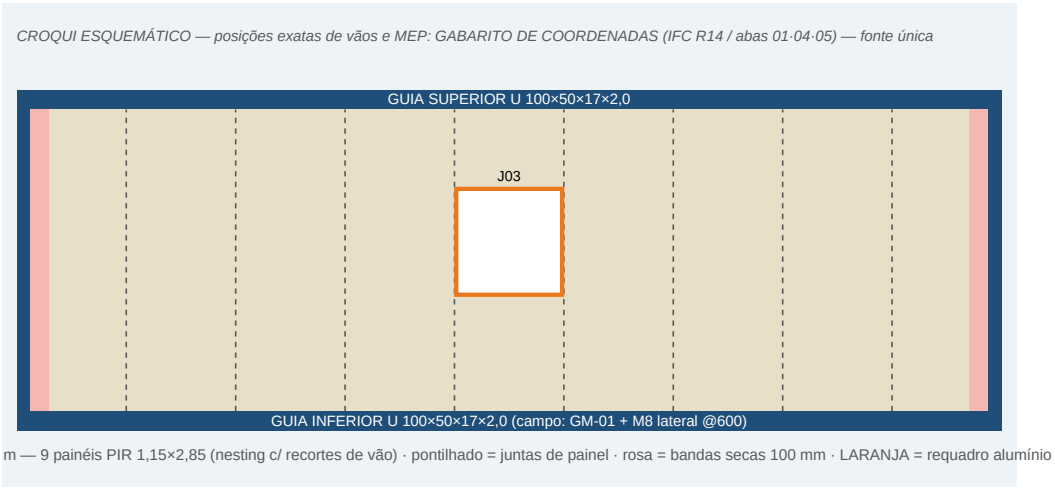

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×9.30 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

9 painéis PIR · 2 circ. + tomadas · teste 500 V no chicote
- W3

cimentícia 9 placas (borda 20 mm) + gesso 9 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: J03 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 7 · ordem B-2

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 9.30 m = 18.6 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 9 pç 1,15×2,85 · 29.5 m² · IDs F2-P01..P09
Esquadria J03 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~26.5 m² + parafusos Ø4,2×32
Gesso acartonado ST (face int.): ~26.5 m²
MEP embutida: 2 circ. + tomadas (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 4 (balancim) olhais no requadro
Peso: 1.42 t · ordem B-2 · rack 7 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 126 · PF-2 64 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B003 U 100x50x17x2,0	9.30 m	X	0.000	· Y	6.557	Guia inferior
GUI-B004 U 100x50x17x2,0	9.30 m	X	0.000	· Y	6.557	Guia superior
REQ-017 Requadro aluminio	1.00 m	X	4.750	· Y	6.600	Requadro de vao aluminio branco
REQ-018 Requadro aluminio	1.00 m	X	4.750	· Y	6.600	Requadro de vao aluminio branco
REQ-019 Requadro aluminio	1.00 m	X	4.750	· Y	6.600	Requadro de vao aluminio branco
REQ-020 Requadro aluminio	1.00 m	X	5.750	· Y	6.600	Requadro de vao aluminio branco

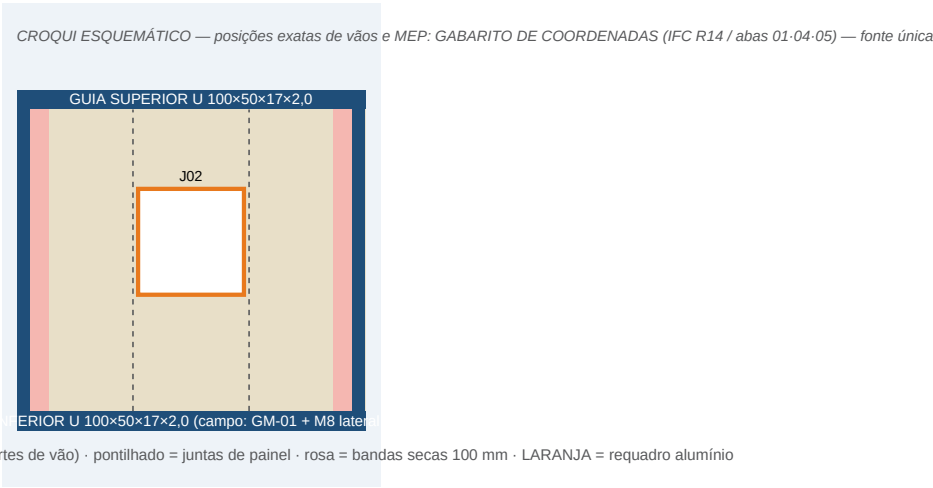

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.29 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3

cimentícia 3 placas (borda 20 mm) + gesso 3 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: J02 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 6 · ordem B-3

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.29 m = 6.6 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs F3-B-P01..P03

Esquadria J02 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10

Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)

Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~9.4 m² + parafusos Ø4,2×32

Gesso acartonado ST (face int.): ~9.4 m²

MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.6 t · ordem B-3 · rack 6 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 37 · PF-2 64 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B009	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	9.257	· Y	3.310	Guia inferior
GUI-B010	U 100x50x17x2,0	3.29 m	X	9.257	· Y	3.310	Guia superior
REQ-029	Requadro aluminio	1.00 m	X	9.300	· Y	4.710	Requadro de vao aluminio branco
REQ-030	Requadro aluminio	1.00 m	X	9.300	· Y	4.710	Requadro de vao aluminio branco
REQ-031	Requadro aluminio	1.00 m	X	9.300	· Y	4.710	Requadro de vao aluminio branco
REQ-032	Requadro aluminio	1.00 m	X	9.300	· Y	5.710	Requadro de vao aluminio branco



CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×2.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

2 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3

cimentícia 2 placas (borda 20 mm) + gesso 2 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

esquadrias: J04 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 5 · ordem B-4

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 2.10 m = 4.2 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 2 pç 1,15×2,85 · 6.6 m² · IDs F5-B-P01..P02
Esquadria J04 1.00×1.00 m · janela · peitoril 1.10
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Placa cimentícia 10 mm (face ext.): ~6.0 m² + parafusos Ø4,2×32
Gesso acartonado ST (face int.): ~6.0 m²
MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.42 t · ordem B-4 · rack 5 (carga inversa)


KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 22 · PF-2 64 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B015	U 100x50x17x2,0	2.10 m	X	0.000	· Y	3.353	Guia inferior
GUI-B016	U 100x50x17x2,0	2.10 m	X	0.000	· Y	3.353	Guia superior

CROQUI ESQUEMÁTICO — posições exatas de vãos e MEP: GABARITO DE COORDENADAS (IFC R14 / abas 01-04-05) — fonte única

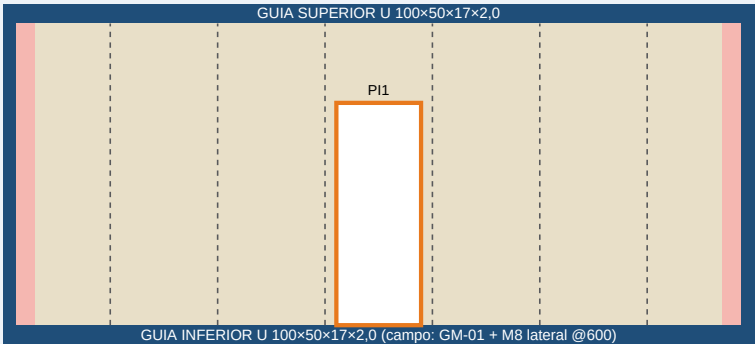

— 7 painéis PIR 1,15x2,85 (nesting c/ recortes de vão) · pontilhado = juntas de painel · rosa = bandas secas 100 mm · LARANJA = requadro alumínio

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1** guias 2x7.10 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 14 un
- W2** 7 painéis PIR · CXP-JUNTA plug-in + M12 · teste 500 V no chicote
- W3** gesso 14 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4** esquadrias: PI1 em requadro ALUMÍNIO (sem vergas — recorte no painel) · juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5** mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6** passaporte QR · proteções · rack posição 4 · ordem B-5

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 7.10 m = 14.2 m
Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 7 pç 1,15x2,85 · 22.9 m² · IDs JUNTA-B-P01..P07
Esquadria PI1 0.80x2.10 m · porta
Requadro de vão ALUMÍNIO: ~4 pç/vão (aba 01: 56 pç · 67 m/casa)
Gesso acartonado ST (2 faces): ~40.5 m²
MEP embutida: CXP-JUNTA plug-in + M12 (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-02 / JP-02 · içamento: 3 olhais no requadro
Peso: 1.0 t · ordem B-5 · rack 4 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 95 · PF-2 64 · PF-3 14 · M12: 12 (kit da casa)
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B019	U 100x50x17x2,0	7.00 m	X	2.250	· Y	3.355	Guia inferior
GUI-B020	U 100x50x17x2,0	7.00 m	X	2.250	· Y	3.355	Guia superior
MNT-B012	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	4.600	· Y	3.355	Montante de borda de junta
MNT-B014	Metalon 70x70x1,90	2.85 m	X	6.900	· Y	3.355	Montante de borda de junta
REQ-041	Requadro aluminio	0.80 m	X	6.900	· Y	3.355	Requadro de vao aluminio branco
REQ-042	Requadro aluminio	0.80 m	X	6.900	· Y	3.355	Requadro de vao aluminio branco

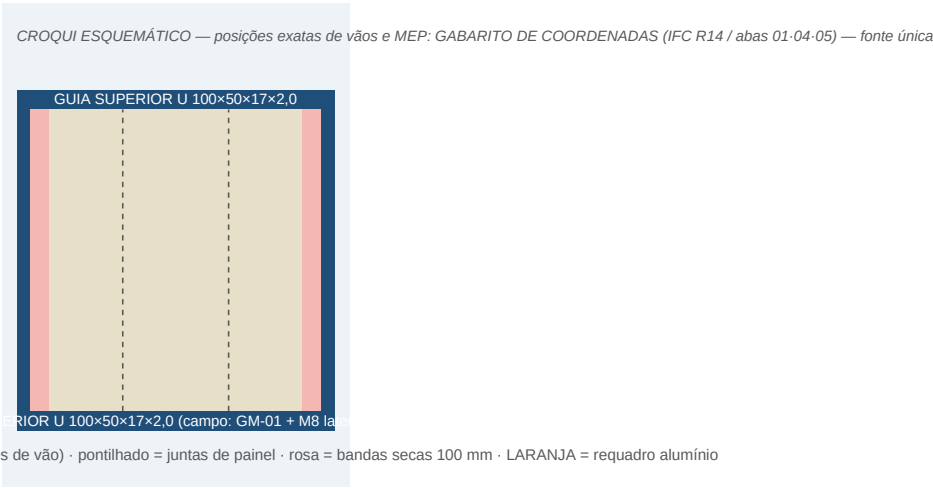

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3

gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 3 · ordem B-6

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)


Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.00 m = 6.0 m
Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão
Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs I1-P01..P03
Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.1 m²
MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)
Bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais no requadro
Peso: 0.55 t · ordem B-6 · rack 3 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 32 · PF-3 8
contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)
CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B027	U 100x50x17x2,0	3.05 m	X	2.800 · Y	3.400	Guia inferior
GUI-B028	U 100x50x17x2,0	3.05 m	X	2.800 · Y	3.400	Guia superior
REQ-049	Requadro alumínio	0.80 m	X	2.800 · Y	4.500	Requadro de vao aluminio branc
REQ-050	Requadro alumínio	0.80 m	X	2.800 · Y	4.500	Requadro de vao aluminio branc
REQ-051	Requadro alumínio	2.10 m	X	2.800 · Y	4.500	Requadro de vao aluminio branc
REQ-052	Requadro alumínio	2.10 m	X	2.800 · Y	5.300	Requadro de vao aluminio branc

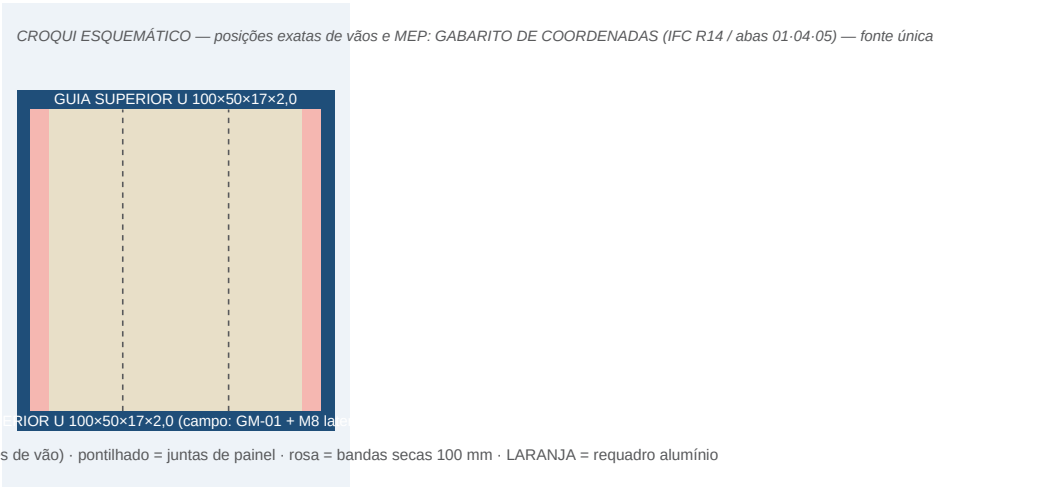

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2×3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · 1 circ. · teste 500 V no chicote
- W3

gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 2 · ordem B-7

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100×50×17×2,0: 2 pç × 3.00 m = 6.0 m

Montantes metalon 70×70×1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15×2,85 · 9.8 m² · IDs I2-P01..P03

Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.1 m²

MEP embutida: 1 circ. (coords: abas 04/05)

Bordas: JP-03 / JP-03 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.55 t · ordem B-7 · rack 2 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)


PF-1 36 · PF-2 32 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B029	U 100x50x17x2,0	3.05 m	X	3.900	· Y	3.400	Guia inferior
GUI-B030	U 100x50x17x2,0	3.05 m	X	3.900	· Y	3.400	Guia superior
REQ-053	Requadro alumínio	0.80 m	X	3.900	· Y	4.500	Requadro de vao aluminio branco
REQ-054	Requadro alumínio	0.80 m	X	3.900	· Y	4.500	Requadro de vao aluminio branco
REQ-055	Requadro alumínio	2.10 m	X	3.900	· Y	4.500	Requadro de vao aluminio branco
REQ-056	Requadro alumínio	2.10 m	X	3.900	· Y	5.300	Requadro de vao aluminio branco

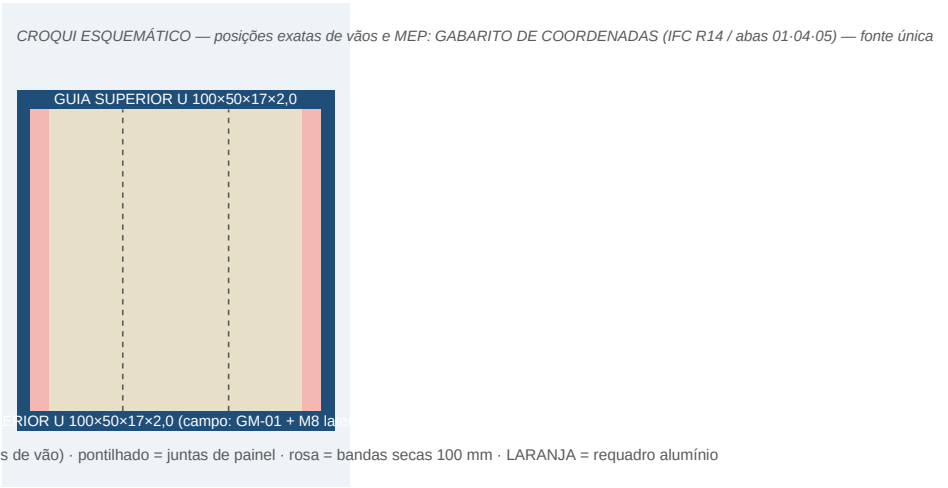

CONTEÚDO POR ESTAÇÃO (este SKU) — linha W1-W6

- W1

guias 2x3.00 m (requadro U100 contornando os painéis) · 2 montantes de extremidade (junção JP) · SEM montantes intermediários e SEM vergas — painel PIR 70 autoportante · PF-3: 8 un
- W2

3 painéis PIR · sem MEP · teste 500 V no chicote
- W3

gesso 6 chapas (banda 100 mm) · desencontros cf. Manual W
- W4

juntas internas fita+massa · telas 45° nos cantos
- W5

mascarar bandas secas + rabicho · externa textura elastomérica · interna 1 demão látex
- W6

passaporte QR · proteções · rack posição 1 · ordem B-8 (compensação)

COMPOSIÇÃO DA PAREDE (Romaneio R14)

Guias U 100x50x17x2,0: 2 pç × 3.00 m = 6.0 m

Montantes metalon 70x70x1,90: 2 de EXTREMIDADE (junção JP, compartilhados — total da casa: 18) · SEM montantes de vão

Painéis PIR 70 mm: 3 pç 1,15x2,85 · 9.8 m² · IDs I3-P01..P03

Gesso acartonado ST (2 faces): ~17.1 m²

Bordas: JP-03 / JP-01 · içamento: 2 olhais no requadro

Peso: 0.55 t · ordem B-8 (compensação) · rack 1 (carga inversa)

KIT DE FIXAÇÃO (paramétrico)

PF-1 36 · PF-2 32 · PF-3 8

contador da parafusadeira fecha o kit no QR · PF-2 recontado R13.2 (32+32/vão)

CHP-T/CHP-C: kit da casa, assentar cf. gabarito — inspeção PIT-W2c

EIXO DE COORDENADAS — peças de aço desta parede (aba 01, global, m)

GUI-B031	U 100x50x17x2,0	3.05 m	X	6.600	· Y	3.400	Guia inferior
GUI-B032	U 100x50x17x2,0	3.05 m	X	6.600	· Y	3.400	Guia superior

COMPOSIÇÃO DO CASSETE (Romaneio R14, abas 01/02)

Telha PIR 30 mm: 14 painéis de 1,00 m · rampa 3,76 m · corte 12,40 m (aba 02 — era 12 painéis no R2 original)

Terças U 44×30×2,0: 4 pç × 9,10 m — coords locais 0,35 · 1,20 · 2,05 · 2,90 m da cumeeira (globais: aba 01, TRC)

Viga de cumeeira metalon 70×70: 1 pç × 7,00 m na borda alta (VCM-A · coordenada local 0,00)

Calha galv. 0,65 impermeabilizada: 12,10 m (CAL) + emendas seladas + tampões de teste

Rufo/pingadeira: kit clip-on peças 3,0 m (borda baixa + laterais)

Fechamento provisório de transporte: banda 300 mm na cumeeira — filme + sarrafo clip

Içamento: 4 olhais nas terças (coords no croqui) · ~0,40 t · cintas 60°

Fixação no módulo: PF-5 — terça × consolo M8 (consolo M10 na GUIA-ANEL JP-04, 45 N·m) · telha × terça Ø5,5 EPDM @300 na CRISTA

PIT DO CASSETE

1. Gabarito nivelado ± 1 mm/m — batentes das terças nas coords acima
2. Calha: teste de água 30 min ANTES de fixar telhas
3. Telhas: parafuso EPDM @300 mm na crista; juntas p/ baixo da água
4. Jig de aspersão 30 min — laudo QR no ERP (item 11.3)
5. Liberação p/ içamento — fixação M8 nas guias + capuz de cumeeira desmontável em campo (butílica + PL-D)

COMPOSIÇÃO DO CASSETE (Romaneio R14, abas 01/02)

Telha PIR 30 mm: 14 painéis de 1,00 m · rampa 3,76 m · corte 12,40 m (aba 02 — era 12 painéis no R2 original)

Terças U 44×30×2,0: 4 pç × 9,10 m — coords locais 0,35 · 1,20 · 2,05 · 2,90 m da cumeeira (globais: aba 01, TRC)

Viga de cumeeira metalon 70×70: 1 pç × 7,00 m na borda alta (VCM-B · coordenada local 0,00)

Calha galv. 0,65 impermeabilizada: 12,10 m (CAL) + emendas seladas + tampões de teste

Rufo/pingadeira: kit clip-on peças 3,0 m (borda baixa + laterais)

Fechamento provisório de transporte: banda 300 mm na cumeeira — filme + sarrafo clip

Içamento: 4 olhais nas terças (coords no croqui) · ~0,40 t · cintas 60°

Fixação no módulo: PF-5 — terça × consolo M8 (consolo M10 na GUIA-ANEL JP-04, 45 N·m) · telha × terça Ø5,5 EPDM @300 na CRISTA

PIT DO CASSETE

1. Gabarito nivelado ± 1 mm/m — batentes das terças nas coords acima
2. Calha: teste de água 30 min ANTES de fixar telhas
3. Telhas: parafuso EPDM @300 mm na crista; juntas p/ baixo da água
4. Jig de aspersão 30 min — laudo QR no ERP (item 11.3)
5. Liberação p/ içamento — fixação M8 nas guias + capuz de cumeeira desmontável em campo (butílica + PL-D)

COMPOSIÇÃO (Romaneio R14 / Manual W R14)

Travessas metalon 50×30: 3 pç × 3,30 m + apoios cantoneira nos montantes/requadro (sobras do nesting)

Perfil F-530 + presilhas: 54,2 m²/casa ÷ 2 módulos — perpendicular às travessas

Placa gesso ST 12,5: 1,20×1,80 — RU no banheiro (módulo SOCIAL)

Tabica metálica: perímetro do módulo (chapa 0,45 dobra interna)

Massa elástica + fita: todas as juntas — NUNCA massa rígida (junta induzida = fissura programada, não defeito)

Plafons: plugados no chicote (W2) antes do fechamento

Fixação: PF-4 — cantoneira × montante 2×M8 (25 N·m) · travessa × cantoneira 2×M8 porca flangeada = forro DESMONTÁVEL sem tocar o gesso

SEQUÊNCIA (W5/W6 — livre da cobertura)

1. Cantoneiras nos montantes/requadro na malha 1,15 (coordenadas globais $X = 2,06 + n \times 1,15$)
2. Travessas + F-530 — nível a laser ± 2 mm no vão
3. Eletrodutos sobre o forro — folga 400 mm até as terças
4. Placas + juntas + tabica — placas 1,20×1,80 TRANSVERSAIS ao transporte · juntas desencontradas 600 · vistoria de trinca no PIT
5. Proteção de transporte — manta na banda perimetral

COMPOSIÇÃO (Romaneio R14 / Manual W R14)

Travessas metalon 50×30: 3 pç × 3,30 m + apoios cantoneira nos montantes/requadro (sobras do nesting)

Perfil F-530 + presilhas: 54,2 m²/casa ÷ 2 módulos — perpendicular às travessas

Placa gesso ST 12,5: 1,20×1,80 — RU no banheiro (módulo SOCIAL)

Tabica metálica: perímetro do módulo (chapa 0,45 dobra interna)

Massa elástica + fita: todas as juntas — NUNCA massa rígida (junta induzida = fissura programada, não defeito)

Plafons: plugados no chicote (W2) antes do fechamento

Fixação: PF-4 — cantoneira × montante 2×M8 (25 N·m) · travessa × cantoneira 2×M8 porca flangeada = forro DESMONTÁVEL sem tocar o gesso

SEQUÊNCIA (W5/W6 — livre da cobertura)

1. Cantoneiras nos montantes/requadro na malha 1,15 (coordenadas globais $X = 2,06 + n \times 1,15$)
2. Travessas + F-530 — nível a laser ± 2 mm no vão
3. Eletrodutos sobre o forro — folga 400 mm até as terças
4. Placas + juntas + tabica — placas 1,20×1,80 TRANSVERSAIS ao transporte · juntas desencontradas 600 · vistoria de trinca no PIT
5. Proteção de transporte — manta na banda perimetral

Perfil	Função	Qtd	Total (m)
Chapa galv. #4,75 (240×90)	Chapa de espera T — 2 porcas-rebite M8 (fábrica, W2)	1	0.24
Chapa galv. #4,75 (L 90×70)	Chapa de espera de canto — 2 porcas-rebite M8/aba (W1-B)	1	0.16
Chapa galvanizada 0,65mm	Calha galv. 0,65mm impermeabilizada	2	24.20
Metalon 70x70x1,90	Braco de balanço da marquise da lavanderia (duplo)	3	7.44
Metalon 70x70x1,90	Braco de balanço da marquise do portico (duplo)	3	7.44
Metalon 70x70x1,90	Montante de borda de junta	4	11.40
Metalon 70x70x1,90	Montante de canto (painel autoportante)	10	28.50
Metalon 70x70x1,90	Ombreira de vao (dupla)	4	11.40
Metalon 70x70x1,90	Viga cumeeira A	1	7.00
Metalon 70x70x1,90	Viga cumeeira B	1	7.00
Requadro aluminio	Requadro de vao aluminio branco	56	67.00
U 100x50x17x2,0	Guia inferior	16	65.11
U 100x50x17x2,0	Guia superior	16	65.11
U 44x30x2,0	Terca	8	72.80

REGRAS DE CORTE (R13/R14)

Serra corta em FEIXE: guias e montantes por comprimento · barras 12 m · kerf 5 mm · aferição semanal do gabarito (PIT-W1).
NÃO EXISTE mais corte de montante de vão, verga ou contraverga — retirar dos kits e do nesting de estação (R13). Aba 01 tem 18 montantes (10 canto + 4 borda de junta + 4 ombreiras).
Requadro alumínio: canal em barras 3,0 m c/ luva · cantos em peça pré-fabricada 90°. Furos Ø9 @400 dos montantes de extremidade no gabarito JP (W1-A).
CHP-T (240×90) e CHP-C (L 90×70) #4,75: corte/furação CNC + 2 porcas-rebite M8 — assentadas na fábrica (W1-B/W2) pelo gabarito · PIT-W2c.

BUFFER

perfis cortados (serra fita + puncionadeira JP) abastecem W1

W1

QUADRO: requadro U100 + montantes de extremidade + ombreiras · PF-3 25 N·m · PIT-W1 diagonais ±3 mm

W2

NÚCLEO PIR + MEP: painéis (PF-1/PF-2) · elétrica/hidráulica embutida · CHP porca-rebite · teste 500 V / hydr. 1,5× · PIT-W2/W2c

W3

PLACAS: cimentícia (borda 20 mm) + gesso (banda 100 mm) + PTB · paginação cf. Manual W

W4

ESQUADRIA + JUNTAS: requadro alumínio nos recortes · esquadria c/ rebite estrutural (PROIBIDO autobrocante na face 0,43 mm) · fita+massa

W5

ACABAMENTO: textura elastomérica ext. · 1 demão látex int. · bandas secas mascaradas (aposta W5: piloto decide demão de fábrica)

W6

QA + EMBALAGEM: passaporte QR · corte da guia da porta · proteções · rack em carga inversa · PIT-W6

CURA

24 h mín. antes do manuseio · pulmão de 8 posições

REGRAS DA LINHA + DRY-FIT

REGRA DE OURO: NADA entra na estação sem BIPE de início e NADA sai sem BIPE de fim — o takt nasce do bipe, não de planilha. Parafusadeiras c/ contador → ERP (divergência = alerta por etapa).

DRY-FIT da junta A/B em fábrica: pré-acoplamento M12 @600 + EPDM antes da expedição — furação CNC pareada garante o encaixe em campo.

PILOTO (R14): 1 casa rota A (volumétrica) + 1 casa rota B (kit plano) — indicadores: tempos por SKU × estação · retoque pós-montagem (aposta W5) · divergência contador×kit · vibração de transporte · NC por PIT-W.

Sequência de leitura por estação: W1 usa o quadro (croqui + requadro) · W2 usa MEP + painéis · W3 usa paginação · W4 usa esquadrias/juntas · W6 confere kit e posição de rack.

ID Peça	Perfil	Compr. (m)	Parede/Local	Mód.	Função	X (m)
TRC-01	U 44x30x2,0	9.10	COB-A	A	Terca	2.200
TRC-03	U 44x30x2,0	9.10	COB-A	A	Terca	2.200
TRC-05	U 44x30x2,0	9.10	COB-A	A	Terca	2.200
TRC-07	U 44x30x2,0	9.10	COB-A	A	Terca	2.200
CAL-01	Chapa galvanizada 0,65mm	12.10	COBERTURA	A	Calha galv. 0,65mm impermeabilizada	-0.350
VCM-A	Metalon 70x70x1,90	7.00	CUMEEIRA	A	Viga cumeeira A	2.200
GUI-A001	U 100x50x17x2,0	9.30	F1	A	Guia inferior	2.100
GUI-A002	U 100x50x17x2,0	9.30	F1	A	Guia superior	2.100
MNT-A017	Metalon 70x70x1,90	2.85	F1	A	Ombreira de vao (dupla)	3.505
MNT-A018	Metalon 70x70x1,90	2.85	F1	A	Ombreira de vao (dupla)	4.395
REQ-001	Requadro aluminio	1.00	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	2.450
REQ-002	Requadro aluminio	1.00	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	2.450
REQ-003	Requadro aluminio	1.00	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	2.450
REQ-004	Requadro aluminio	1.00	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	3.450
REQ-005	Requadro aluminio	0.80	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	3.550
REQ-006	Requadro aluminio	0.80	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	3.550
REQ-007	Requadro aluminio	2.10	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	3.550
REQ-008	Requadro aluminio	2.10	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	4.350
REQ-009	Requadro aluminio	0.60	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	4.900
REQ-010	Requadro aluminio	0.60	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	4.900
REQ-011	Requadro aluminio	0.40	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	4.900
REQ-012	Requadro aluminio	0.40	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	5.500
REQ-013	Requadro aluminio	1.20	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	8.000
REQ-014	Requadro aluminio	1.20	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	8.000
REQ-015	Requadro aluminio	1.00	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	8.000
REQ-016	Requadro aluminio	1.00	F1	A	Requadro de vao aluminio branco	9.200
MNT-A002	Metalon 70x70x1,90	2.85	F1/F3-A	A	Montante de canto (painel autoportante)	11.280
MNT-A001	Metalon 70x70x1,90	2.85	F1/F4-A	A	Montante de canto (painel autoportante)	2.220
GUI-A005	U 100x50x17x2,0	3.29	F3-A	A	Guia inferior	11.357
GUI-A006	U 100x50x17x2,0	3.29	F3-A	A	Guia superior	11.357
MNT-A015	Metalon 70x70x1,90	2.85	F3-A	A	Ombreira de vao (dupla)	11.280
MNT-A016	Metalon 70x70x1,90	2.85	F3-A	A	Ombreira de vao (dupla)	11.280
REQ-021	Requadro aluminio	1.00	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
REQ-022	Requadro aluminio	1.00	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
REQ-023	Requadro aluminio	1.00	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
REQ-024	Requadro aluminio	1.00	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
REQ-025	Requadro aluminio	0.90	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
REQ-026	Requadro aluminio	0.90	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
REQ-027	Requadro aluminio	2.10	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
REQ-028	Requadro aluminio	2.10	F3-A	A	Requadro de vao aluminio branco	11.400
MNT-A004	Metalon 70x70x1,90	2.85	F3-A/F5-A	A	Montante de canto (painel autoportante)	11.280
GUI-A007	U 100x50x17x2,0	3.29	F4-A	A	Guia inferior	2.143
GUI-A008	U 100x50x17x2,0	3.29	F4-A	A	Guia superior	2.143
MNT-A003	Metalon 70x70x1,90	2.85	F4-A/JUNTA	A	Montante de canto (painel autoportante)	2.220

ID Peça	Perfil	Compr. (m)	Parede/Local	Mód.	Função	X (m)
GUI-A013	U 100x50x17x2,0	2.10	F5-A	A	Guia inferior	9.300
GUI-A014	U 100x50x17x2,0	2.10	F5-A	A	Guia superior	9.300
MNT-A005	Metalon 70x70x1,90	2.85	F5-A/JUNTA	A	Montante de canto (painel autoportante)	9.230
GUI-A021	U 100x50x17x2,0	2.30	IA1	A	Guia inferior	4.500
GUI-A022	U 100x50x17x2,0	2.30	IA1	A	Guia superior	4.500
GUI-A023	U 100x50x17x2,0	2.30	IA2	A	Guia inferior	5.900
GUI-A024	U 100x50x17x2,0	2.30	IA2	A	Guia superior	5.900
GUI-A025	U 100x50x17x2,0	1.40	IAN	A	Guia inferior	4.500
GUI-A026	U 100x50x17x2,0	1.40	IAN	A	Guia superior	4.500
REQ-045	Requadro aluminio	0.70	IAN	A	Requadro de vao aluminio branco	4.900
REQ-046	Requadro aluminio	0.70	IAN	A	Requadro de vao aluminio branco	4.900
REQ-047	Requadro aluminio	2.10	IAN	A	Requadro de vao aluminio branco	4.900
REQ-048	Requadro aluminio	2.10	IAN	A	Requadro de vao aluminio branco	5.600
GUI-A017	U 100x50x17x2,0	7.00	JUNTA-A	A	Guia inferior	2.250
GUI-A018	U 100x50x17x2,0	7.00	JUNTA-A	A	Guia superior	2.250
MNT-A011	Metalon 70x70x1,90	2.85	JUNTA-A	A	Montante de borda de junta	4.600
MNT-A013	Metalon 70x70x1,90	2.85	JUNTA-A	A	Montante de borda de junta	6.900
REQ-037	Requadro aluminio	0.80	JUNTA-A	A	Requadro de vao aluminio branco	6.900
REQ-038	Requadro aluminio	0.80	JUNTA-A	A	Requadro de vao aluminio branco	6.900
REQ-039	Requadro aluminio	2.10	JUNTA-A	A	Requadro de vao aluminio branco	6.900
REQ-040	Requadro aluminio	2.10	JUNTA-A	A	Requadro de vao aluminio branco	7.700
BRM-P01	Metalon 70x70x1,90	2.48	MARQUISE-PORTICO	A	Braco de balanço da marquise do portico (duplo)	2.080
BRM-P02	Metalon 70x70x1,90	2.48	MARQUISE-PORTICO	A	Braco de balanço da marquise do portico (duplo)	2.080
BRM-P03	Metalon 70x70x1,90	2.48	MARQUISE-PORTICO	A	Braco de balanço da marquise do portico (duplo)	2.080
TRC-02	U 44x30x2,0	9.10	COB-B	B	Terça	0.100
TRC-04	U 44x30x2,0	9.10	COB-B	B	Terça	0.100
TRC-06	U 44x30x2,0	9.10	COB-B	B	Terça	0.100
TRC-08	U 44x30x2,0	9.10	COB-B	B	Terça	0.100
CAL-02	Chapa galvanizada 0,65mm	12.10	COBERTURA	B	Calha galv. 0,65mm impermeabilizada	-0.350
VCM-B	Metalon 70x70x1,90	7.00	CUMEEIRA	B	Viga cumeeira B	2.200
GUI-B003	U 100x50x17x2,0	9.30	F2	B	Guia inferior	0.000
GUI-B004	U 100x50x17x2,0	9.30	F2	B	Guia superior	0.000
REQ-017	Requadro aluminio	1.00	F2	B	Requadro de vao aluminio branco	4.750
REQ-018	Requadro aluminio	1.00	F2	B	Requadro de vao aluminio branco	4.750
REQ-019	Requadro aluminio	1.00	F2	B	Requadro de vao aluminio branco	4.750
REQ-020	Requadro aluminio	1.00	F2	B	Requadro de vao aluminio branco	5.750
MNT-B007	Metalon 70x70x1,90	2.85	F2/F3-B	B	Montante de canto (painel autoportante)	9.180
MNT-B006	Metalon 70x70x1,90	2.85	F2/F4-B	B	Montante de canto (painel autoportante)	0.120
GUI-B009	U 100x50x17x2,0	3.29	F3-B	B	Guia inferior	9.257
GUI-B010	U 100x50x17x2,0	3.29	F3-B	B	Guia superior	9.257
REQ-029	Requadro aluminio	1.00	F3-B	B	Requadro de vao aluminio branco	9.300
REQ-030	Requadro aluminio	1.00	F3-B	B	Requadro de vao aluminio branco	9.300
REQ-031	Requadro aluminio	1.00	F3-B	B	Requadro de vao aluminio branco	9.300
REQ-032	Requadro aluminio	1.00	F3-B	B	Requadro de vao aluminio branco	9.300

MONTEX

ANEXO A — COORDENADAS DAS PEÇAS DE AÇO (sistema global do módulo, m) (3/3)

126 peças · fonte: Romaneio R14, aba 01 · geometria = IFC R14 (R12 + revisão documental R13)

ID Peça	Perfil	Compr. (m)	Parede/Local	Mód.	Função	X (m)
MNT-B009	Metalon 70x70x1,90	2.85	F3-B/JUNTA	B	Montante de canto (painel autoportante)	9.180
GUI-B011	U 100x50x17x2,0	3.29	F4-B	B	Guia inferior	0.043
GUI-B012	U 100x50x17x2,0	3.29	F4-B	B	Guia superior	0.043
REQ-033	Requadro alumínio	1.00	F4-B	B	Requadro de vao alumínio branco	0.000
REQ-034	Requadro alumínio	1.00	F4-B	B	Requadro de vao alumínio branco	0.000
REQ-035	Requadro alumínio	1.00	F4-B	B	Requadro de vao alumínio branco	0.000
REQ-036	Requadro alumínio	1.00	F4-B	B	Requadro de vao alumínio branco	0.000
MNT-B008	Metalon 70x70x1,90	2.85	F4-B/JUNTA	B	Montante de canto (painel autoportante)	0.120
GUI-B015	U 100x50x17x2,0	2.10	F5-B	B	Guia inferior	0.000
GUI-B016	U 100x50x17x2,0	2.10	F5-B	B	Guia superior	0.000
MNT-B010	Metalon 70x70x1,90	2.85	F5-B/JUNTA	B	Montante de canto (painel autoportante)	2.170
GUI-B027	U 100x50x17x2,0	3.05	I1	B	Guia inferior	2.800
GUI-B028	U 100x50x17x2,0	3.05	I1	B	Guia superior	2.800
REQ-049	Requadro alumínio	0.80	I1	B	Requadro de vao alumínio branco	2.800
REQ-050	Requadro alumínio	0.80	I1	B	Requadro de vao alumínio branco	2.800
REQ-051	Requadro alumínio	2.10	I1	B	Requadro de vao alumínio branco	2.800
REQ-052	Requadro alumínio	2.10	I1	B	Requadro de vao alumínio branco	2.800
GUI-B029	U 100x50x17x2,0	3.05	I2	B	Guia inferior	3.900
GUI-B030	U 100x50x17x2,0	3.05	I2	B	Guia superior	3.900
REQ-053	Requadro alumínio	0.80	I2	B	Requadro de vao alumínio branco	3.900
REQ-054	Requadro alumínio	0.80	I2	B	Requadro de vao alumínio branco	3.900
REQ-055	Requadro alumínio	2.10	I2	B	Requadro de vao alumínio branco	3.900
REQ-056	Requadro alumínio	2.10	I2	B	Requadro de vao alumínio branco	3.900
GUI-B031	U 100x50x17x2,0	3.05	I3	B	Guia inferior	6.600
GUI-B032	U 100x50x17x2,0	3.05	I3	B	Guia superior	6.600
GUI-B019	U 100x50x17x2,0	7.00	JUNTA-B	B	Guia inferior	2.250
GUI-B020	U 100x50x17x2,0	7.00	JUNTA-B	B	Guia superior	2.250
MNT-B012	Metalon 70x70x1,90	2.85	JUNTA-B	B	Montante de borda de junta	4.600
MNT-B014	Metalon 70x70x1,90	2.85	JUNTA-B	B	Montante de borda de junta	6.900
REQ-041	Requadro alumínio	0.80	JUNTA-B	B	Requadro de vao alumínio branco	6.900
REQ-042	Requadro alumínio	0.80	JUNTA-B	B	Requadro de vao alumínio branco	6.900
REQ-043	Requadro alumínio	2.10	JUNTA-B	B	Requadro de vao alumínio branco	6.900
REQ-044	Requadro alumínio	2.10	JUNTA-B	B	Requadro de vao alumínio branco	7.700
BRM-L01	Metalon 70x70x1,90	2.48	MARQUISE-LAVANDERI	B	Braco de balanço da marquise da lavanderia (duplo)	9.320
BRM-L02	Metalon 70x70x1,90	2.48	MARQUISE-LAVANDERI	B	Braco de balanço da marquise da lavanderia (duplo)	9.320
BRM-L03	Metalon 70x70x1,90	2.48	MARQUISE-LAVANDERI	B	Braco de balanço da marquise da lavanderia (duplo)	9.320
CHP-T-001..070	Chapa galv. #4,75 (240×90)	0.24	bordas JP-03 (10×	A/B	Chapa de espera T — 2 porcas-rebite M8 (fábrica, W2)	—
CHP-C-001..070	Chapa galv. #4,75 (L 90×70)	0.16	cantos JP-02 (10×	A/B	Chapa de espera de canto — 2 porcas-rebite M8/aba (W	—

ID	Descrição	Ambiente	Mód.	X (m)	Y (m)	Z (m)
QD-01	Quadro de distribuicao 10 disjuntores DIN (geral 63A	-	A	3.350	3.185	1.400
INT-01	Interruptor paralelo 10A embutido no painel - Sala	Sala	A	11.337	2.580	1.040
INT-02	Interruptor paralelo 10A embutido no painel - Sala (	Sala (portal)	A	6.280	3.225	1.040
INT-03	Interruptor simples 10A embutido no painel - Cozinha	Cozinha	A	2.580	3.225	1.040
INT-04	Interruptor simples 10A embutido no painel - Banheir	Banheiro	A	4.980	2.480	1.040
INT-05	Interruptor simples 10A embutido no painel - Quarto	Quarto 1	B	7.530	3.335	1.040
INT-06	Interruptor simples 10A embutido no painel - Quarto	Quarto 2	B	3.880	4.580	1.040
INT-07	Interruptor simples 10A embutido no painel - Quarto	Quarto 3	B	2.780	4.580	1.040
INT-08	Interruptor paralelo 10A embutido no painel - Corred	Corredor	B	3.080	3.335	1.040
CXP-JUNTA	Caixa de inspecao no pleno - conectores plug-in da j	-	A	4.200	3.245	2.750
LUZ-01	Plafon LED sobrepor no forro - Sala	Sala	A	8.600	1.700	2.595
LUZ-02	Plafon LED sobrepor no forro - Cozinha	Cozinha	A	3.350	1.700	2.595
LUZ-03	Plafon LED sobrepor no forro - Banheiro	Banheiro	A	5.200	1.300	2.595
LUZ-04	Plafon LED sobrepor no forro - Quarto 1	Quarto 1	B	7.900	4.900	2.595
LUZ-05	Plafon LED sobrepor no forro - Quarto 2	Quarto 2	B	5.250	4.900	2.595
LUZ-06	Plafon LED sobrepor no forro - Quarto 3	Quarto 3	B	1.450	4.900	2.595
LUZ-07	Plafon LED sobrepor no forro - Corredor	Corredor	B	3.350	4.900	2.595
LUZ-LAVAND	Luminaria externa no forro do recuo coberto (soffit)	-	A	1.050	1.650	2.950
LUZ-VARANDA	Luminaria externa no forro do recuo coberto (soffit)	-	B	10.350	4.950	2.950
TOM-01	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Sala	Sala	A	6.480	0.023	0.240
TOM-02	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Sala	Sala	A	8.580	0.023	0.240
TOM-03	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Sala	Sala	A	11.337	1.480	0.240
TOM-04	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Sala	Sala	A	6.380	3.225	0.240
TOM-05	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Cozinh	Cozinha	A	2.430	0.023	1.040
TOM-06	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Cozinh	Cozinha	A	2.123	1.180	1.040
TOM-07	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Cozinh	Cozinha	A	2.123	2.180	1.040
TOM-08	Tomada 2P+T 20A NBR14136 embutida no painel - Cozinh	Cozinha	A	3.180	0.023	1.040
TOM-09	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Banhei	Banheiro	A	5.680	0.023	1.040
TOM-10	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Quarto	Quarto 1	B	6.880	6.537	0.240
TOM-11	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Quarto	Quarto 1	B	9.237	4.480	0.240
TOM-12	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Quarto	Quarto 2	B	4.180	6.537	0.240
TOM-13	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Quarto	Quarto 2	B	6.580	4.480	0.240
TOM-14	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Quarto	Quarto 3	B	0.380	6.537	0.240
TOM-15	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Quarto	Quarto 3	B	0.023	4.480	0.240
TOM-16	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Corred	Corredor	B	3.330	6.537	0.240
TOM-17	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Lavand	Lavanderia externa	A	2.123	0.580	1.040
TOM-18	Tomada 2P+T 10A NBR14136 embutida no painel - Lavand	Lavanderia externa	A	2.123	2.180	1.040
TOM-19	Tomada 2P+T 20A NBR14136 embutida no painel - Lavand	Lavanderia externa	A	2.123	1.380	1.040
TOM-AC-1	Ponto ar-condicionado 220V 16A embutido no painel +	Quarto 1	B	8.930	6.537	2.140
TOM-AC-2	Ponto ar-condicionado 220V 16A embutido no painel +	Quarto 2	B	6.580	6.280	2.140
TOM-AC-3	Ponto ar-condicionado 220V 16A embutido no painel +	Quarto 3	B	2.780	6.280	2.140
TOM-CHUV	Ponto chuveiro 5500W 220V circuito exclusivo 32A cab	Banheiro	A	4.520	1.600	2.140

ID	Descrição	Ambiente	Mód.	X (m)	Y (m)	Z (m)
REG-GERAL	Registro de gaveta bruto DN32 - entrada geral (later	-	A	2.143	0.500	0.550
REG-CHV	Registro de pressao c/ canopla cromada - chuveiro	-	A	4.520	1.750	1.100
PRM-01	Prumada esgoto DN100 (piso tecnico -> saida)	-	A	2.300	3.100	-0.350
TQ-LAT-ESQ	Tubo de queda PVC DN75 NA LATERAL (fachadas frontal/	-	B	-0.380	3.700	0.000
TQ-LAT-DIR	Tubo de queda PVC DN75 NA LATERAL (fachadas frontal/	-	A	11.780	2.900	0.000
VSO-01	Vaso sanitario caixa acoplada branco	Banheiro	A	5.420	1.380	0.000
LAV-01	Lavatorio coluna suspensa 41x34 branco	Banheiro	A	5.100	0.300	0.780
DCH-01	Ducha eletrica 5500W 220V	-	A	4.600	1.620	2.180
TAN-01	Tanque marmore sintetico 24L - lavanderia no recuo e	Lavanderia externa	A	1.500	0.750	0.750
CXS-01	Caixa sifonada 100x150x50 grelha cromada - Banheiro	Banheiro	A	4.850	1.850	0.000
CXS-02	Caixa sifonada 100x150x50 grelha cromada - Cozinha	Cozinha	A	2.550	1.950	0.000
CXS-03	Caixa sifonada 100x150x50 grelha cromada - Lavanderi	Lavanderia externa	A	1.550	1.650	0.000
BAN-PIA	Bancada granito cinza 1,20x0,55 + cuba inox - cozinh	Cozinha	A	2.260	0.600	0.880

NOTA DE USO

As caixas nos croquis das fichas são POSICIONAIS; a furação real usa o GABARITO DE COORDENADAS (Anexo B / transparência X·Z) — fonte única.
Desvio de eletroduto de vão pela CANALETA FRESADA no painel (não existe contraverga — R13). Teste 500 V no chicote (W2) · hidráulica 1,5× / 60 min.

- OK** R13 (05/07/2026) — QUADRO SÓ DE REQUADRO: painel PIR 70 autoportante (Termilor TC 70, vão adm. 4,40 m > pé 2,85 m; folga 3× p/ vento 0,60 kN/m² NBR 6123). Fichas realinhadas: as R12 mandavam fabricar 58 montantes + vergas fantasma.
- OK** R13 — kit PF-3: 206 → 152 un/casa (-54) · aço de corte INALTERADO (aba 01/Nesting R9 já eram mínimos).
- OK** R13 — correções de cadastro aba 08 → fichas: J04 desenhada em F4-B pertence à F5-B · portas PI3/PI2 desenhadas em I1/I2 pertencem à IA1/IA2.
- OK** R13.1/R13.2 — chapas de espera CHP-T/CHP-C (#4,75, porca-rebite M8) detalhadas (Manual W + Caderno de Junções) e integradas ao Romaneio/Orçamento/QA (PIT-W2c): 140 chapas + 280 porcas-rebite/casa.
- OK** R13.2 — PF-2 recontado (32+32 por vão).
- OK** R13.6 — painéis PIR: repaginação sem tiras <300 mm · painéis de recorte de porta REMOVIDOS (recortes já modelados como aberturas nos painéis do modelo mestre).
- OK** R14 (06/07/2026) — EMISSÃO LOTE PILOTO: Caderno Mestre c/ ERRATA R13 integrada · fichas geradas do Romaneio R14 · termo de emissão 00_TERMO_EMISSAO_R14 (C1/ART = condição p/ SÉRIE).
- OK** DECISÕES R2 DE COBERTURA (mantidas na R14): cassetes com CUMEEIRA NA JUNTA · i 7% · terças U44×30 nas coords locais 0,35/1,20/2,05/2,90 m da cumeeira · calha testada no chão 30 min ANTES das telhas · jig de aspersão 30 min c/ laudo QR.
- OK** ATUALIZAÇÕES R14 na cobertura: telha PIR 30 mm em 14 painéis de 1,00 m (rampa 3,76 m · corte 12,40 m) — era 12 · viga de cumeeira metalon 70×70 1 pç × 7,00 m (VCM-A/B) · calha galv. 0,65 impermeabilizada 12,10 m (CAL-01/02).
- OK** FORRO AUTOPORTANTE (inalterado): travessas 50×30 na malha 1,15 m, independente da cobertura · F-530 + gesso ST 12,5 (RU no banheiro) · tabica perimetral · massa ELÁSTICA (nunca rígida).

PENDÊNCIA EXTERNA (fora do romaneio, com dono): C1 ART (junções JP/içamento + painel portante DATec SINAT nº 10) · C2 junta externa dupla-barreira · C3 estanqueidade NBR 15575-4 no protótipo.
